

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道17号 浦佐バイパス
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用 ・事業全体：事業費467億円(50億円)、維持管理費62億円(8億円) ※（ ）内の数値は残事業費 ○効果 ・事業全体：3便益170億円(100億円) ※（ ）内の数値は残事業費 (注1)費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値 (注2)事業効果に記載している金額は、完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：278万人・時間/年 渋滞損失削減時間：4万人・時間/年（278万人・時間/年⇒273万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：（現道区間＋バイパス） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：3.6万人・時間/年（現道区間＋バイパス） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：4割削減（現道区間＋バイパス）
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	対象バス路線：六日町～浦佐～小出 ・現道区間は路線バスが運行されているが、積雪時は道路除雪による渋滞でバス交通が阻害されている。 ・浦佐バイパスの整備により現道の通過交通が排除され、バスの走行性・定時性が向上する。
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	対象新幹線駅：JR浦佐駅 対象自治体：魚沼市、南魚沼市 ・現道区間は積雪時、道路除雪による渋滞が発生している。浦佐バイパスの整備により新幹線駅への走行性・定時性が向上する。
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	
	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

都市の再生		
	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		
	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
個性ある地域の形成		
	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	魚沼市では、『水の郷工業団地』が分譲中であり、浦佐バイパスの整備により、工業団地へのアクセスが向上する。
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	浦佐バイパス沿線には観光施設が多く立地しており、これらの周遊を支援する。
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし		
歩行者・自転車のための生活空間の形成		
	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
	<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成		
	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保		
<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	対象となる三次医療施設：魚沼基幹病院、アクセス向上が見込まれる自治体：魚沼医療圏 ・魚沼医療圏唯一の救急救命センターが浦佐バイパス沿線に立地している。 ・バイパス整備によつ魚沼基幹病院へのアクセス性向上が期待される。	

3. 安全		
安全な生活環境の確保		
	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
災害への備え		
	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	新潟県地域防災計画において、国道8号が第一次緊急輸送道路に指定されている。
	<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
	<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	浦佐バイパス現道には、JR上越線と魚野川に両側を挟まれた路肩幅員狭小区間があり、冬期間には路肩の堆雪を外側に飛ばせず、運搬排雪を実施している。 バイパスの整備により、国道の除雪障害区間がなくなり、冬期の快適な通行が確保される。
4. 環境		
地球環境の保全		
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用便益分析対象範囲のCO2排出量の削減量：約1.6千t-CO2/年 整備なし：約245.1千t-CO2/年 → 整備あり：約243.5千t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	費用便益分析対象範囲のNOx排出量の削減量：約4t-NOx/年 整備なし：約647t-NOx/年 → 整備あり：約643t-NOx/年
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	費用便益分析対象範囲のSPM排出量の削減量：約0.2t-SPM/年 整備なし：約29.7t-SPM/年 → 整備あり：約29.5t-SPM/年
	<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他		
他のプロジェクトとの関係		
	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
一般国道17号	浦佐バイパス	L = 6.6 Km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,200～13,000	2	北陸地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和7年度			
単純合計	264億円	127億円		391億円
うち残事業分	57億円	24億円		80億円
基準年における 現在価値 (C)	467億円	62億円		529億円
うち残事業分	50億円	8.0億円		58億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和7年度			
供用年	令和4年度、令和14年度			
単年便益 (初年便益)	2.8億円	0.67億円	0.04億円	3.5億円
基準年における 現在価値 (B)	140億円	28億円	1.9億円	170億円
うち残事業分	80億円	18億円	1.8億円	100億円

交通状況の変化（事業全体）

様式－3①

事業名：一般国道17号 浦佐バイパス

（推計時点 R22 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 : 5.8km		交通量※1	[台/日]	—	7,900
		走行時間※2	[分]	—	6
		走行時間費用※3	[億円/年]	—	9.67
②主な周辺道路※4	A. 国道17号 : 6.0km	交通量	[台/日]	9,200	4,200
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	14.24	6.46
	B. 一) 五箇小出線 : 4.4km	交通量	[台/日]	3,600	1,400
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	5.61	2.15
	C. 一) 浦佐小出線 : 5.9km	交通量	[台/日]	1,400	500
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	3.39	1.14
	D. 一) 下折立浦佐停車場線等 : 2.0km	交通量	[台/日]	4,000	1,100
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	2.59	0.60
	E. 国道291号等 : 8.8km	交通量	[台/日]	2,100	1,600
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	5.05	3.79
③その他道路合計 : 943.8km		走行時間費用	[億円/年]	597.78	597.25

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 976.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	628.67	621.07	7.60

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

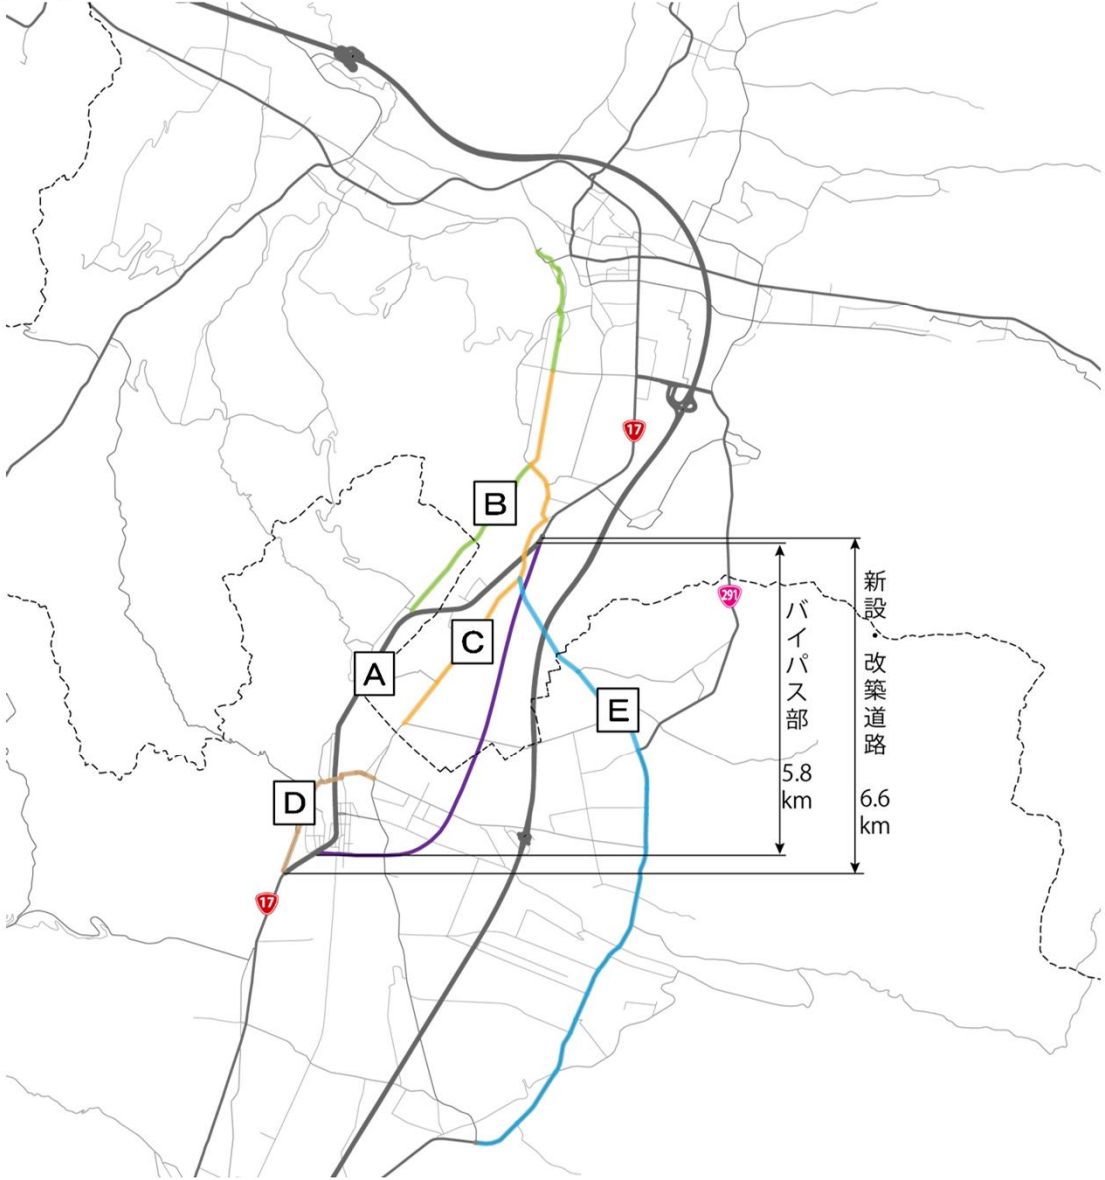

交通状況の変化（残事業）

様式－3①

事業名：一般国道17号 浦佐バイパス

（推計時点 R22 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 : 5.8km	交通量※ ¹	[台/日]	3,000	7,900	
	走行時間※ ²	[分]	5	6	
	走行時間費用※ ³	[億円/年]	3.03	9.67	
②主な周辺道路※ ⁴	A. 国道17号 : 6.0km	交通量	[台/日]	8,000	4,200
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	12.21	6.46
	B. 一) 五箇小出線 : 4.4km	交通量	[台/日]	3,100	1,400
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	5.00	2.15
	C. 一) 浦佐小出線 : 5.9km	交通量	[台/日]	800	500
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	2.13	1.14
	D. 一) 下折立浦佐停車場線等 : 2.0km	交通量	[台/日]	3,300	1,100
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	2.16	0.60
	E. 国道291号等 : 8.8km	交通量	[台/日]	1,600	1,600
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	3.69	3.79
③その他道路合計 : 943.8km		走行時間費用	[億円/年]	597.81	597.25

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 976.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	626.04	621.07	4.97

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

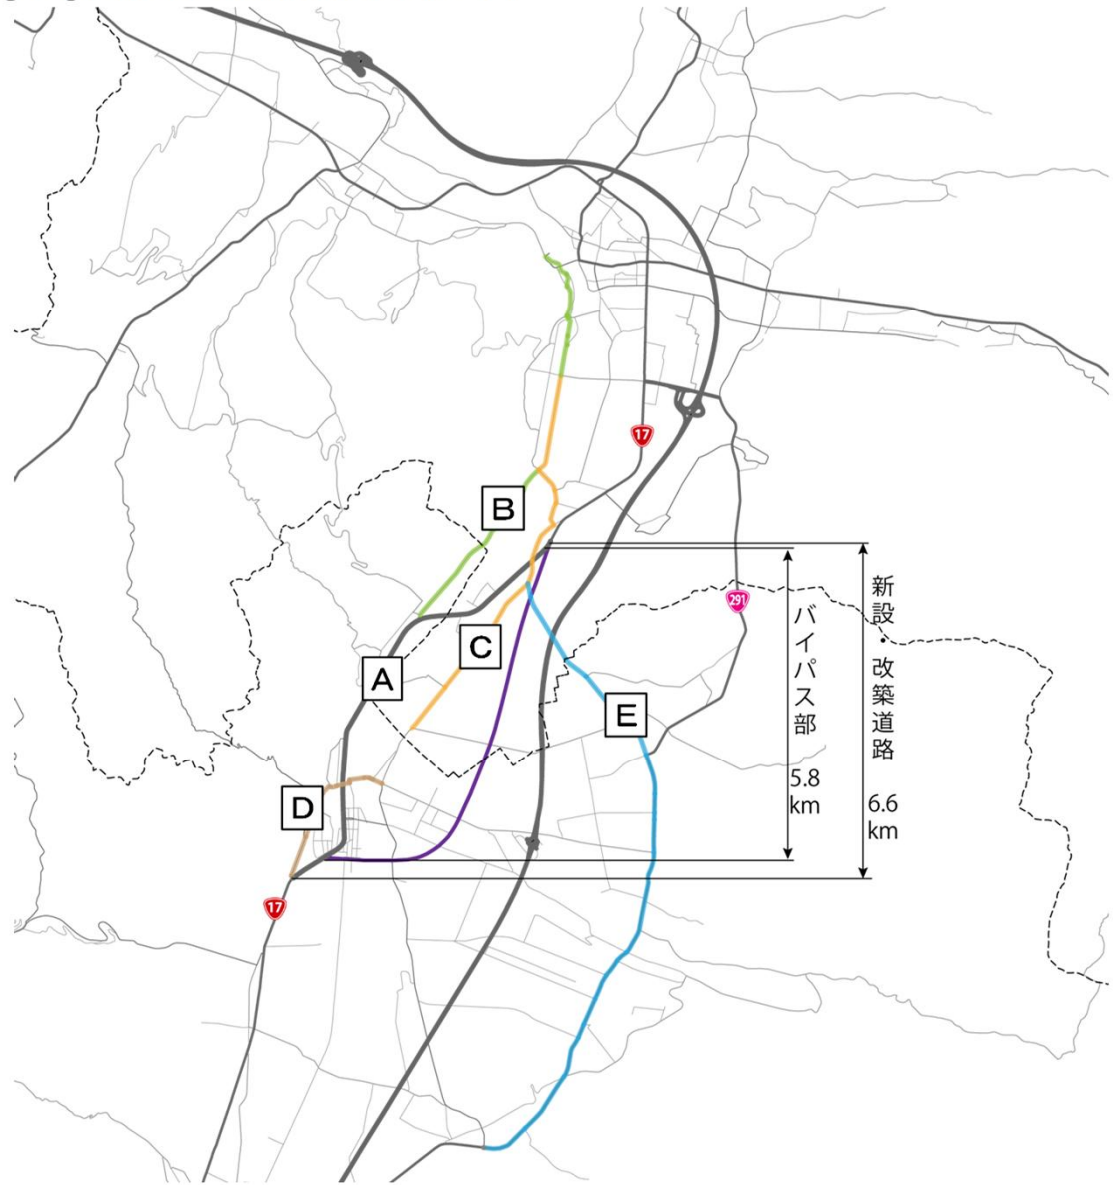

費用便益分析の条件

事業名：一般国道17号 浦佐バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年8月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	-		
	基準年次	令和7年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>	
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H27、R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
		無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数)	() 台トリップ/日
			考慮した理由を記載	
		配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>	
	簡易手法		<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由		小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
			その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
その他()	<input type="checkbox"/>			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmax～Qmin)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
	その他	<input type="checkbox"/>		

便益の算定

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
	考慮する		<input type="checkbox"/>
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
	考慮する		<input type="checkbox"/>
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない		<input type="checkbox"/>
	考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載	(115) 日
		降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの冬期日数(115日)及び降雪日数(56日)を考慮	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
通常期と冬期の速度比(降雪時13%低下、降雪時以外3%低下)を考慮			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
	その他		

事業名:一般国道17号 浦佐バイパス

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)	単純単価(億円)	
					0.439		6.6	2.90	
年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価 現在単価
－34年目	S 63	4%	4.2681	104.7	0.20	0.87			
－33年目	H 1	4%	4.1039	107.5	0.19	0.78			
－32年目	H 2	4%	3.9461	109.9	0.19	0.73			
－31年目	H 3	4%	3.7943	112.5	0.39	1.41			
－30年目	H 4	4%	3.6484	114.1	2.23	7.64			
－29年目	H 5	4%	3.5081	114.4	5.45	17.90			
－28年目	H 6	4%	3.3731	114.3	6.25	19.75			
－27年目	H 7	4%	3.2434	113.7	5.08	15.52			
－26年目	H 8	4%	3.1187	113.2	6.32	18.65			
－25年目	H 9	4%	2.9987	114.2	4.68	13.16			
－24年目	H 10	4%	2.8834	113.6	12.63	34.33			
－23年目	H 11	4%	2.7725	112.0	6.99	18.53			
－22年目	H 12	4%	2.6658	110.7	20.13	51.92			
－21年目	H 13	4%	2.5633	109.4	3.38	8.48			
－20年目	H 14	4%	2.4647	107.6	7.52	18.45			
－19年目	H 15	4%	2.3699	106.1	7.06	16.89			
－18年目	H 16	4%	2.2788	105.0	3.15	7.32			
－17年目	H 17	4%	2.1911	103.7	2.49	5.63			
－16年目	H 18	4%	2.1068	103.0	1.30	2.85			
－15年目	H 19	4%	2.0258	102.1	4.67	9.92			
－14年目	H 20	4%	1.9479	101.6	0.31	0.64			
－13年目	H 21	4%	1.8730	100.3	0.10	0.20			
－12年目	H 22	4%	1.8009	98.6	4.00	7.82			
－11年目	H 23	4%	1.7317	97.2	3.89	7.42			
－10年目	H 24	4%	1.6651	96.4	16.58	30.67			
－9年目	H 25	4%	1.6010	96.4	3.41	6.07			
－8年目	H 26	4%	1.5395	98.7	7.60	12.70			
－7年目	H 27	4%	1.4802	100.2	3.15	4.98			
－6年目	H 28	4%	1.4233	100.3	4.08	6.20			
－5年目	H 29	4%	1.3686	100.5	5.03	7.34			
－4年目	H 30	4%	1.3159	100.4	9.26	13.00			
－3年目	R 1	4%	1.2653	101.2	10.45	13.99			
－2年目	R 2	4%	1.2167	101.9	9.55	12.21			
－1年目	R 3	4%	1.1699	101.8	5.91	7.27			
部分供用開始	R 4	4%	1.1249	102.7	4.55	5.34	2.15	2.52	
1年目	R 5	4%	1.0816	107.1	6.82	7.38	2.15	2.33	
2年目	R 6	4%	1.0400	107.1	6.82	7.09	2.15	2.24	
3年目	R 7	4%	1.0000	107.1	4.91	4.91	2.15	2.15	
4年目	R 8	4%	0.9615	107.1	9.55	9.18	2.15	2.07	
5年目	R 9	4%	0.9246	107.1	9.55	8.83	2.15	1.99	
6年目	R 10	4%	0.8890	107.1	9.55	8.49	2.15	1.91	
7年目	R 11	4%	0.8548	107.1	9.55	8.16	2.15	1.84	
8年目	R 12	4%	0.8219	107.1	9.55	7.85	2.15	1.77	
9年目	R 13	4%	0.7903	107.1	9.23	7.29	2.15	1.70	
供用開始(10年目)	R 14	4%	0.7599	107.1			2.64	2.01	
11年目	R 15	4%	0.7307	107.1			2.64	1.93	
12年目	R 16	4%	0.7026	107.1			2.64	1.85	
13年目	R 17	4%	0.6756	107.1			2.64	1.78	
14年目	R 18	4%	0.6496	107.1			2.64	1.71	
15年目	R 19	4%	0.6246	107.1			2.64	1.65	
16年目	R 20	4%	0.6006	107.1			2.64	1.59	
17年目	R 21	4%	0.5775	107.1			2.64	1.52	
18年目	R 22	4%	0.5553	107.1			2.64	1.47	
19年目	R 23	4%	0.5339	107.1			2.64	1.41	
20年目	R 24	4%	0.5134	107.1			2.64	1.36	
21年目	R 25	4%	0.4936	107.1			2.64	1.30	
22年目	R 26	4%	0.4746	107.1			2.64	1.25	
23年目	R 27	4%	0.4564	107.1			2.64	1.20	
24年目	R 28	4%	0.4388	107.1			2.64	1.16	
25年目	R 29	4%	0.4220	107.1			2.64	1.11	
26年目	R 30	4%	0.4057	107.1			2.64	1.07	
27年目	R 31	4%	0.3901	107.1			2.64	1.03	
28年目	R 32	4%	0.3751	107.1			2.64	0.99	
29年目	R 33	4%	0.3607	107.1			2.64	0.95	
30年目	R 34	4%	0.3468	107.1			2.64	0.92	
31年目	R 35	4%	0.3335	107.1			2.64	0.88	
32年目	R 36	4%	0.3207	107.1			2.64	0.85	
33年目	R 37	4%	0.3083	107.1			2.64	0.81	
34年目	R 38	4%	0.2965	107.1			2.64	0.78	
35年目	R 39	4%	0.2851	107.1			2.64	0.75	
36年目	R 40	4%	0.2741	107.1			2.64	0.72	
37年目	R 41	4%	0.2636	107.1			2.64	0.70	
38年目	R 42	4%	0.2534	107.1			2.64	0.67	
39年目	R 43	4%	0.2437	107.1			2.64	0.64	
40年目	R 44	4%	0.2343	107.1			2.64	0.62	
41年目	R 45	4%	0.2253	107.1			2.64	0.59	
42年目	R 46	4%	0.2166	107.1			2.64	0.57	
43年目	R 47	4%	0.2083	107.1			2.64	0.55	
44年目	R 48	4%	0.2003	107.1			2.64	0.53	
45年目	R 49	4%	0.1926	107.1			2.64	0.51	
46年目	R 50	4%	0.1852	107.1			2.64	0.49	
47年目	R 51	4%	0.1780	107.1			2.64	0.47	
48年目	R 52	4%	0.1712	107.1			2.64	0.45	
49年目	R 53	4%	0.1646	107.1			2.64	0.43	
合計					209.33	466.81	127.10	61.79	0.00 0.00
単純事業費計					263.70		127.10		0.00

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)	単純単価(億円)	
					0.325		1.6	0.52	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値 現在価値
－6年目	R 8	4%	0.9615	107.1	9.55	9.18			
－5年目	R 9	4%	0.9246	107.1	9.55	8.83			
－4年目	R 10	4%	0.8890	107.1	9.55	8.49			
－3年目	R 11	4%	0.8548	107.1	9.55	8.16			
－2年目	R 12	4%	0.8219	107.1	9.55	7.85			
－1年目	R 13	4%	0.7903	107.1	9.23	7.29			
供用開始	R 14	4%	0.7599	107.1			0.47	0.36	
1年目	R 15	4%	0.7307	107.1			0.47	0.34	
2年目	R 16	4%	0.7026	107.1			0.47	0.33	
3年目	R 17	4%	0.6756	107.1			0.47	0.32	
4年目	R 18	4%	0.6496	107.1			0.47	0.31	
5年目	R 19	4%	0.6246	107.1			0.47	0.29	
6年目	R 20	4%	0.6006	107.1			0.47	0.28	
7年目	R 21	4%	0.5775	107.1			0.47	0.27	
8年目	R 22	4%	0.5553	107.1			0.47	0.26	
9年目	R 23	4%	0.5339	107.1			0.47	0.25	
10年目	R 24	4%	0.5134	107.1			0.47	0.24	
11年目	R 25	4%	0.4936	107.1			0.47	0.23	
12年目	R 26	4%	0.4746	107.1			0.47	0.22	
13年目	R 27	4%	0.4564	107.1			0.47	0.21	
14年目	R 28	4%	0.4388	107.1			0.47	0.21	
15年目	R 29	4%	0.4220	107.1			0.47	0.20	
16年目	R 30	4%	0.4057	107.1			0.47	0.19	
17年目	R 31	4%	0.3901	107.1			0.47	0.18	
18年目	R 32	4%	0.3751	107.1			0.47	0.18	
19年目	R 33	4%	0.3607	107.1			0.47	0.17	
20年目	R 34	4%	0.3468	107.1			0.47	0.16	
21年目	R 35	4%	0.3335	107.1			0.47	0.16	
22年目	R 36	4%	0.3207	107.1			0.47	0.15	
23年目	R 37	4%	0.3083	107.1			0.47	0.14	
24年目	R 38	4%	0.2965	107.1			0.47	0.14	
25年目	R 39	4%	0.2851	107.1			0.47	0.13	
26年目	R 40	4%	0.2741	107.1			0.47	0.13	
27年目	R 41	4%	0.2636	107.1			0.47	0.12	
28年目	R 42	4%	0.2534	107.1			0.47	0.12	
29年目	R 43	4%	0.2437	107.1			0.47	0.11	
30年目	R 44	4%	0.2343	107.1			0.47	0.11	
31年目	R 45	4%	0.2253	107.1			0.47	0.11	
32年目	R 46	4%	0.2166	107.1			0.47	0.10	
33年目	R 47	4%	0.2083	107.1			0.47	0.10	
34年目	R 48	4%	0.2003	107.1			0.47	0.09	
35年目	R 49	4%	0.1926	107.1			0.47	0.09	
36年目	R 50	4%	0.1852	107.1			0.47	0.09	
37年目	R 51	4%	0.1780	107.1			0.47	0.08	
38年目	R 52	4%	0.1712	107.1			0.47	0.08	
39年目	R 53	4%	0.1646	107.1			0.47	0.08	
40年目	R 54	4%	0.1583	107.1			0.47	0.07	
41年目	R 55	4%	0.1522	107.1			0.47	0.07	
42年目	R 56	4%	0.1463	107.1			0.47	0.07	
43年目	R 57	4%	0.1407	107.1			0.47	0.07	
44年目	R 58	4%	0.1353	107.1			0.47	0.06	
45年目	R 59	4%	0.1301	107.1			0.47	0.06	
46年目	R 60	4%	0.1251	107.1			0.47	0.06	
47年目	R 61	4%	0.1203	107.1			0.47	0.06	
48年目	R 62	4%	0.1157	107.1			0.47	0.05	
49年目	R 63	4%	0.1112	107.1	0.00	0.00	0.47	0.05	
合 計					56.98	49.80	23.50	7.95	0.00 0.00
単純事業費計					56.98		23.50		0.00

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.1249	102.7	1.29	0.54	0.95	2.78	3.26	0.29	0.13	0.26	0.67	0.79	0.04	0.04	3.49	4.09
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	4%	1.0816	107.1	1.28	0.54	0.95	2.76	2.99	0.28	0.13	0.26	0.67	0.72	0.04	0.04	3.47	3.75
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	4%	1.0400	107.1	1.27	0.53	0.95	2.74	2.85	0.28	0.13	0.26	0.66	0.69	0.04	0.04	3.45	3.58
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	4%	1.0000	107.1	1.25	0.53	0.95	2.73	2.73	0.28	0.12	0.26	0.66	0.66	0.04	0.04	3.43	3.43
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	4%	0.9615	107.1	1.24	0.52	0.95	2.71	2.61	0.28	0.12	0.26	0.66	0.63	0.04	0.04	3.41	3.28
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	4%	0.9246	107.1	1.23	0.52	0.95	2.70	2.49	0.27	0.12	0.26	0.65	0.60	0.04	0.03	3.39	3.13
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8890	107.1	1.22	0.52	0.95	2.68	2.38	0.27	0.12	0.26	0.65	0.58	0.04	0.03	3.37	2.99
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8548	107.1	1.21	0.51	0.95	2.66	2.28	0.27	0.12	0.26	0.65	0.55	0.04	0.03	3.35	2.86
8年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.8219	107.1	1.20	0.51	0.95	2.65	2.18	0.27	0.12	0.26	0.64	0.53	0.04	0.03	3.33	2.73
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7903	107.1	1.18	0.50	0.95	2.63	2.08	0.26	0.12	0.26	0.64	0.50	0.04	0.03	3.31	2.61
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7599	107.1	3.66	1.59	2.60	7.85	5.96	0.50	0.39	0.58	1.47	1.12	0.11	0.08	9.43	7.16
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7307	107.1	3.65	1.57	2.60	7.82	5.71	0.49	0.39	0.59	1.47	1.07	0.11	0.08	9.39	6.86
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7026	107.1	3.63	1.55	2.61	7.79	5.47	0.49	0.38	0.59	1.46	1.03	0.11	0.07	9.36	6.58
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6756	107.1	3.62	1.53	2.62	7.76	5.24	0.49	0.38	0.59	1.46	0.99	0.11	0.07	9.32	6.30
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6496	107.1	3.60	1.51	2.62	7.73	5.02	0.49	0.37	0.59	1.45	0.94	0.11	0.07	9.29	6.03
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6246	107.1	3.58	1.49	2.63	7.70	4.81	0.49	0.37	0.59	1.45	0.90	0.10	0.07	9.25	5.78
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6006	107.1	3.57	1.47	2.64	7.67	4.61	0.48	0.36	0.59	1.44	0.87	0.10	0.06	9.22	5.54
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5775	107.1	3.55	1.45	2.64	7.64	4.41	0.48	0.36	0.59	1.44	0.83	0.10	0.06	9.18	5.30
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5553	107.1	3.52	1.44	2.64	7.60	4.22	0.48	0.36	0.59	1.43	0.79	0.10	0.06	9.13	5.07
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5339	107.1	3.49	1.43	2.64	7.56	4.04	0.47	0.35	0.59	1.42	0.76	0.10	0.05	9.08	4.85
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.5134	107.1	3.46	1.41	2.64	7.52	3.86	0.47	0.35	0.59	1.41	0.73	0.10	0.05	9.03	4.64
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4936	107.1	3.43	1.40	2.64	7.47	3.69	0.46	0.35	0.59	1.41	0.69	0.10	0.05	8.98	4.43
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4746	107.1	3.40	1.39	2.64	7.43	3.53	0.46	0.35	0.59	1.40	0.66	0.10	0.05	8.93	4.24
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4564	107.1	3.37	1.38	2.64	7.39	3.37	0.46	0.34	0.59	1.39	0.64	0.10	0.05	8.88	4.05
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4388	107.1	3.34	1.37	2.64	7.34	3.22	0.45	0.34	0.59	1.39	0.61	0.10	0.04	8.83	3.87
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4220	107.1	3.30	1.36	2.64	7.30	3.08	0.45	0.34	0.59	1.38	0.58	0.10	0.04	8.78	3.70
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.4057	107.1	3.27	1.35	2.64	7.26	2.94	0.44	0.33	0.59	1.37	0.56	0.10	0.04	8.73	3.54
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3901	107.1	3.24	1.33	2.64	7.22	2.82	0.44	0.33	0.59	1.36	0.53	0.10	0.04	8.68	3.38
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3751	107.1	3.21	1.32	2.64	7.17	2.69	0.43	0.33	0.59	1.36	0.51	0.10	0.04	8.63	3.24
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3607	107.1	3.18	1.31	2.64	7.13	2.57	0.43	0.33	0.59	1.35	0.49	0.09	0.03	8.58	3.09
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3468	107.1	3.15	1.30	2.64	7.09	2.46	0.43	0.32	0.59	1.34	0.47	0.09	0.03	8.53	2.96
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3335	107.1	3.12	1.29	2.64	7.05	2.35	0.42	0.32	0.59	1.34	0.45	0.09	0.03	8.47	2.83
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3207	107.1	3.09	1.28	2.64	7.00	2.25	0.42	0.32	0.59	1.33	0.43	0.09	0.03	8.42	2.70
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.3083	107.1	3.06	1.26	2.64	6.96	2.15	0.41	0.31	0.59	1.32	0.41	0.09	0.03	8.37	2.58
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2965	107.1	3.03	1.25	2.64	6.92	2.05	0.41	0.31	0.59	1.32	0.39	0.09	0.03	8.32	2.47
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2851	107.1	2.99	1.24	2.64	6.87	1.96	0.41	0.31	0.59	1.31	0.37	0.09	0.03	8.27	2.36
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2741	107.1	2.96	1.23	2.64	6.83	1.87	0.40	0.31	0.59	1.30	0.36	0.09	0.02	8.22	2.25
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2636	107.1	2.93	1.22	2.64	6.79	1.79	0.40	0.30	0.59	1.29	0.34	0.09	0.02	8.17	2.15
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2534	107.1	2.90	1.21	2.64	6.75	1.71	0.39	0.30	0.59	1.29	0.33	0.09	0.02	8.12	2.06
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2437	107.1	2.87	1.20	2.64	6.70	1.63	0.39	0.30	0.59	1.28	0.31	0.09	0.02	8.07	1.97
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2343	107.1	2.84	1.18	2.64	6.66	1.56	0.38	0.29	0.59	1.27	0.30	0.09	0.02	8.02	1.88
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2253	107.1	2.81	1.17	2.64	6.62	1.49	0.38	0.29	0.59	1.27	0.29	0.09	0.02	7.97	1.80
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2166	107.1	2.78	1.16	2.64	6.58	1.42	0.38	0.29	0.59	1.26	0.27	0.08	0.02	7.92	1.72
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2083	107.1	2.75	1.15	2.64	6.53	1.36	0.37	0.29	0.59	1.25	0.26	0.08	0.02	7.87	1.64
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.2003	107.1	2.71	1.14	2.64	6.49	1.30	0.37	0.28	0.59	1.24	0.25	0.08	0.02	7.82	1.57
45年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1926	107.1	2.68	1.13	2.64	6.45	1.24	0.36	0.28	0.59	1.24	0.24	0.08	0.02	7.77	1.50
46年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1852	107.1	2.65	1.12	2.64	6.40	1.19	0.36	0.28	0.59	1.23	0.23	0.08	0.02	7.72	1.43
47年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1780	107.1	2.62	1.10	2.64	6.36	1.13	0.35	0.27	0.59	1.22	0.22	0.08	0.01	7.67	1.36
48年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	4%	0.1712	107.1	2.59	1.09	2.64	6.32	1.08	0.35	0.27	0.59	1.22	0.21	0.08	0.01	7.61	1.30
49年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	4%	0.1646	107.1	2.56	1.08	2.64	6.28	1.03	0.35	0.27	0.59	1.21	0.20	0.08	0.01	7.56	1.25
合 計									138.53	57.66	114.85	311.04	140.14	19.83	14.25	26.30	60.38	27.86	4.13	1.88	375.56	169.88

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7599	107.1	2.24	1.05	1.83	5.12	3.89	0.41	0.33	0.43	1.17	0.89	0.12	0.09	6.42	4.88
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7307	107.1	2.23	1.04	1.83	5.11	3.73	0.41	0.33	0.43	1.17	0.85	0.12	0.09	6.39	4.67
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7026	107.1	2.22	1.03	1.84	5.09	3.58	0.41	0.33	0.43	1.16	0.82	0.12	0.08	6.37	4.47
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6756	107.1	2.21	1.01	1.84	5.07	3.43	0.41	0.32	0.43	1.16	0.78	0.12	0.08	6.34	4.29
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6496	107.1	2.20	1.00	1.85	5.05	3.28	0.40	0.32	0.43	1.15	0.75	0.11	0.07	6.32	4.11
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6246	107.1	2.19	0.99	1.85	5.03	3.14	0.40	0.31	0.43	1.15	0.72	0.11	0.07	6.30	3.93
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6006	107.1	2.19	0.97	1.86	5.02	3.01	0.40	0.31	0.43	1.14	0.69	0.11	0.07	6.27	3.77
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5775	107.1	2.18	0.96	1.86	5.00	2.89	0.40	0.30	0.44	1.14	0.66	0.11	0.07	6.25	3.61
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5553	107.1	2.16	0.95	1.86	4.97	2.76	0.40	0.30	0.44	1.13	0.63	0.11	0.06	6.22	3.45
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5339	107.1	2.14	0.94	1.86	4.94	2.64	0.39	0.30	0.44	1.13	0.60	0.11	0.06	6.18	3.30
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.5134	107.1	2.12	0.94	1.86	4.92	2.52	0.39	0.30	0.44	1.12	0.58	0.11	0.06	6.15	3.16
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4936	107.1	2.10	0.93	1.86	4.89	2.41	0.39	0.29	0.44	1.12	0.55	0.11	0.05	6.12	3.02
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4746	107.1	2.08	0.92	1.86	4.86	2.31	0.38	0.29	0.44	1.11	0.53	0.11	0.05	6.08	2.89
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4564	107.1	2.06	0.91	1.86	4.84	2.21	0.38	0.29	0.44	1.10	0.50	0.11	0.05	6.05	2.76
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4388	107.1	2.04	0.91	1.86	4.81	2.11	0.38	0.29	0.44	1.10	0.48	0.11	0.05	6.02	2.64
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4220	107.1	2.02	0.90	1.86	4.78	2.02	0.37	0.29	0.44	1.09	0.46	0.11	0.05	5.98	2.52
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.4057	107.1	2.00	0.89	1.86	4.76	1.93	0.37	0.28	0.44	1.09	0.44	0.11	0.04	5.95	2.41
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3901	107.1	1.99	0.88	1.86	4.73	1.85	0.36	0.28	0.44	1.08	0.42	0.11	0.04	5.92	2.31
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3751	107.1	1.97	0.88	1.86	4.70	1.76	0.36	0.28	0.44	1.07	0.40	0.10	0.04	5.88	2.21
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3607	107.1	1.95	0.87	1.86	4.68	1.69	0.36	0.28	0.44	1.07	0.39	0.10	0.04	5.85	2.11
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3468	107.1	1.93	0.86	1.86	4.65	1.61	0.35	0.27	0.43	1.06	0.37	0.10	0.04	5.81	2.02
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3335	107.1	1.91	0.85	1.86	4.62	1.54	0.35	0.27	0.43	1.06	0.35	0.10	0.03	5.78	1.93
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3207	107.1	1.89	0.85	1.86	4.60	1.47	0.35	0.27	0.43	1.05	0.34	0.10	0.03	5.75	1.84
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.3083	107.1	1.87	0.84	1.86	4.57	1.41	0.34	0.27	0.43	1.04	0.32	0.10	0.03	5.71	1.76
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2965	107.1	1.85	0.83	1.86	4.54	1.35	0.34	0.26	0.43	1.04	0.31	0.10	0.03	5.68	1.68
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2851	107.1	1.83	0.82	1.86	4.52	1.29	0.34	0.26	0.43	1.03	0.29	0.10	0.03	5.65	1.61
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2741	107.1	1.81	0.82	1.86	4.49	1.23	0.33	0.26	0.43	1.03	0.28	0.10	0.03	5.61	1.54
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2636	107.1	1.80	0.81	1.86	4.46	1.18	0.33	0.26	0.43	1.02	0.27	0.10	0.03	5.58	1.47
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2534	107.1	1.78	0.80	1.86	4.44	1.12	0.33	0.25	0.43	1.01	0.26	0.10	0.02	5.55	1.41
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2437	107.1	1.76	0.79	1.86	4.41	1.07	0.32	0.25	0.43	1.01	0.25	0.10	0.02	5.51	1.34
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2343	107.1	1.74	0.78	1.86	4.38	1.03	0.32	0.25	0.43	1.00	0.23	0.09	0.02	5.48	1.28
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2253	107.1	1.72	0.78	1.86	4.36	0.98	0.32	0.25	0.43	1.00	0.22	0.09	0.02	5.45	1.23
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2166	107.1	1.70	0.77	1.86	4.33	0.94	0.31	0.24	0.43	0.99	0.21	0.09	0.02	5.41	1.17
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2083	107.1	1.68	0.76	1.86	4.30	0.90	0.31	0.24	0.43	0.99	0.21	0.09	0.02	5.38	1.12
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.2003	107.1	1.66	0.75	1.86	4.27	0.86	0.31	0.24	0.43	0.98	0.20	0.09	0.02	5.35	1.07
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1926	107.1	1.64	0.75	1.86	4.25	0.82	0.30	0.24	0.43	0.97	0.19	0.09	0.02	5.31	1.02
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1852	107.1	1.62	0.74	1.86	4.22	0.78	0.30	0.23	0.43	0.97	0.18	0.09	0.02	5.28	0.98
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1780	107.1	1.60	0.73	1.86	4.19	0.75	0.29	0.23	0.43	0.96	0.17	0.09	0.02	5.24	0.93
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	4%	0.1712	107.1	1.59	0.72	1.86	4.17	0.71	0.29	0.23	0.43	0.96	0.16	0.09	0.02	5.21	0.89
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	4%	0.1646	107.1	1.57	0.72	1.86	4.14	0.68	0.29	0.23	0.43	0.95	0.16	0.09	0.01	5.18	0.85
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	4%	0.1583	107.1	1.55	0.71	1.86	4.11	0.65	0.28	0.22	0.43	0.94	0.15	0.09	0.01	5.14	0.81
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	4%	0.1522	107.1	1.53	0.70	1.86	4.09	0.62	0.28	0.22	0.43	0.94	0.14	0.09	0.01	5.11	0.78
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	4%	0.1463	107.1	1.51	0.69	1.86	4.06	0.59	0.28	0.22	0.43	0.93	0.14	0.08	0.01	5.08	0.74
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	4%	0.1407	107.1	1.49	0.69	1.86	4.03	0.57	0.27	0.22	0.43	0.93	0.13	0.08	0.01	5.04	0.71
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	4%	0.1353	107.1	1.47													

費用の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
							0.439	6.6	2.90	
年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－34年目	S 63	4%	4.1059	104.7	0.20	0.84				
－33年目	H 1	4%	3.9480	107.5	0.19	0.75				
－32年目	H 2	4%	3.7962	109.9	0.19	0.70				
－31年目	H 3	4%	3.6502	112.5	0.39	1.35				
－30年目	H 4	4%	3.5098	114.1	2.23	7.35				
－29年目	H 5	4%	3.3748	114.4	5.45	17.22				
－28年目	H 6	4%	3.2450	114.3	6.25	19.00				
－27年目	H 7	4%	3.1202	113.7	5.08	14.93				
－26年目	H 8	4%	3.0002	113.2	6.32	17.94				
－25年目	H 9	4%	2.8848	114.2	4.68	12.66				
－24年目	H 10	4%	2.7738	113.6	12.63	33.03				
－23年目	H 11	4%	2.6671	112.0	6.99	17.83				
－22年目	H 12	4%	2.5645	110.7	20.13	49.94				
－21年目	H 13	4%	2.4659	109.4	3.38	8.16				
－20年目	H 14	4%	2.3711	107.6	7.52	17.75				
－19年目	H 15	4%	2.2799	106.1	7.06	16.25				
－18年目	H 16	4%	2.1922	105.0	3.15	7.04				
－17年目	H 17	4%	2.1079	103.7	2.49	5.42				
－16年目	H 18	4%	2.0268	103.0	1.30	2.74				
－15年目	H 19	4%	1.9488	102.1	4.67	9.55				
－14年目	H 20	4%	1.8738	101.6	0.31	0.61				
－13年目	H 21	4%	1.8017	100.3	0.10	0.19				
－12年目	H 22	4%	1.7324	98.6	4.00	7.53				
－11年目	H 23	4%	1.6658	97.2	3.89	7.14				
－10年目	H 24	4%	1.6017	96.4	16.58	29.50				
－9年目	H 25	4%	1.5401	96.4	3.41	5.83				
－8年目	H 26	4%	1.4809	98.7	7.60	12.21				
－7年目	H 27	4%	1.4239	100.2	3.15	4.79				
－6年目	H 28	4%	1.3691	100.3	4.08	5.96				
－5年目	H 29	4%	1.3164	100.5	5.03	7.06				
－4年目	H 30	4%	1.2658	100.4	9.26	12.50				
－3年目	R 1	4%	1.2171	101.2	10.45	13.46				
－2年目	R 2	4%	1.1703	101.9	9.55	11.75				
－1年目	R 3	4%	1.1253	101.8	5.91	7.00				
部分供用開始	R 4	4%	1.0820	102.7	4.55	5.13	2.15	2.43		
1年目	R 5	2%	1.0404	107.1	6.82	7.10	2.15	2.24		
2年目	R 6	2%	1.0200	107.1	6.82	6.96	2.15	2.19		
3年目	R 7	2%	1.0000	107.1	4.91	4.91	2.15	2.15		
4年目	R 8	2%	0.9804	107.1	9.55	9.36	2.15	2.11		
5年目	R 9	2%	0.9612	107.1	9.55	9.18	2.15	2.07		
6年目	R 10	2%	0.9424	107.1	9.55	9.00	2.15	2.03		
7年目	R 11	2%	0.9239	107.1	9.55	8.82	2.15	1.99		
8年目	R 12	2%	0.9058	107.1	9.55	8.65	2.15	1.95		
供用開始(9年目)	R 13	2%	0.8880	107.1	9.23	8.20	2.15	1.91		
10年目	R 14	2%	0.8706	107.1			2.64	2.30		
11年目	R 15	2%	0.8535	107.1			2.64	2.25		
12年目	R 16	2%	0.8368	107.1			2.64	2.21		
13年目	R 17	2%	0.8204	107.1			2.64	2.17		
14年目	R 18	2%	0.8043	107.1			2.64	2.12		
15年目	R 19	2%	0.7885	107.1			2.64	2.08		
16年目	R 20	2%	0.7730	107.1			2.64	2.04		
17年目	R 21	2%	0.7578	107.1			2.64	2.00		
18年目	R 22	2%	0.7429	107.1			2.64	1.96		
19年目	R 23	2%	0.7283	107.1			2.64	1.92		
20年目	R 24	2%	0.7140	107.1			2.64	1.88		
21年目	R 25	2%	0.7000	107.1			2.64	1.85		
22年目	R 26	2%	0.6863	107.1			2.64	1.81		
23年目	R 27	2%	0.6728	107.1			2.64	1.78		
24年目	R 28	2%	0.6596	107.1			2.64	1.74		
25年目	R 29	2%	0.6467	107.1			2.64	1.71		
26年目	R 30	2%	0.6340	107.1			2.64	1.67		
27年目	R 31	2%	0.6216	107.1			2.64	1.64		
28年目	R 32	2%	0.6094	107.1			2.64	1.61		
29年目	R 33	2%	0.5975	107.1			2.64	1.58		
30年目	R 34	2%	0.5858	107.1			2.64	1.55		
31年目	R 35	2%	0.5743	107.1			2.64	1.52		
32年目	R 36	2%	0.5630	107.1			2.64	1.49		
33年目	R 37	2%	0.5520	107.1			2.64	1.46		
34年目	R 38	2%	0.5412	107.1			2.64	1.43		
35年目	R 39	2%	0.5306	107.1			2.64	1.40		
36年目	R 40	2%	0.5202	107.1			2.64	1.37		
37年目	R 41	2%	0.5100	107.1			2.64	1.35		
38年目	R 42	2%	0.5000	107.1			2.64	1.32		
39年目	R 43	2%	0.4902	107.1			2.64	1.29		
40年目	R 44	2%	0.4806	107.1			2.64	1.27		
41年目	R 45	2%	0.4712	107.1			2.64	1.24		
42年目	R 46	2%	0.4620	107.1			2.64	1.22		
43年目	R 47	2%	0.4529	107.1			2.64	1.20		
44年目	R 48	2%	0.4440	107.1			2.64	1.17		
45年目	R 49	2%	0.4353	107.1			2.64	1.15		
46年目	R 50	2%	0.4268	107.1			2.64	1.13		
47年目	R 51	2%	0.4184	107.1			2.64	1.10		
48年目	R 52	2%	0.4102	107.1			2.64	1.08		
49年目	R 53	2%	0.4022	107.1	-54.37	-21.87	2.64	1.06		
合 計					209.33	441.42	127.10	85.19	0.00	0.00
単純事業費計					263.70		127.10		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.325		1.6		0.52	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
－6年目	R 8	2%	0.9804	107.1	9.55	9.36				
－5年目	R 9	2%	0.9612	107.1	9.55	9.18				
－4年目	R 10	2%	0.9424	107.1	9.55	9.00				
－3年目	R 11	2%	0.9239	107.1	9.55	8.82				
－2年目	R 12	2%	0.9058	107.1	9.55	8.65				
－1年目	R 13	2%	0.8880	107.1	9.23	8.20				
供用開始	R 14	2%	0.8706	107.1			0.47	0.41		
1年目	R 15	2%	0.8535	107.1			0.47	0.40		
2年目	R 16	2%	0.8368	107.1			0.47	0.39		
3年目	R 17	2%	0.8204	107.1			0.47	0.39		
4年目	R 18	2%	0.8043	107.1			0.47	0.38		
5年目	R 19	2%	0.7885	107.1			0.47	0.37		
6年目	R 20	2%	0.7730	107.1			0.47	0.36		
7年目	R 21	2%	0.7578	107.1			0.47	0.36		
8年目	R 22	2%	0.7429	107.1			0.47	0.35		
9年目	R 23	2%	0.7283	107.1			0.47	0.34		
10年目	R 24	2%	0.7140	107.1			0.47	0.34		
11年目	R 25	2%	0.7000	107.1			0.47	0.33		
12年目	R 26	2%	0.6863	107.1			0.47	0.32		
13年目	R 27	2%	0.6728	107.1			0.47	0.32		
14年目	R 28	2%	0.6596	107.1			0.47	0.31		
15年目	R 29	2%	0.6467	107.1			0.47	0.30		
16年目	R 30	2%	0.6340	107.1			0.47	0.30		
17年目	R 31	2%	0.6216	107.1			0.47	0.29		
18年目	R 32	2%	0.6094	107.1			0.47	0.29		
19年目	R 33	2%	0.5975	107.1			0.47	0.28		
20年目	R 34	2%	0.5858	107.1			0.47	0.28		
21年目	R 35	2%	0.5743	107.1			0.47	0.27		
22年目	R 36	2%	0.5630	107.1			0.47	0.26		
23年目	R 37	2%	0.5520	107.1			0.47	0.26		
24年目	R 38	2%	0.5412	107.1			0.47	0.25		
25年目	R 39	2%	0.5306	107.1			0.47	0.25		
26年目	R 40	2%	0.5202	107.1			0.47	0.24		
27年目	R 41	2%	0.5100	107.1			0.47	0.24		
28年目	R 42	2%	0.5000	107.1			0.47	0.24		
29年目	R 43	2%	0.4902	107.1			0.47	0.23		
30年目	R 44	2%	0.4806	107.1			0.47	0.23		
31年目	R 45	2%	0.4712	107.1			0.47	0.22		
32年目	R 46	2%	0.4620	107.1			0.47	0.22		
33年目	R 47	2%	0.4529	107.1			0.47	0.21		
34年目	R 48	2%	0.4440	107.1			0.47	0.21		
35年目	R 49	2%	0.4353	107.1			0.47	0.20		
36年目	R 50	2%	0.4268	107.1			0.47	0.20		
37年目	R 51	2%	0.4184	107.1			0.47	0.20		
38年目	R 52	2%	0.4102	107.1			0.47	0.19		
39年目	R 53	2%	0.4022	107.1			0.47	0.19		
40年目	R 54	2%	0.3943	107.1			0.47	0.19		
41年目	R 55	2%	0.3866	107.1			0.47	0.18		
42年目	R 56	2%	0.3790	107.1			0.47	0.18		
43年目	R 57	2%	0.3716	107.1			0.47	0.17		
44年目	R 58	2%	0.3643	107.1			0.47	0.17		
45年目	R 59	2%	0.3572	107.1			0.47	0.17		
46年目	R 60	2%	0.3502	107.1			0.47	0.16		
47年目	R 61	2%	0.3433	107.1			0.47	0.16		
48年目	R 62	2%	0.3366	107.1			0.47	0.16		
49年目	R 63	2%	0.3300	107.1	0.00	0.00	0.47	0.16		
合 計					56.98	53.21	23.50	13.12	0.00	0.00
単純事業費計					56.98		23.50		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.0820	102.7	1.29	0.54	0.95	2.78	3.13	0.29	0.13	0.26	0.67	0.76	0.04	0.04	3.49	3.93
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	2%	1.0404	107.1	1.28	0.54	0.95	2.76	2.87	0.28	0.13	0.26	0.67	0.69	0.04	0.04	3.47	3.61
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	2%	1.0200	107.1	1.27	0.53	0.95	2.74	2.80	0.28	0.13	0.26	0.66	0.68	0.04	0.04	3.45	3.51
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	2%	1.0000	107.1	1.25	0.53	0.95	2.73	2.73	0.28	0.12	0.26	0.66	0.66	0.04	0.04	3.43	3.43
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	2%	0.9804	107.1	1.24	0.52	0.95	2.71	2.66	0.28	0.12	0.26	0.66	0.64	0.04	0.04	3.41	3.34
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	2%	0.9612	107.1	1.23	0.52	0.95	2.70	2.59	0.27	0.12	0.26	0.65	0.63	0.04	0.04	3.39	3.26
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	2%	0.9424	107.1	1.22	0.52	0.95	2.68	2.53	0.27	0.12	0.26	0.65	0.61	0.04	0.03	3.37	3.17
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	2%	0.9239	107.1	1.21	0.51	0.95	2.66	2.46	0.27	0.12	0.26	0.65	0.60	0.04	0.03	3.35	3.09
8年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	2%	0.9058	107.1	1.20	0.51	0.95	2.65	2.40	0.27	0.12	0.26	0.64	0.58	0.04	0.03	3.33	3.01
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	2%	0.8880	107.1	1.18	0.50	0.95	2.63	2.34	0.26	0.12	0.26	0.64	0.57	0.04	0.03	3.31	2.94
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8706	107.1	3.66	1.59	2.60	7.85	6.83	0.50	0.39	0.58	1.47	1.28	0.11	0.09	9.43	8.21
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8535	107.1	3.65	1.57	2.60	7.82	6.67	0.49	0.39	0.59	1.47	1.25	0.11	0.09	9.39	8.02
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8368	107.1	3.63	1.55	2.61	7.79	6.52	0.49	0.38	0.59	1.46	1.22	0.11	0.09	9.36	7.83
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8204	107.1	3.62	1.53	2.62	7.76	6.37	0.49	0.38	0.59	1.46	1.20	0.11	0.09	9.32	7.65
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.8043	107.1	3.60	1.51	2.62	7.73	6.22	0.49	0.37	0.59	1.45	1.17	0.11	0.08	9.29	7.47
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7885	107.1	3.58	1.49	2.63	7.70	6.07	0.49	0.37	0.59	1.45	1.14	0.10	0.08	9.25	7.30
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7730	107.1	3.57	1.47	2.64	7.67	5.93	0.48	0.36	0.59	1.44	1.11	0.10	0.08	9.22	7.13
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7578	107.1	3.55	1.45	2.64	7.64	5.79	0.48	0.36	0.59	1.44	1.09	0.10	0.08	9.18	6.96
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7429	107.1	3.52	1.44	2.64	7.60	5.65	0.48	0.36	0.59	1.43	1.06	0.10	0.08	9.13	6.78
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7283	107.1	3.49	1.43	2.64	7.56	5.50	0.47	0.35	0.59	1.42	1.04	0.10	0.07	9.08	6.61
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7140	107.1	3.46	1.41	2.64	7.52	5.37	0.47	0.35	0.59	1.41	1.01	0.10	0.07	9.03	6.45
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.7000	107.1	3.43	1.40	2.64	7.47	5.23	0.46	0.35	0.59	1.41	0.99	0.10	0.07	8.98	6.29
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6863	107.1	3.40	1.39	2.64	7.43	5.10	0.46	0.35	0.59	1.40	0.96	0.10	0.07	8.93	6.13
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6728	107.1	3.37	1.38	2.64	7.39	4.97	0.46	0.34	0.59	1.39	0.94	0.10	0.07	8.88	5.97
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6596	107.1	3.34	1.37	2.64	7.34	4.84	0.45	0.34	0.59	1.39	0.91	0.10	0.06	8.83	5.82
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6467	107.1	3.30	1.36	2.64	7.30	4.72	0.45	0.34	0.59	1.38	0.89	0.10	0.06	8.78	5.68
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6340	107.1	3.27	1.35	2.64	7.26	4.60	0.44	0.33	0.59	1.37	0.87	0.10	0.06	8.73	5.53
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6216	107.1	3.24	1.33	2.64	7.22	4.49	0.44	0.33	0.59	1.36	0.85	0.10	0.06	8.68	5.39
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.6094	107.1	3.21	1.32	2.64	7.17	4.37	0.43	0.33	0.59	1.36	0.83	0.10	0.06	8.63	5.26
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5975	107.1	3.18	1.31	2.64	7.13	4.26	0.43	0.33	0.59	1.35	0.81	0.09	0.06	8.58	5.12
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5858	107.1	3.15	1.30	2.64	7.09	4.15	0.43	0.32	0.59	1.34	0.79	0.09	0.05	8.53	4.99
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5743	107.1	3.12	1.29	2.64	7.05	4.05	0.42	0.32	0.59	1.34	0.77	0.09	0.05	8.47	4.87
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5630	107.1	3.09	1.28	2.64	7.00	3.94	0.42	0.32	0.59	1.33	0.75	0.09	0.05	8.42	4.74
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5520	107.1	3.06	1.26	2.64	6.96	3.84	0.41	0.31	0.59	1.32	0.73	0.09	0.05	8.37	4.62
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5412	107.1	3.03	1.25	2.64	6.92	3.74	0.41	0.31	0.59	1.32	0.71	0.09	0.05	8.32	4.50
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5306	107.1	2.99	1.24	2.64	6.87	3.65	0.41	0.31	0.59	1.31	0.69	0.09	0.05	8.27	4.39
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5202	107.1	2.96	1.23	2.64	6.83	3.55	0.40	0.31	0.59	1.30	0.68	0.09	0.05	8.22	4.28
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5100	107.1	2.93	1.22	2.64	6.79	3.46	0.40	0.30	0.59	1.29	0.66	0.09	0.05	8.17	4.17
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.5000	107.1	2.90	1.21	2.64	6.75	3.37	0.39	0.30	0.59	1.29	0.64	0.09	0.04	8.12	4.06
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4902	107.1	2.87	1.20	2.64	6.70	3.29	0.39	0.30	0.59	1.28	0.63	0.09	0.04	8.07	3.96
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4806	107.1	2.84	1.18	2.64	6.66	3.20	0.38	0.29	0.59	1.27	0.61	0.09	0.04	8.02	3.85
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.4712	107.1	2.81	1.17	2.64	6.62	3.12	0.38	0.29	0.59	1.27	0.60	0.09	0.04	7.97	3.75
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4620	107.1	2.78	1.16	2.64	6.58	3.04	0.38	0.29	0.59	1.26	0.58	0.08	0.04	7.92	3.66
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4529	107.1	2.75	1.15	2.64	6.53	2.96	0.37	0.29	0.59	1.25	0.57	0.08	0.04	7.87	3.56
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.4440	107.1	2.71	1.14	2.64	6.49	2.88	0.37	0.28	0.59	1.24	0.55	0.08	0.04	7.82	3.47
45年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.4353	107.1	2.68	1.13	2.64	6.45	2.81	0.36	0.28	0.59	1.24	0.54	0.08	0.04	7.77	3.38
46年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	2%	0.4268	107.1	2.65	1.12	2.64	6.40	2.73	0.36	0.28	0.59	1.23	0.52	0.08	0.03	7.72	3.29
47年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	2%	0.4184	107.1	2.62	1.10	2.64	6.36	2.66	0.35	0.27	0.59	1.22	0.51	0.08	0.03	7.67	3.21
48年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	2%	0.4102	107.1	2.59	1.09	2.64	6.32	2.59	0.35	0.27	0.59	1.22	0.50	0.08	0.03	7.61	3.12
49年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	2%	0.4022	107.1	2.56	1.08	2.64	6.28	2.52	0.35	0.27	0.59	1.21	0.49	0.08	0.03	7.56	3.04
合 計									138.53	57.66	114.85	311.04	201.58	19.83	14.25	26.30	60.38	39.55	4.13	2.69	375.56	243.82

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8706	107.1	2.24	1.05	1.83	5.12	4.46	0.41	0.33	0.43	1.17	1.02	0.12	0.10	6.42	5.59
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8535	107.1	2.23	1.04	1.83	5.11	4.36	0.41	0.33	0.43	1.17	1.00	0.12	0.10	6.39	5.46
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8368	107.1	2.22	1.03	1.84	5.09	4.26	0.41	0.33	0.43	1.16	0.97	0.12	0.10	6.37	5.33
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8204	107.1	2.21	1.01	1.84	5.07	4.16	0.41	0.32	0.43	1.16	0.95	0.12	0.09	6.34	5.21
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.8043	107.1	2.20	1.00	1.85	5.05	4.06	0.40	0.32	0.43	1.15	0.93	0.11	0.09	6.32	5.08
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7885	107.1	2.19	0.99	1.85	5.03	3.97	0.40	0.31	0.43	1.15	0.91	0.11	0.09	6.30	4.97
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7730	107.1	2.19	0.97	1.86	5.02	3.88	0.40	0.31	0.43	1.14	0.88	0.11	0.09	6.27	4.85
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7578	107.1	2.18	0.96	1.86	5.00	3.79	0.40	0.30	0.44	1.14	0.86	0.11	0.09	6.25	4.74
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7429	107.1	2.16	0.95	1.86	4.97	3.69	0.40	0.30	0.44	1.13	0.84	0.11	0.08	6.22	4.62
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7283	107.1	2.14	0.94	1.86	4.94	3.60	0.39	0.30	0.44	1.13	0.82	0.11	0.08	6.18	4.50
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7140	107.1	2.12	0.94	1.86	4.92	3.51	0.39	0.30	0.44	1.12	0.80	0.11	0.08	6.15	4.39
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.7000	107.1	2.10	0.93	1.86	4.89	3.42	0.39	0.29	0.44	1.12	0.78	0.11	0.08	6.12	4.28
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6863	107.1	2.08	0.92	1.86	4.86	3.34	0.38	0.29	0.44	1.11	0.76	0.11	0.08	6.08	4.17
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6728	107.1	2.06	0.91	1.86	4.84	3.25	0.38	0.29	0.44	1.10	0.74	0.11	0.07	6.05	4.07
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6596	107.1	2.04	0.91	1.86	4.81	3.17	0.38	0.29	0.44	1.10	0.72	0.11	0.07	6.02	3.97
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6467	107.1	2.02	0.90	1.86	4.78	3.09	0.37	0.29	0.44	1.09	0.71	0.11	0.07	5.98	3.87
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6340	107.1	2.00	0.89	1.86	4.76	3.02	0.37	0.28	0.44	1.09	0.69	0.11	0.07	5.95	3.77
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6216	107.1	1.99	0.88	1.86	4.73	2.94	0.36	0.28	0.44	1.08	0.67	0.11	0.07	5.92	3.68
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.6094	107.1	1.97	0.88	1.86	4.70	2.87	0.36	0.28	0.44	1.07	0.65	0.10	0.06	5.88	3.58
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5975	107.1	1.95	0.87	1.86	4.68	2.79	0.36	0.28	0.44	1.07	0.64	0.10	0.06	5.85	3.49
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5858	107.1	1.93	0.86	1.86	4.65	2.72	0.35	0.27	0.43	1.06	0.62	0.10	0.06	5.81	3.41
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5743	107.1	1.91	0.85	1.86	4.62	2.65	0.35	0.27	0.43	1.06	0.61	0.10	0.06	5.78	3.32
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5630	107.1	1.89	0.85	1.86	4.60	2.59	0.35	0.27	0.43	1.05	0.59	0.10	0.06	5.75	3.24
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5520	107.1	1.87	0.84	1.86	4.57	2.52	0.34	0.27	0.43	1.04	0.58	0.10	0.06	5.71	3.15
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5412	107.1	1.85	0.83	1.86	4.54	2.46	0.34	0.26	0.43	1.04	0.56	0.10	0.05	5.68	3.07
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5306	107.1	1.83	0.82	1.86	4.52	2.40	0.34	0.26	0.43	1.03	0.55	0.10	0.05	5.65	3.00
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5202	107.1	1.81	0.82	1.86	4.49	2.34	0.33	0.26	0.43	1.03	0.53	0.10	0.05	5.61	2.92
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5100	107.1	1.80	0.81	1.86	4.46	2.28	0.33	0.26	0.43	1.02	0.52	0.10	0.05	5.58	2.85
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.5000	107.1	1.78	0.80	1.86	4.44	2.22	0.33	0.25	0.43	1.01	0.51	0.10	0.05	5.55	2.77
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4902	107.1	1.76	0.79	1.86	4.41	2.16	0.32	0.25	0.43	1.01	0.49	0.10	0.05	5.51	2.70
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4806	107.1	1.74	0.78	1.86	4.38	2.11	0.32	0.25	0.43	1.00	0.48	0.09	0.05	5.48	2.63
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.4712	107.1	1.72	0.78	1.86	4.36	2.05	0.32	0.25	0.43	1.00	0.47	0.09	0.04	5.45	2.57
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4620	107.1	1.70	0.77	1.86	4.33	2.00	0.31	0.24	0.43	0.99	0.46	0.09	0.04	5.41	2.50
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4529	107.1	1.68	0.76	1.86	4.30	1.95	0.31	0.24	0.43	0.99	0.45	0.09	0.04	5.38	2.44
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.4440	107.1	1.66	0.75	1.86	4.27	1.90	0.31	0.24	0.43	0.98	0.43	0.09	0.04	5.35	2.37
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.4353	107.1	1.64	0.75	1.86	4.25	1.85	0.30	0.24	0.43	0.97	0.42	0.09	0.04	5.31	2.31
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	2%	0.4268	107.1	1.62	0.74	1.86	4.22	1.80	0.30	0.23	0.43	0.97	0.41	0.09	0.04	5.28	2.25
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	2%	0.4184	107.1	1.60	0.73	1.86	4.19	1.76	0.29	0.23	0.43	0.96	0.40	0.09	0.04	5.24	2.19
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	2%	0.4102	107.1	1.59	0.72	1.86	4.17	1.71	0.29	0.23	0.43	0.96	0.39	0.09	0.04	5.21	2.14
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	2%	0.4022	107.1	1.57	0.72	1.86	4.14	1.67	0.29	0.23	0.43	0.95	0.38	0.09	0.04	5.18	2.08
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	2%	0.3943	107.1	1.55	0.71	1.86	4.11	1.62	0.28	0.22	0.43	0.94	0.37	0.09	0.03	5.14	2.03
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	2%	0.3866	107.1	1.53	0.70	1.86	4.09	1.58	0.28	0.22	0.43	0.94	0.36	0.09	0.03	5.11	1.98
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	2%	0.3790	107.1	1.51	0.69	1.86	4.06	1.54	0.28	0.22	0.43	0.93	0.35	0.08	0.03	5.08	1.92
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	2%	0.3716	107.1	1.49	0.69	1.86	4.03	1.50	0.27	0.22	0.43	0.93	0.34	0.08	0.03	5.04	1.87
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	2%	0.3643	107.1	1.47	0.68	1.86	4.01	1.46	0.27	0.22	0.43	0.92	0.34	0.08	0.03	5.01	1.83
45年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010	2%	0.3572	107.1	1.45	0.67	1.86	3.98	1.42	0.27	0.21	0.43	0.91	0.33	0.08	0.03	4.98	1.78
46年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000	2%	0.3502	107.1	1.43	0.66	1.86	3.95	1.38	0.26	0.21	0.43	0.91	0.32	0.08	0.03	4.94	1.73
47年目	R 61	0.98674	0.98851	0.99993	0.98990	2%	0.3433	107.1	1.41	0.66	1.86	3.93	1.35	0.26	0.21	0.43	0.90	0.31	0.08	0.03	4.91	1.69
48年目	R 62	0.98656	0.98838	0.99993	0.98980	2%	0.3366	107.1	1.40	0.65	1.86	3.90	1.31	0.26	0.21	0.43	0.90	0.30	0.08	0.03	4.88	1.64
49年目	R 63	0.98637	0.98824	0.99993	0.98969	2%	0.3300	107.1	1.38	0.64	1.86	3.87	1.28	0.25	0.20	0.43	0.89	0.29	0.08	0.03	4.84	1.60
合 計									91.87	41.49	92.87	226.22	129.20	16.88	13.16	21.71	51.75	29.54	4.95	2.85	282.91	161.59

費用の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス							単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
							0.439	6.6	2.90	
年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－34年目	S 63	4%	4.0247	104.7	0.20	0.82				
－33年目	H 1	4%	3.8699	107.5	0.19	0.73				
－32年目	H 2	4%	3.7211	109.9	0.19	0.69				
－31年目	H 3	4%	3.5780	112.5	0.39	1.33				
－30年目	H 4	4%	3.4404	114.1	2.23	7.20				
－29年目	H 5	4%	3.3081	114.4	5.45	16.88				
－28年目	H 6	4%	3.1809	114.3	6.25	18.63				
－27年目	H 7	4%	3.0586	113.7	5.08	14.64				
－26年目	H 8	4%	2.9410	113.2	6.32	17.59				
－25年目	H 9	4%	2.8279	114.2	4.68	12.41				
－24年目	H 10	4%	2.7191	113.6	12.63	32.38				
－23年目	H 11	4%	2.6145	112.0	6.99	17.48				
－22年目	H 12	4%	2.5139	110.7	20.13	48.96				
－21年目	H 13	4%	2.4172	109.4	3.38	8.00				
－20年目	H 14	4%	2.3242	107.6	7.52	17.40				
－19年目	H 15	4%	2.2348	106.1	7.06	15.93				
－18年目	H 16	4%	2.1488	105.0	3.15	6.90				
－17年目	H 17	4%	2.0662	103.7	2.49	5.31				
－16年目	H 18	4%	1.9867	103.0	1.30	2.69				
－15年目	H 19	4%	1.9103	102.1	4.67	9.36				
－14年目	H 20	4%	1.8368	101.6	0.31	0.60				
－13年目	H 21	4%	1.7662	100.3	0.10	0.19				
－12年目	H 22	4%	1.6983	98.6	4.00	7.38				
－11年目	H 23	4%	1.6330	97.2	3.89	7.00				
－10年目	H 24	4%	1.5702	96.4	16.58	28.92				
－9年目	H 25	4%	1.5098	96.4	3.41	5.72				
－8年目	H 26	4%	1.4517	98.7	7.60	11.97				
－7年目	H 27	4%	1.3959	100.2	3.15	4.70				
－6年目	H 28	4%	1.3422	100.3	4.08	5.85				
－5年目	H 29	4%	1.2906	100.5	5.03	6.92				
－4年目	H 30	4%	1.2410	100.4	9.26	12.26				
－3年目	R 1	4%	1.1933	101.2	10.45	13.20				
－2年目	R 2	4%	1.1474	101.9	9.55	11.52				
－1年目	R 3	4%	1.1033	101.8	5.91	6.86				
部分供用開始	R 4	4%	1.0609	102.7	4.55	5.03	2.15	2.38		
1年目	R 5	1%	1.0201	107.1	6.82	6.96	2.15	2.19		
2年目	R 6	1%	1.0100	107.1	6.82	6.89	2.15	2.17		
3年目	R 7	1%	1.0000	107.1	4.91	4.91	2.15	2.15		
4年目	R 8	1%	0.9901	107.1	9.55	9.46	2.15	2.13		
5年目	R 9	1%	0.9803	107.1	9.55	9.36	2.15	2.11		
6年目	R 10	1%	0.9706	107.1	9.55	9.27	2.15	2.09		
7年目	R 11	1%	0.9610	107.1	9.55	9.18	2.15	2.07		
8年目	R 12	1%	0.9515	107.1	9.55	9.09	2.15	2.05		
供用開始(9年目)	R 13	1%	0.9421	107.1	9.23	8.70	2.15	2.03		
10年目	R 14	1%	0.9328	107.1			2.64	2.46		
11年目	R 15	1%	0.9236	107.1			2.64	2.44		
12年目	R 16	1%	0.9145	107.1			2.64	2.41		
13年目	R 17	1%	0.9054	107.1			2.64	2.39		
14年目	R 18	1%	0.8964	107.1			2.64	2.37		
15年目	R 19	1%	0.8875	107.1			2.64	2.34		
16年目	R 20	1%	0.8787	107.1			2.64	2.32		
17年目	R 21	1%	0.8700	107.1			2.64	2.30		
18年目	R 22	1%	0.8614	107.1			2.64	2.27		
19年目	R 23	1%	0.8529	107.1			2.64	2.25		
20年目	R 24	1%	0.8445	107.1			2.64	2.23		
21年目	R 25	1%	0.8361	107.1			2.64	2.21		
22年目	R 26	1%	0.8278	107.1			2.64	2.19		
23年目	R 27	1%	0.8196	107.1			2.64	2.16		
24年目	R 28	1%	0.8115	107.1			2.64	2.14		
25年目	R 29	1%	0.8035	107.1			2.64	2.12		
26年目	R 30	1%	0.7955	107.1			2.64	2.10		
27年目	R 31	1%	0.7876	107.1			2.64	2.08		
28年目	R 32	1%	0.7798	107.1			2.64	2.06		
29年目	R 33	1%	0.7721	107.1			2.64	2.04		
30年目	R 34	1%	0.7645	107.1			2.64	2.02		
31年目	R 35	1%	0.7569	107.1			2.64	2.00		
32年目	R 36	1%	0.7494	107.1			2.64	1.98		
33年目	R 37	1%	0.7420	107.1			2.64	1.96		
34年目	R 38	1%	0.7347	107.1			2.64	1.94		
35年目	R 39	1%	0.7274	107.1			2.64	1.92		
36年目	R 40	1%	0.7202	107.1			2.64	1.90		
37年目	R 41	1%	0.7131	107.1			2.64	1.88		
38年目	R 42	1%	0.7060	107.1			2.64	1.86		
39年目	R 43	1%	0.6990	107.1			2.64	1.85		
40年目	R 44	1%	0.6921	107.1			2.64	1.83		
41年目	R 45	1%	0.6852	107.1			2.64	1.81		
42年目	R 46	1%	0.6784	107.1			2.64	1.79		
43年目	R 47	1%	0.6717	107.1			2.64	1.77		
44年目	R 48	1%	0.6650	107.1			2.64	1.76		
45年目	R 49	1%	0.6584	107.1			2.64	1.74		
46年目	R 50	1%	0.6519	107.1			2.64	1.72		
47年目	R 51	1%	0.6454	107.1			2.64	1.70		
48年目	R 52	1%	0.6390	107.1			2.64	1.69		
49年目	R 53	1%	0.6327	107.1	-54.37	-34.40	2.64	1.67		
合 計					209.33	422.87	127.10	103.04	0.00	0.00
単純事業費計					263.70		127.10		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 浦佐バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス						単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
						0.325		1.6		0.52	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
－6年目	R 8	1%	0.9901	107.1	9.55	9.46					
－5年目	R 9	1%	0.9803	107.1	9.55	9.36					
－4年目	R 10	1%	0.9706	107.1	9.55	9.27					
－3年目	R 11	1%	0.9610	107.1	9.55	9.18					
－2年目	R 12	1%	0.9515	107.1	9.55	9.09					
－1年目	R 13	1%	0.9421	107.1	9.23	8.70					
供用開始	R 14	1%	0.9328	107.1			0.47	0.44			
1年目	R 15	1%	0.9236	107.1			0.47	0.43			
2年目	R 16	1%	0.9145	107.1			0.47	0.43			
3年目	R 17	1%	0.9054	107.1			0.47	0.43			
4年目	R 18	1%	0.8964	107.1			0.47	0.42			
5年目	R 19	1%	0.8875	107.1			0.47	0.42			
6年目	R 20	1%	0.8787	107.1			0.47	0.41			
7年目	R 21	1%	0.8700	107.1			0.47	0.41			
8年目	R 22	1%	0.8614	107.1			0.47	0.40			
9年目	R 23	1%	0.8529	107.1			0.47	0.40			
10年目	R 24	1%	0.8445	107.1			0.47	0.40			
11年目	R 25	1%	0.8361	107.1			0.47	0.39			
12年目	R 26	1%	0.8278	107.1			0.47	0.39			
13年目	R 27	1%	0.8196	107.1			0.47	0.39			
14年目	R 28	1%	0.8115	107.1			0.47	0.38			
15年目	R 29	1%	0.8035	107.1			0.47	0.38			
16年目	R 30	1%	0.7955	107.1			0.47	0.37			
17年目	R 31	1%	0.7876	107.1			0.47	0.37			
18年目	R 32	1%	0.7798	107.1			0.47	0.37			
19年目	R 33	1%	0.7721	107.1			0.47	0.36			
20年目	R 34	1%	0.7645	107.1			0.47	0.36			
21年目	R 35	1%	0.7569	107.1			0.47	0.36			
22年目	R 36	1%	0.7494	107.1			0.47	0.35			
23年目	R 37	1%	0.7420	107.1			0.47	0.35			
24年目	R 38	1%	0.7347	107.1			0.47	0.35			
25年目	R 39	1%	0.7274	107.1			0.47	0.34			
26年目	R 40	1%	0.7202	107.1			0.47	0.34			
27年目	R 41	1%	0.7131	107.1			0.47	0.34			
28年目	R 42	1%	0.7060	107.1			0.47	0.33			
29年目	R 43	1%	0.6990	107.1			0.47	0.33			
30年目	R 44	1%	0.6921	107.1			0.47	0.33			
31年目	R 45	1%	0.6852	107.1			0.47	0.32			
32年目	R 46	1%	0.6784	107.1			0.47	0.32			
33年目	R 47	1%	0.6717	107.1			0.47	0.32			
34年目	R 48	1%	0.6650	107.1			0.47	0.31			
35年目	R 49	1%	0.6584	107.1			0.47	0.31			
36年目	R 50	1%	0.6519	107.1			0.47	0.31			
37年目	R 51	1%	0.6454	107.1			0.47	0.30			
38年目	R 52	1%	0.6390	107.1			0.47	0.30			
39年目	R 53	1%	0.6327	107.1			0.47	0.30			
40年目	R 54	1%	0.6264	107.1			0.47	0.29			
41年目	R 55	1%	0.6202	107.1			0.47	0.29			
42年目	R 56	1%	0.6141	107.1			0.47	0.29			
43年目	R 57	1%	0.6080	107.1			0.47	0.29			
44年目	R 58	1%	0.6020	107.1			0.47	0.28			
45年目	R 59	1%	0.5960	107.1			0.47	0.28			
46年目	R 60	1%	0.5901	107.1			0.47	0.28			
47年目	R 61	1%	0.5843	107.1			0.47	0.27			
48年目	R 62	1%	0.5785	107.1			0.47	0.27			
49年目	R 63	1%	0.5728	107.1	0.00	0.00	0.47	0.27			
合 計					56.98	55.06	23.50	17.37	0.00	0.00	
単純事業費計					56.98		23.50		0.00		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.0609	102.7	1.29	0.54	0.95	2.78	3.07	0.29	0.13	0.26	0.67	0.74	0.04	0.04	3.49	3.86
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	1%	1.0201	107.1	1.28	0.54	0.95	2.76	2.82	0.28	0.13	0.26	0.67	0.68	0.04	0.04	3.47	3.54
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	1%	1.0100	107.1	1.27	0.53	0.95	2.74	2.77	0.28	0.13	0.26	0.66	0.67	0.04	0.04	3.45	3.48
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	1%	1.0000	107.1	1.25	0.53	0.95	2.73	2.73	0.28	0.12	0.26	0.66	0.66	0.04	0.04	3.43	3.43
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	1%	0.9901	107.1	1.24	0.52	0.95	2.71	2.69	0.28	0.12	0.26	0.66	0.65	0.04	0.04	3.41	3.37
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	1%	0.9803	107.1	1.23	0.52	0.95	2.70	2.64	0.27	0.12	0.26	0.65	0.64	0.04	0.04	3.39	3.32
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	1%	0.9706	107.1	1.22	0.52	0.95	2.68	2.60	0.27	0.12	0.26	0.65	0.63	0.04	0.04	3.37	3.27
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	1%	0.9610	107.1	1.21	0.51	0.95	2.66	2.56	0.27	0.12	0.26	0.65	0.62	0.04	0.03	3.35	3.22
8年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	1%	0.9515	107.1	1.20	0.51	0.95	2.65	2.52	0.27	0.12	0.26	0.64	0.61	0.04	0.03	3.33	3.17
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9421	107.1	1.18	0.50	0.95	2.63	2.48	0.26	0.12	0.26	0.64	0.60	0.04	0.03	3.31	3.12
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9328	107.1	3.66	1.59	2.60	7.85	7.32	0.50	0.39	0.58	1.47	1.38	0.11	0.10	9.43	8.80
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9236	107.1	3.65	1.57	2.60	7.82	7.22	0.49	0.39	0.59	1.47	1.36	0.11	0.10	9.39	8.68
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9145	107.1	3.63	1.55	2.61	7.79	7.12	0.49	0.38	0.59	1.46	1.34	0.11	0.10	9.36	8.56
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.9054	107.1	3.62	1.53	2.62	7.76	7.03	0.49	0.38	0.59	1.46	1.32	0.11	0.10	9.32	8.44
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8964	107.1	3.60	1.51	2.62	7.73	6.93	0.49	0.37	0.59	1.45	1.30	0.11	0.09	9.29	8.33
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8875	107.1	3.58	1.49	2.63	7.70	6.84	0.49	0.37	0.59	1.45	1.28	0.10	0.09	9.25	8.21
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8787	107.1	3.57	1.47	2.64	7.67	6.74	0.48	0.36	0.59	1.44	1.27	0.10	0.09	9.22	8.10
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8700	107.1	3.55	1.45	2.64	7.64	6.65	0.48	0.36	0.59	1.44	1.25	0.10	0.09	9.18	7.99
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8614	107.1	3.52	1.44	2.64	7.60	6.55	0.48	0.36	0.59	1.43	1.23	0.10	0.09	9.13	7.87
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8529	107.1	3.49	1.43	2.64	7.56	6.45	0.47	0.35	0.59	1.42	1.21	0.10	0.09	9.08	7.75
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8445	107.1	3.46	1.41	2.64	7.52	6.35	0.47	0.35	0.59	1.41	1.19	0.10	0.09	9.03	7.63
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8361	107.1	3.43	1.40	2.64	7.47	6.25	0.46	0.35	0.59	1.41	1.18	0.10	0.08	8.98	7.51
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8278	107.1	3.40	1.39	2.64	7.43	6.15	0.46	0.35	0.59	1.40	1.16	0.10	0.08	8.93	7.39
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8196	107.1	3.37	1.38	2.64	7.39	6.05	0.46	0.34	0.59	1.39	1.14	0.10	0.08	8.88	7.28
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8115	107.1	3.34	1.37	2.64	7.34	5.96	0.45	0.34	0.59	1.39	1.12	0.10	0.08	8.83	7.16
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.8035	107.1	3.30	1.36	2.64	7.30	5.87	0.45	0.34	0.59	1.38	1.11	0.10	0.08	8.78	7.05
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7955	107.1	3.27	1.35	2.64	7.26	5.77	0.44	0.33	0.59	1.37	1.09	0.10	0.08	8.73	6.94
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7876	107.1	3.24	1.33	2.64	7.22	5.68	0.44	0.33	0.59	1.36	1.07	0.10	0.08	8.68	6.83
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7798	107.1	3.21	1.32	2.64	7.17	5.59	0.43	0.33	0.59	1.36	1.06	0.10	0.07	8.63	6.73
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7721	107.1	3.18	1.31	2.64	7.13	5.51	0.43	0.33	0.59	1.35	1.04	0.09	0.07	8.58	6.62
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7645	107.1	3.15	1.30	2.64	7.09	5.42	0.43	0.32	0.59	1.34	1.03	0.09	0.07	8.53	6.52
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7569	107.1	3.12	1.29	2.64	7.05	5.33	0.42	0.32	0.59	1.34	1.01	0.09	0.07	8.47	6.41
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7494	107.1	3.09	1.28	2.64	7.00	5.25	0.42	0.32	0.59	1.33	1.00	0.09	0.07	8.42	6.31
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7420	107.1	3.06	1.26	2.64	6.96	5.16	0.41	0.31	0.59	1.32	0.98	0.09	0.07	8.37	6.21
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7347	107.1	3.03	1.25	2.64	6.92	5.08	0.41	0.31	0.59	1.32	0.97	0.09	0.07	8.32	6.11
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7274	107.1	2.99	1.24	2.64	6.87	5.00	0.41	0.31	0.59	1.31	0.95	0.09	0.07	8.27	6.02
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7202	107.1	2.96	1.23	2.64	6.83	4.92	0.40	0.31	0.59	1.30	0.94	0.09	0.06	8.22	5.92
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7131	107.1	2.93	1.22	2.64	6.79	4.84	0.40	0.30	0.59	1.29	0.92	0.09	0.06	8.17	5.83
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.7060	107.1	2.90	1.21	2.64	6.75	4.76	0.39	0.30	0.59	1.29	0.91	0.09	0.06	8.12	5.73
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6990	107.1	2.87	1.20	2.64	6.70	4.69	0.39	0.30	0.59	1.28	0.89	0.09	0.06	8.07	5.64
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6921	107.1	2.84	1.18	2.64	6.66	4.61	0.38	0.29	0.59	1.27	0.88	0.09	0.06	8.02	5.55
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6852	107.1	2.81	1.17	2.64	6.62	4.53	0.38	0.29	0.59	1.27	0.87	0.09	0.06	7.97	5.46
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6784	107.1	2.78	1.16	2.64	6.58	4.46	0.38	0.29	0.59	1.26	0.85	0.08	0.06	7.92	5.37
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6717	107.1	2.75	1.15	2.64	6.53	4.39	0.37	0.29	0.59	1.25	0.84	0.08	0.06	7.87	5.28
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6650	107.1	2.71	1.14	2.64	6.49	4.32	0.37	0.28	0.59	1.24	0.83	0.08	0.06	7.82	5.20
45年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6584	107.1	2.68	1.13	2.64	6.45	4.24	0.36	0.28	0.59	1.24	0.81	0.08	0.05	7.77	5.11
46年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	1%	0.6519	107.1	2.65	1.12	2.64	6.40	4.18	0.36	0.28	0.59	1.23	0.80	0.08	0.05	7.72	5.03
47年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	1%	0.6454	107.1	2.62	1.10	2.64	6.36	4.11	0.35	0.27	0.59	1.22	0.79	0.08	0.05	7.67	4.95
48年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	1%	0.6390	107.1	2.59	1.09	2.64	6.32	4.04	0.35	0.27	0.59	1.22	0.78	0.08	0.05	7.61	4.87
49年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	1%	0.6327	107.1	2.56	1.08	2.64	6.28	3.97	0.35	0.27	0.59	1.21	0.76	0.08	0.05	7.56	4.79
合 計									138.53	57.66	114.85	311.04	248.20	19.83	14.25	26.30	60.38	48.43	4.13	3.31	375.56	299.94

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 浦佐バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9328	107.1	2.24	1.05	1.83	5.12	4.78	0.41	0.33	0.43	1.17	1.09	0.12	0.11	6.42	5.98
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9236	107.1	2.23	1.04	1.83	5.11	4.72	0.41	0.33	0.43	1.17	1.08	0.12	0.11	6.39	5.90
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9145	107.1	2.22	1.03	1.84	5.09	4.65	0.41	0.33	0.43	1.16	1.06	0.12	0.11	6.37	5.82
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.9054	107.1	2.21	1.01	1.84	5.07	4.59	0.41	0.32	0.43	1.16	1.05	0.12	0.10	6.34	5.74
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8964	107.1	2.20	1.00	1.85	5.05	4.53	0.40	0.32	0.43	1.15	1.03	0.11	0.10	6.32	5.67
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8875	107.1	2.19	0.99	1.85	5.03	4.47	0.40	0.31	0.43	1.15	1.02	0.11	0.10	6.30	5.59
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8787	107.1	2.19	0.97	1.86	5.02	4.41	0.40	0.31	0.43	1.14	1.01	0.11	0.10	6.27	5.51
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8700	107.1	2.18	0.96	1.86	5.00	4.35	0.40	0.30	0.44	1.14	0.99	0.11	0.10	6.25	5.44
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8614	107.1	2.16	0.95	1.86	4.97	4.28	0.40	0.30	0.44	1.13	0.98	0.11	0.10	6.22	5.36
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8529	107.1	2.14	0.94	1.86	4.94	4.22	0.39	0.30	0.44	1.13	0.96	0.11	0.10	6.18	5.27
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8445	107.1	2.12	0.94	1.86	4.92	4.15	0.39	0.30	0.44	1.12	0.95	0.11	0.09	6.15	5.19
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8361	107.1	2.10	0.93	1.86	4.89	4.09	0.39	0.29	0.44	1.12	0.93	0.11	0.09	6.12	5.11
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8278	107.1	2.08	0.92	1.86	4.86	4.03	0.38	0.29	0.44	1.11	0.92	0.11	0.09	6.08	5.04
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8196	107.1	2.06	0.91	1.86	4.84	3.96	0.38	0.29	0.44	1.10	0.90	0.11	0.09	6.05	4.96
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8115	107.1	2.04	0.91	1.86	4.81	3.90	0.38	0.29	0.44	1.10	0.89	0.11	0.09	6.02	4.88
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.8035	107.1	2.02	0.90	1.86	4.78	3.84	0.37	0.29	0.44	1.09	0.88	0.11	0.09	5.98	4.81
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7955	107.1	2.00	0.89	1.86	4.76	3.78	0.37	0.28	0.44	1.09	0.86	0.11	0.08	5.95	4.73
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7876	107.1	1.99	0.88	1.86	4.73	3.73	0.36	0.28	0.44	1.08	0.85	0.11	0.08	5.92	4.66
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7798	107.1	1.97	0.88	1.86	4.70	3.67	0.36	0.28	0.44	1.07	0.84	0.10	0.08	5.88	4.59
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7721	107.1	1.95	0.87	1.86	4.68	3.61	0.36	0.28	0.44	1.07	0.82	0.10	0.08	5.85	4.52
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7645	107.1	1.93	0.86	1.86	4.65	3.55	0.35	0.27	0.43	1.06	0.81	0.10	0.08	5.81	4.45
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7569	107.1	1.91	0.85	1.86	4.62	3.50	0.35	0.27	0.43	1.06	0.80	0.10	0.08	5.78	4.38
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7494	107.1	1.89	0.85	1.86	4.60	3.44	0.35	0.27	0.43	1.05	0.79	0.10	0.08	5.75	4.31
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7420	107.1	1.87	0.84	1.86	4.57	3.39	0.34	0.27	0.43	1.04	0.77	0.10	0.07	5.71	4.24
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7347	107.1	1.85	0.83	1.86	4.54	3.34	0.34	0.26	0.43	1.04	0.76	0.10	0.07	5.68	4.17
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7274	107.1	1.83	0.82	1.86	4.52	3.28	0.34	0.26	0.43	1.03	0.75	0.10	0.07	5.65	4.11
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7202	107.1	1.81	0.82	1.86	4.49	3.23	0.33	0.26	0.43	1.03	0.74	0.10	0.07	5.61	4.04
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7131	107.1	1.80	0.81	1.86	4.46	3.18	0.33	0.26	0.43	1.02	0.73	0.10	0.07	5.58	3.98
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.7060	107.1	1.78	0.80	1.86	4.44	3.13	0.33	0.25	0.43	1.01	0.72	0.10	0.07	5.55	3.92
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6990	107.1	1.76	0.79	1.86	4.41	3.08	0.32	0.25	0.43	1.01	0.71	0.10	0.07	5.51	3.85
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6921	107.1	1.74	0.78	1.86	4.38	3.03	0.32	0.25	0.43	1.00	0.69	0.09	0.07	5.48	3.79
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6852	107.1	1.72	0.78	1.86	4.36	2.98	0.32	0.25	0.43	1.00	0.68	0.09	0.06	5.45	3.73
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6784	107.1	1.70	0.77	1.86	4.33	2.94	0.31	0.24	0.43	0.99	0.67	0.09	0.06	5.41	3.67
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6717	107.1	1.68	0.76	1.86	4.30	2.89	0.31	0.24	0.43	0.99	0.66	0.09	0.06	5.38	3.61
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6650	107.1	1.66	0.75	1.86	4.27	2.84	0.31	0.24	0.43	0.98	0.65	0.09	0.06	5.35	3.55
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6584	107.1	1.64	0.75	1.86	4.25	2.80	0.30	0.24	0.43	0.97	0.64	0.09	0.06	5.31	3.50
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	1%	0.6519	107.1	1.62	0.74	1.86	4.22	2.75	0.30	0.23	0.43	0.97	0.63	0.09	0.06	5.28	3.44
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	1%	0.6454	107.1	1.60	0.73	1.86	4.19	2.71	0.29	0.23	0.43	0.96	0.62	0.09	0.06	5.24	3.39
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	1%	0.6390	107.1	1.59	0.72	1.86	4.17	2.66	0.29	0.23	0.43	0.96	0.61	0.09	0.06	5.21	3.33
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	1%	0.6327	107.1	1.57	0.72	1.86	4.14	2.62	0.29	0.23	0.43	0.95	0.60	0.09	0.06	5.18	3.28
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	1%	0.6264	107.1	1.55	0.71	1.86	4.11	2.58	0.28	0.22	0.43	0.94	0.59	0.09	0.05	5.14	3.22
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	1%	0.6202	107.1	1.53	0.70	1.86	4.09	2.54	0.28	0.22	0.43	0.94	0.58	0.09	0.05	5.11	3.17
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	1%	0.6141	107.1	1.51	0.69	1.86	4.06	2.49	0.28	0.22	0.43	0.93	0.57	0.08	0.05	5.08	3.12
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	1%	0.6080	107.1	1.49	0.69	1.86	4.03	2.45	0.27	0.22	0.43	0.93	0.56	0.08	0.05	5.04	3.07
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	1%	0.6020	107.1	1.47	0.68	1.86	4.01	2.41	0.27	0.22							
