

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道1号 静清バイパス
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	事業全体：費用便益比（B／C）＝1.2 （経済的純現在価値（B－C）＝675億円、経済的内部収益率（E I R R）＝4.5%） 残事業：費用便益比（B／C）＝4.3 （経済的純現在価値（B－C）＝622億円、経済的内部収益率（E I R R）＝16.9%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：2,351.7万人・時間/年 渋滞損失削減時間：557.9万人・時間/年（2,351.7万人・時間/年⇒1,793.8万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：（該当区間名） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：895.8万人・時間/年（静清バイパス：興津IC～丸子IC） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約4割削減（静清バイパス：興津IC～丸子IC）
	■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	清水立体事業区間、改善見込み（旅行速度17.1km/h⇒60.0km/h）等
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上 の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	利便性向上が見込まれるバス路線（静鉄バス中部国道線 85便/日、北街道線 55便/日、三保山の手線 96便/日）
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	
	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	国際拠点港湾 清水港へのアクセス性向上（清水港～東名高速清水IC：約9分⇒約4分）
	□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	

	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
都市の再生		
	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	当該区間は中心市街地（DID区間）内の事業である
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		
	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	地域高規格道路「静岡東西道路」の一部を構成
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
個性ある地域の形成		
	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	清水港長期構想（令和元年8月策定）
	<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2.暮らし		
歩行者・自転車のための生活空間の形成		
	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
	<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成		
	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	

		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保		
		<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	静岡県立総合病院へのアクセス性向上（興津 I C→静岡県立総合病院：約27分⇒約18分）
3. 安全	安全な生活環境の確保		
		<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え		
		<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	静岡県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけ
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道149号・国道150号清水駅前交差点～中島交差点（第一次緊急輸送路）
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全		
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：21.9千t/年（3,483.8千t/年⇒3,461.9千t/年）
	生活環境の改善・保全		
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象外 （推計結果） 評価対象区間（並行区間：国道1号・国道150号・静岡清水線・静岡草薙清水線） 排出削減量：32.0t/年、排出削減率：約1割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：29.0t/年
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象外 （推計結果） 評価対象区間（並行区間：国道1号・国道150号・静岡清水線・静岡草薙清水線） 排出削減量：1.8t/年、排出削減率：約1割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてSPM排出削減量：1.1t/年
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係		
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道1号	静岡バイパス	L＝24.2km	地域高規格	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
60,400	4	中部地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和7年度			
単純合計	1,750億円	292億円		2,042億円
うち残事業分	194億円	46億円		241億円
基準年における 現在価値（Ｃ）	3,343億円	103億円		3,446億円
うち残事業分	174億円	16億円		190億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和7年度			
供用年	令和13年度			
単年便益 (初年便益)	224億円	20億円	5.2億円	249億円
基準年における 現在価値（Ｂ）	3,709億円	327億円	85億円	4,120億円
うち残事業分	667億円	112億円	34億円	812億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	1.2 〔4%〕	〔参考〕 1.9 〔2%〕	〔参考〕 2.5 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	675億円 〔4%〕	〔参考〕 3,145億円 〔2%〕	〔参考〕 5,109億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	4.5		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	4.3 〔4%〕	〔参考〕 6.1 〔2%〕	〔参考〕 7.5 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	622億円 〔4%〕	〔参考〕 1,076億円 〔2%〕	〔参考〕 1,445億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	16.9		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	60,400台／日	± 1 0 %	1.1 ～ 1.3
事業費	1,750億円	± 1 0 %	1.2 ～ 1.2
事業期間	59年	± 2 0 %	1.1 ～ 1.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	60,400台／日	± 1 0 %	3.8 ～ 4.7
事業費	194億円	± 1 0 %	3.9 ～ 4.7
事業期間	5年	± 2 0 %	4.1 ～ 4.3

交通状況の変化

様式－3①

事業名：一般国道1号 静清バイパス（事業全体）


（推計時点 R22年）

				整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 改築区間：24.2km		交通量※1	[台/日]	46,200	60,400
		走行時間※2	[分]	46	31
		走行時間費用※3	[億円/年]	446.41	399.92
②主な周 辺道路※4	国道1号： 23.4km	交通量	[台/日]	28,700	26,300
		走行時間	[分]	65	62
		走行時間費用	[億円/年]	363.25	313.22
	国道150号： 18.7km	交通量	[台/日]	24,000	23,000
		走行時間	[分]	42	41
		走行時間費用	[億円/年]	209.80	198.92
	(主) 静岡清水線： 11.7km	交通量	[台/日]	20,600	17,200
		走行時間	[分]	35	34
		走行時間費用	[億円/年]	141.99	113.31
	(県) 静岡草薙清水 線： 10.0km	交通量	[台/日]	20,600	20,200
		走行時間	[分]	30	29
		走行時間費用	[億円/年]	124.08	120.54
③その他道路合計 1585.4km		走行時間費用	[億円/年]	12,184.99	12,102.80

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1673.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	13,470.53	13,248.72	221.81

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)

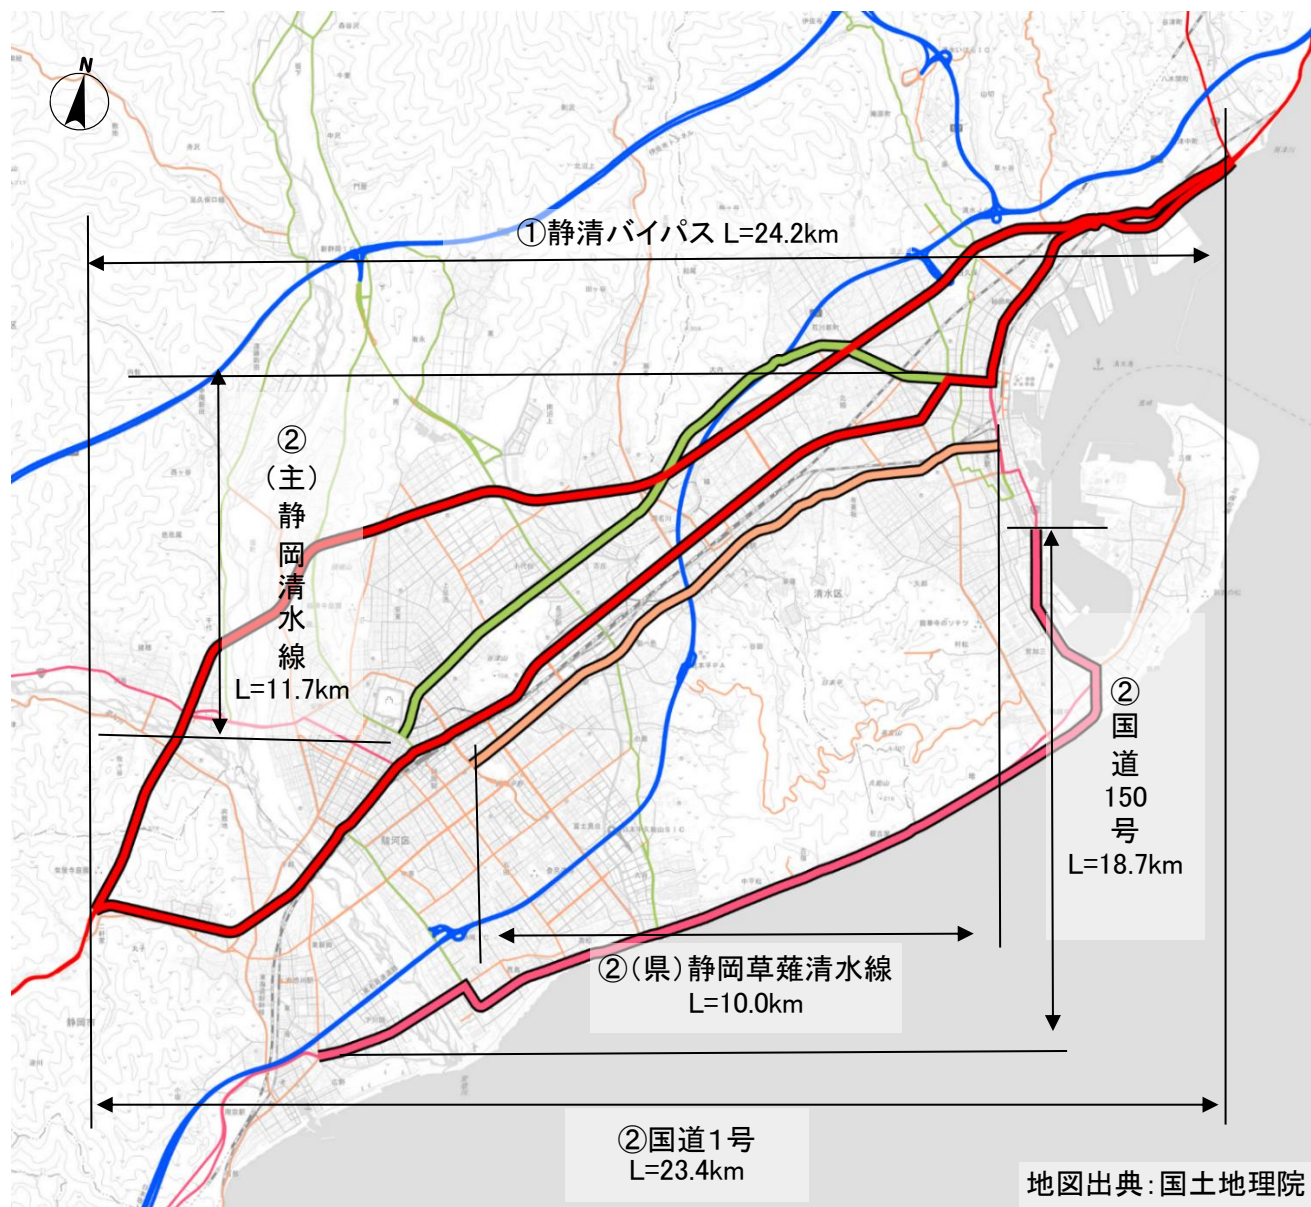



交通状況の変化

様式－3①

事業名：一般国道1号 静清バイパス（残事業）

（推計時点 R22年）

				整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 改築区間：24.2km		交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	59,100	60,400
		走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	34	31
		走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	430.66	399.92
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	国道1号： 23.4km	交通量	[台/日]	27,300	26,300
		走行時間	[分]	63	62
		走行時間費用	[億円/年]	324.32	313.22
	国道150号： 18.7km	交通量	[台/日]	23,100	23,000
		走行時間	[分]	41	41
		走行時間費用	[億円/年]	199.93	198.92
	(主) 静岡清水線： 11.7km	交通量	[台/日]	17,400	17,200
		走行時間	[分]	34	34
		走行時間費用	[億円/年]	113.77	113.31
	(県) 静岡草薙清水線： 10.0km	交通量	[台/日]	20,700	20,200
		走行時間	[分]	30	29
		走行時間費用	[億円/年]	123.67	120.54
③その他道路合計 1585.4km		走行時間費用	[億円/年]	12,096.10	12,102.80

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1673.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	13,288.46	13,248.72	39.74

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)

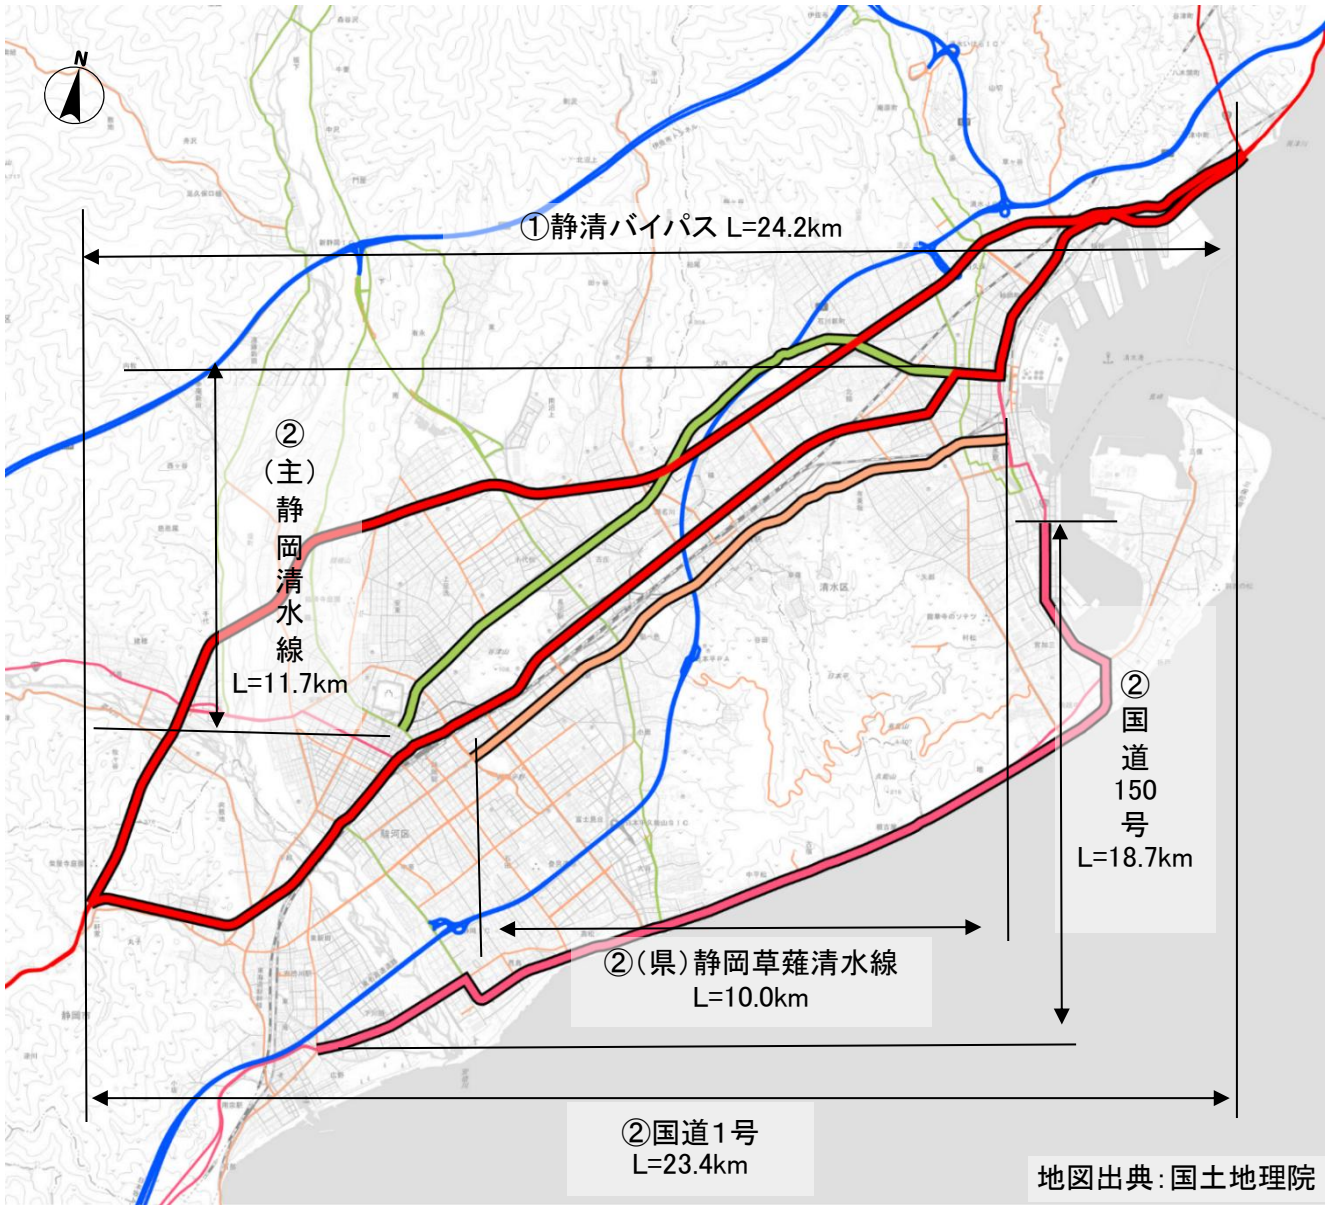

## 費用便益分析の条件

事業名：一般国道1号 静岡バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年8月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和7年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他( )	<input type="checkbox"/>	
		開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有		<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日	
	考慮した理由を記載			
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		Q－V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
			その他( )	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin～Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
	その他( )	<input type="checkbox"/>		

事業名：一般国道1号 静清バイパス

(3)

項目			チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	(     ) %
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	(     ) 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(     ) 日
			採用した冬期日数の考え方を記載	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 (                                  )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出根拠を添付すること			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名：一般国道1号 静清バイパス

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他( )	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価(実績値)を使用		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
維持管理費を考慮			<input type="checkbox"/>	
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他 上記のほか、B／Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(事業全体)							維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
							0.27	24.2	6.43	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－59年目	S 47	4%	7.9941	50.2	0.09	1.46				
－58年目	S 48	4%	7.6866	57.8						
－57年目	S 49	4%	7.3910	69.0						
－56年目	S 50	4%	7.1067	72.9	0.63	6.62				
－55年目	S 51	4%	6.8333	79.1	3.79	35.08				
－54年目	S 52	4%	6.5705	83.8	1.76	14.80				
－53年目	S 53	4%	6.3178	87.4	1.46	11.28				
－52年目	S 54	4%	6.0748	89.6	4.90	35.57				
－51年目	S 55	4%	5.8412	95.3	5.76	37.80				
－50年目	S 56	4%	5.6165	97.8	5.52	33.96				
－49年目	S 57	4%	5.4005	98.9	2.94	17.18				
－48年目	S 58	4%	5.1928	99.8	6.00	33.43				
－47年目	S 59	4%	4.9931	101.8	9.28	48.76				
－46年目	S 60	4%	4.8010	102.6	11.73	58.79				
－45年目	S 61	4%	4.6164	104.4	11.75	55.63				
－44年目	S 62	4%	4.4388	104.1	14.90	68.05				
－43年目	S 63	4%	4.2681	104.7	10.07	43.96				
－42年目	H 1	4%	4.1039	107.5	10.04	41.04				
－41年目	H 2	4%	3.9461	109.9	9.52	36.61				
－40年目	H 3	4%	3.7943	112.5	18.95	68.45				
－39年目	H 4	4%	3.6484	114.1	6.62	22.66				
－38年目	H 5	4%	3.5081	114.4	19.99	65.64				
－37年目	H 6	4%	3.3731	114.3	1.38	4.37				
－36年目	H 7	4%	3.2434	113.7	4.42	13.51				
－35年目	H 8	4%	3.1187	113.2	0.75	2.22				
－34年目	H 9	4%	2.9987	114.2	3.14	8.84				
－33年目	H 10	4%	2.8834	113.6	4.48	12.17				
－32年目	H 11	4%	2.7725	112.0	13.52	35.85				
－31年目	H 12	4%	2.6658	110.7	16.97	43.78				
－30年目	H 13	4%	2.5633	109.4	49.69	124.70				
－29年目	H 14	4%	2.4647	107.6	48.10	117.99				
－28年目	H 15	4%	2.3699	106.1	44.48	106.40				
－27年目	H 16	4%	2.2788	105.0	51.35	119.36				
－26年目	H 17	4%	2.1911	103.7	64.94	146.96				
－25年目	H 18	4%	2.1068	103.0	59.05	129.37				
－24年目	H 19	4%	2.0258	102.1	75.47	160.37				
－23年目	H 20	4%	1.9479	101.6	60.56	124.35				
－22年目	H 21	4%	1.8730	100.3	56.63	113.25				
－21年目	H 22	4%	1.8009	98.6	47.25	92.43				
－20年目	H 23	4%	1.7317	97.2	43.30	82.62				
－19年目	H 24	4%	1.6651	96.4	44.99	83.22				
－18年目	H 25	4%	1.6010	96.4	51.88	92.29				
－17年目	H 26	4%	1.5395	98.7	38.69	64.63				
－16年目	H 27	4%	1.4802	100.2	35.94	56.86				
－15年目	H 28	4%	1.4233	100.2	45.95	69.91				
－14年目	H 29	4%	1.3686	100.5	54.48	79.45				
－13年目	H 30	4%	1.3159	100.4	37.61	52.79				
－12年目	R 1	4%	1.2653	101.2	48.64	65.14				
－11年目	R 2	4%	1.2167	101.9	48.93	62.56				
－10年目	R 3	4%	1.1699	101.8	67.11	82.60				
－9年目	R 4	4%	1.1249	102.7	76.28	89.48				
－8年目	R 5	4%	1.0816	107.1	79.88	86.40				
－7年目	R 6	4%	1.0400	107.1	74.00	76.96				
基準年	R 7	4%	1.0000	107.1	49.65	49.65				
－5年目	R 8	4%	0.9615	107.1	49.05	47.17				
－4年目	R 9	4%	0.9246	107.1	40.17	37.14				
－3年目	R 10	4%	0.8890	107.1	36.68	32.61				
－2年目	R 11	4%	0.8548	107.1	35.05	29.96				
－1年目	R 12	4%	0.8219	107.1	33.37	27.43				
供用開始年次	R 13	4%	0.7903	107.1			5.85	4.62		
1年目	R 14	4%	0.7599	107.1			5.85	4.44		
2年目	R 15	4%	0.7307	107.1			5.85	4.27		
3年目	R 16	4%	0.7026	107.1			5.85	4.11		
4年目	R 17	4%	0.6756	107.1			5.85	3.95		
5年目	R 18	4%	0.6496	107.1			5.85	3.80		
6年目	R 19	4%	0.6246	107.1			5.85	3.65		
7年目	R 20	4%	0.6006	107.1			5.85	3.51		
8年目	R 21	4%	0.5775	107.1			5.85	3.38		
9年目	R 22	4%	0.5553	107.1			5.85	3.25		
10年目	R 23	4%	0.5339	107.1			5.85	3.12		
11年目	R 24	4%	0.5134	107.1			5.85	3.00		
12年目	R 25	4%	0.4936	107.1			5.85	2.89		
13年目	R 26	4%	0.4746	107.1			5.85	2.77		
14年目	R 27	4%	0.4564	107.1			5.85	2.67		
15年目	R 28	4%	0.4388	107.1			5.85	2.57		
16年目	R 29	4%	0.4220	107.1			5.85	2.47		
17年目	R 30	4%	0.4057	107.1			5.85	2.37		
18年目	R 31	4%	0.3901	107.1			5.85	2.28		
19年目	R 32	4%	0.3751	107.1			5.85	2.19		
20年目	R 33	4%	0.3607	107.1			5.85	2.11		
21年目	R 34	4%	0.3468	107.1			5.85	2.03		
22年目	R 35	4%	0.3335	107.1			5.85	1.95		
23年目	R 36	4%	0.3207	107.1			5.85	1.87		
24年目	R 37	4%	0.3083	107.1			5.85	1.80		
25年目	R 38	4%	0.2965	107.1			5.85	1.73		
26年目	R 39	4%	0.2851	107.1			5.85	1.67		
27年目	R 40	4%	0.2741	107.1			5.85	1.60		
28年目	R 41	4%	0.2636	107.1			5.85	1.54		
29年目	R 42	4%	0.2534	107.1			5.85	1.48		
30年目	R 43	4%	0.2437	107.1			5.85	1.42		
31年目	R 44	4%	0.2343	107.1			5.85	1.37		
32年目	R 45	4%	0.2253	107.1			5.85	1.32		
33年目	R 46	4%	0.2166	107.1			5.85	1.27		
34年目	R 47	4%	0.2083	107.1			5.85	1.22		
35年目	R 48	4%	0.2003	107.1			5.85	1.17		
36年目	R 49	4%	0.1926	107.1			5.85	1.13		
37年目	R 50	4%	0.1852	107.1			5.85	1.08		
38年目	R 51	4%	0.1780	107.1			5.85	1.04		
39年目	R 52	4%	0.1712	107.1			5.85	1.00		
40年目	R 53	4%	0.1646	107.1			5.85	0.96		
41年目	R 54	4%	0.1583	107.1			5.85	0.93		
42年目	R 55	4%	0.1522	107.1			5.85	0.89		
43年目	R 56	4%	0.1463	107.1			5.85	0.86		
44年目	R 57	4%	0.1407	107.1			5.85	0.82		
45年目	R 58	4%	0.1353	107.1			5.85	0.79		
46年目	R 59	4%	0.1301	107.1			5.85	0.76		
47年目	R 60	4%	0.1251	107.1			5.85	0.73		
48年目	R 61	4%	0.1203	107.1			5.85	0.70		
49年目	R 62	4%	0.1157	107.1	-163.18	-18.87	5.85	0.68		
合 計					1586.35	3342.69	292.27	103.21	0.00	0.00
単純事業費計					1749.53		292.27		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

						維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)				
箇所名：一般国道1号 静清バイパス(残事業)						単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)		
						0.43	2.4	1.02		
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 7	4%	1.0000	107.1						
－5年目	R 8	4%	0.9615	107.1	49.05	47.17				
－4年目	R 9	4%	0.9246	107.1	40.17	37.14				
－3年目	R 10	4%	0.8890	107.1	36.68	32.61				
－2年目	R 11	4%	0.8548	107.1	35.05	29.96				
－1年目	R 12	4%	0.8219	107.1	33.37	27.43				
供用開始年次	R 13	4%	0.7903	107.1			0.93	0.73		
1年目	R 14	4%	0.7599	107.1			0.93	0.70		
2年目	R 15	4%	0.7307	107.1			0.93	0.68		
3年目	R 16	4%	0.7026	107.1			0.93	0.65		
4年目	R 17	4%	0.6756	107.1			0.93	0.63		
5年目	R 18	4%	0.6496	107.1			0.93	0.60		
6年目	R 19	4%	0.6246	107.1			0.93	0.58		
7年目	R 20	4%	0.6006	107.1			0.93	0.56		
8年目	R 21	4%	0.5775	107.1			0.93	0.54		
9年目	R 22	4%	0.5553	107.1			0.93	0.51		
10年目	R 23	4%	0.5339	107.1			0.93	0.50		
11年目	R 24	4%	0.5134	107.1			0.93	0.48		
12年目	R 25	4%	0.4936	107.1			0.93	0.46		
13年目	R 26	4%	0.4746	107.1			0.93	0.44		
14年目	R 27	4%	0.4564	107.1			0.93	0.42		
15年目	R 28	4%	0.4388	107.1			0.93	0.41		
16年目	R 29	4%	0.4220	107.1			0.93	0.39		
17年目	R 30	4%	0.4057	107.1			0.93	0.38		
18年目	R 31	4%	0.3901	107.1			0.93	0.36		
19年目	R 32	4%	0.3751	107.1			0.93	0.35		
20年目	R 33	4%	0.3607	107.1			0.93	0.33		
21年目	R 34	4%	0.3468	107.1			0.93	0.32		
22年目	R 35	4%	0.3335	107.1			0.93	0.31		
23年目	R 36	4%	0.3207	107.1			0.93	0.30		
24年目	R 37	4%	0.3083	107.1			0.93	0.29		
25年目	R 38	4%	0.2965	107.1			0.93	0.27		
26年目	R 39	4%	0.2851	107.1			0.93	0.26		
27年目	R 40	4%	0.2741	107.1			0.93	0.25		
28年目	R 41	4%	0.2636	107.1			0.93	0.24		
29年目	R 42	4%	0.2534	107.1			0.93	0.23		
30年目	R 43	4%	0.2437	107.1			0.93	0.23		
31年目	R 44	4%	0.2343	107.1			0.93	0.22		
32年目	R 45	4%	0.2253	107.1			0.93	0.21		
33年目	R 46	4%	0.2166	107.1			0.93	0.20		
34年目	R 47	4%	0.2083	107.1			0.93	0.19		
35年目	R 48	4%	0.2003	107.1			0.93	0.19		
36年目	R 49	4%	0.1926	107.1			0.93	0.18		
37年目	R 50	4%	0.1852	107.1			0.93	0.17		
38年目	R 51	4%	0.1780	107.1			0.93	0.17		
39年目	R 52	4%	0.1712	107.1			0.93	0.16		
40年目	R 53	4%	0.1646	107.1			0.93	0.15		
41年目	R 54	4%	0.1583	107.1			0.93	0.15		
42年目	R 55	4%	0.1522	107.1			0.93	0.14		
43年目	R 56	4%	0.1463	107.1			0.93	0.14		
44年目	R 57	4%	0.1407	107.1			0.93	0.13		
45年目	R 58	4%	0.1353	107.1			0.93	0.13		
46年目	R 59	4%	0.1301	107.1			0.93	0.12		
47年目	R 60	4%	0.1251	107.1			0.93	0.12		
48年目	R 61	4%	0.1203	107.1			0.93	0.11		
49年目	R 62	4%	0.1157	107.1	-2.10	-0.24	0.93	0.11		
合 計					192.23	174.06	46.36	16.37	0.00	0.00
単純事業費計					194.33		46.36		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(事業全体)

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	4%	0.7903	107.1	144.37	49.73	29.70	223.80	176.87	13.49	4.26	1.98	19.72	15.59	5.16	4.07	248.68	196.54
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	4%	0.7599	107.1	144.22	50.06	29.43	223.72	170.01	13.47	4.29	1.96	19.72	14.98	5.15	3.91	248.58	188.90
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	4%	0.7307	107.1	144.07	50.39	29.16	223.63	163.40	13.46	4.32	1.94	19.71	14.41	5.14	3.76	248.49	181.57
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	4%	0.7026	107.1	143.92	50.72	28.89	223.54	157.06	13.44	4.34	1.92	19.71	13.85	5.14	3.61	248.39	174.52
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	4%	0.6756	107.1	143.77	51.05	28.63	223.45	150.96	13.43	4.37	1.90	19.71	13.31	5.13	3.47	248.29	167.74
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	4%	0.6496	107.1	143.62	51.38	28.36	223.36	145.09	13.42	4.40	1.89	19.70	12.80	5.13	3.33	248.20	161.22
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	4%	0.6246	107.1	143.47	51.72	28.09	223.27	139.46	13.40	4.43	1.87	19.70	12.30	5.12	3.20	248.10	154.96
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	4%	0.6006	107.1	143.32	52.05	27.82	223.19	134.04	13.39	4.46	1.85	19.70	11.83	5.12	3.07	248.00	148.94
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	4%	0.5775	107.1	143.17	52.38	27.55	223.10	128.83	13.37	4.49	1.83	19.69	11.37	5.11	2.95	247.90	143.16
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	4%	0.5553	107.1	142.10	52.37	27.35	221.82	123.17	13.27	4.49	1.82	19.58	10.87	5.08	2.82	246.48	136.86
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	4%	0.5339	107.1	141.03	52.36	27.14	220.53	117.74	13.17	4.48	1.81	19.46	10.39	5.05	2.70	245.05	130.83
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	4%	0.5134	107.1	139.96	52.35	26.94	219.25	112.56	13.07	4.48	1.79	19.35	9.93	5.02	2.58	243.62	125.07
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	4%	0.4936	107.1	138.89	52.34	26.73	217.97	107.60	12.97	4.48	1.78	19.24	9.50	4.99	2.46	242.19	119.55
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	4%	0.4746	107.1	137.82	52.33	26.53	216.69	102.85	12.87	4.48	1.76	19.12	9.08	4.96	2.35	240.77	114.28
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	4%	0.4564	107.1	136.75	52.33	26.32	215.40	98.31	12.77	4.48	1.75	19.01	8.67	4.93	2.25	239.34	109.23
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	4%	0.4388	107.1	135.68	52.32	26.12	214.12	93.96	12.67	4.48	1.74	18.89	8.29	4.90	2.15	237.91	104.40
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	4%	0.4220	107.1	134.62	52.31	25.91	212.84	89.81	12.57	4.48	1.72	18.78	7.92	4.86	2.05	236.48	99.79
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	4%	0.4057	107.1	133.55	52.30	25.71	211.56	85.83	12.47	4.48	1.71	18.67	7.57	4.83	1.96	235.06	95.37
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	4%	0.3901	107.1	132.48	52.29	25.50	210.27	82.03	12.38	4.48	1.70	18.55	7.24	4.80	1.87	233.63	91.14
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	4%	0.3751	107.1	131.41	52.28	25.30	208.99	78.40	12.28	4.48	1.68	18.44	6.92	4.77	1.79	232.20	87.10
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	4%	0.3607	107.1	130.34	52.28	25.10	207.71	74.92	12.18	4.48	1.67	18.32	6.61	4.74	1.71	230.77	83.24
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	4%	0.3468	107.1	129.27	52.27	24.89	206.43	71.59	12.08	4.48	1.66	18.21	6.31	4.71	1.63	229.35	79.54
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	4%	0.3335	107.1	128.20	52.26	24.69	205.15	68.41	11.98	4.48	1.64	18.09	6.03	4.68	1.56	227.92	76.01
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	4%	0.3207	107.1	127.13	52.25	24.48	203.86	65.37	11.88	4.48	1.63	17.98	5.77	4.65	1.49	226.49	72.62
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	4%	0.3083	107.1	126.06	52.24	24.28	202.58	62.46	11.78	4.47	1.62	17.87	5.51	4.62	1.42	225.06	69.39
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	4%	0.2965	107.1	124.99	52.23	24.07	201.30	59.68	11.68	4.47	1.60	17.75	5.26	4.59	1.36	223.64	66.30
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	4%	0.2851	107.1	123.92	52.23	23.87	200.02	57.02	11.58	4.47	1.59	17.64	5.03	4.56	1.30	222.21	63.34
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	4%	0.2741	107.1	122.85	52.22	23.66	198.73	54.47	11.48	4.47	1.57	17.52	4.80	4.52	1.24	220.78	60.51
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	4%	0.2636	107.1	121.79	52.21	23.46	197.45	52.04	11.38	4.47	1.56	17.41	4.59	4.49	1.18	219.35	57.81
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	4%	0.2534	107.1	120.72	52.20	23.25	196.17	49.71	11.28	4.47	1.55	17.29	4.38	4.46	1.13	217.93	55.23
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	4%	0.2437	107.1	119.65	52.19	23.05	194.89	47.49	11.18	4.47	1.53	17.18	4.19	4.43	1.08	216.50	52.75
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	4%	0.2343	107.1	118.58	52.18	22.84	193.60	45.36	11.08	4.47	1.52	17.07	4.00	4.40	1.03	215.07	50.39
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	4%	0.2253	107.1	117.51	52.18	22.64	192.32	43.33	10.98	4.47	1.51	16.95	3.82	4.37	0.98	213.64	48.13
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	4%	0.2166	107.1	116.44	52.17	22.43	191.04	41.38	10.88	4.47	1.49	16.84	3.65	4.34	0.94	212.21	45.97
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	4%	0.2083	107.1	115.37	52.16	22.23	189.76	39.52	10.78	4.47	1.48	16.72	3.48	4.31	0.90	210.79	43.9



便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	4%	0.7903	107.1	24.22	11.58	4.02	39.83	31.48	4.81	1.19	0.78	6.78	5.36	2.05	1.62	48.66	38.45
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	4%	0.7599	107.1	24.19	11.66	3.99	39.84	30.28	4.81	1.19	0.77	6.78	5.15	2.05	1.56	48.67	36.98
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	4%	0.7307	107.1	24.17	11.74	3.95	39.86	29.12	4.80	1.20	0.77	6.77	4.95	2.04	1.49	48.68	35.57
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	4%	0.7026	107.1	24.14	11.82	3.91	39.87	28.01	4.80	1.21	0.76	6.77	4.76	2.04	1.44	48.69	34.21
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	4%	0.6756	107.1	24.12	11.89	3.88	39.89	26.95	4.79	1.22	0.75	6.77	4.57	2.04	1.38	48.69	32.90
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	4%	0.6496	107.1	24.09	11.97	3.84	39.90	25.92	4.79	1.23	0.75	6.76	4.39	2.04	1.32	48.70	31.64
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	4%	0.6246	107.1	24.07	12.05	3.81	39.92	24.93	4.78	1.23	0.74	6.76	4.22	2.04	1.27	48.71	30.43
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	4%	0.6006	107.1	24.04	12.12	3.77	39.93	23.98	4.78	1.24	0.73	6.75	4.06	2.03	1.22	48.72	29.26
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	4%	0.5775	107.1	24.02	12.20	3.73	39.95	23.07	4.77	1.25	0.72	6.75	3.90	2.03	1.17	48.73	28.14
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	4%	0.5553	107.1	23.84	12.20	3.71	39.74	22.07	4.74	1.25	0.72	6.71	3.72	2.02	1.12	48.47	26.91
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	4%	0.5339	107.1	23.66	12.20	3.68	39.53	21.11	4.70	1.25	0.71	6.67	3.56	2.01	1.07	48.21	25.74
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	4%	0.5134	107.1	23.48	12.19	3.65	39.32	20.19	4.67	1.25	0.71	6.62	3.40	2.00	1.02	47.94	24.61
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	4%	0.4936	107.1	23.30	12.19	3.62	39.11	19.31	4.63	1.25	0.70	6.58	3.25	1.98	0.98	47.68	23.54
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	4%	0.4746	107.1	23.12	12.19	3.59	38.90	18.47	4.60	1.25	0.70	6.54	3.11	1.97	0.94	47.42	22.51
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	4%	0.4564	107.1	22.94	12.19	3.57	38.70	17.66	4.56	1.25	0.69	6.50	2.97	1.96	0.89	47.15	21.52
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	4%	0.4388	107.1	22.76	12.19	3.54	38.49	16.89	4.52	1.25	0.69	6.46	2.83	1.95	0.85	46.89	20.58
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	4%	0.4220	107.1	22.58	12.18	3.51	38.28	16.15	4.49	1.25	0.68	6.42	2.71	1.93	0.82	46.63	19.68
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	4%	0.4057	107.1	22.40	12.18	3.48	38.07	15.45	4.45	1.25	0.68	6.38	2.59	1.92	0.78	46.37	18.81
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	4%	0.3901	107.1	22.22	12.18	3.46	37.86	14.77	4.42	1.25	0.67	6.34	2.47	1.91	0.74	46.10	17.99
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	4%	0.3751	107.1	22.04	12.18	3.43	37.65	14.12	4.38	1.25	0.67	6.30	2.36	1.90	0.71	45.84	17.20
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	4%	0.3607	107.1	21.86	12.18	3.40	37.44	13.50	4.35	1.25	0.66	6.25	2.26	1.88	0.68	45.58	16.44
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	4%	0.3468	107.1	21.69	12.17	3.37	37.23	12.91	4.31	1.25	0.65	6.21	2.15	1.87	0.65	45.32	15.72
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	4%	0.3335	107.1	21.51	12.17	3.34	37.02	12.35	4.27	1.25	0.65	6.17	2.06	1.86	0.62	45.05	15.02
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	4%	0.3207	107.1	21.33	12.17	3.32	36.81	11.80	4.24	1.25	0.64	6.13	1.97	1.85	0.59	44.79	14.36
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	4%	0.3083	107.1	21.15	12.17	3.29	36.60	11.29	4.20	1.25	0.64	6.09	1.88	1.84	0.57	44.53	13.73
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	4%	0.2965	107.1	20.97	12.17	3.26	36.40	10.79	4.17	1.25	0.63	6.05	1.79	1.82	0.54	44.27	13.12
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	4%	0.2851	107.1	20.79	12.17	3.23	36.19	10.32	4.13	1.25	0.63	6.01	1.71	1.81	0.52	44.00	12.54
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	4%	0.2741	107.1	20.61	12.16	3.21	35.98	9.86	4.10	1.25	0.62	5.97	1.64	1.80	0.49	43.74	11.99
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	4%	0.2636	107.1	20.43	12.16	3.18	35.77	9.43	4.06	1.25	0.62	5.92	1.56	1.79	0.47	43.48	11.46
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	4%	0.2534	107.1	20.25	12.16	3.15	35.56	9.01	4.03	1.25	0.61	5.88	1.49	1.77	0.45	43.22	10.95
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	4%	0.2437	107.1	20.07	12.16	3.12	35.35	8.61	3.99	1.25	0.61	5.84	1.42	1.76	0.43	42.95	10.47
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	4%	0.2343	107.1	19.89	12.16	3.09	35.14	8.23	3.95	1.25	0.60	5.80	1.36	1.75	0.41	42.69	10.00
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	4%	0.2253	107.1	19.71	12.15	3.07	34.93	7.87	3.92	1.25	0.60	5.76	1.30	1.74	0.39	42.43	9.56
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	4%	0.2166	107.1	19.53	12.15	3.04	34.72	7.52	3.88	1.25	0.59	5.72	1.24	1.72	0.37	42.17	9.13
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	4%	0.2083	107.1	19.35	12.15	3.01	34.51	7.19	3.85	1.24	0.58	5.68	1.18	1.71	0.36	41.90	8.73
35年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	4%	0.2003	107.1	19.17	12.15	2.98	34.31	6.87	3.81	1.24	0.58	5.64	1.13	1.70	0.34	41.64	8.34
36年目	R 49	0.99065	0.																			

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(事業全体)					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.27		24.2		6.43	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
－59年目	S 47	4%	7.6895	50.2	0.09	1.40				
－58年目	S 48	4%	7.3938	57.8						
－57年目	S 49	4%	7.1094	69.0						
－56年目	S 50	4%	6.8360	72.9	0.63	6.37				
－55年目	S 51	4%	6.5731	79.1	3.79	33.74				
－54年目	S 52	4%	6.3202	83.8	1.76	14.24				
－53年目	S 53	4%	6.0772	87.4	1.46	10.85				
－52年目	S 54	4%	5.8434	89.6	4.90	34.22				
－51年目	S 55	4%	5.6187	95.3	5.76	36.36				
－50年目	S 56	4%	5.4026	97.8	5.52	32.67				
－49年目	S 57	4%	5.1948	98.9	2.94	16.53				
－48年目	S 58	4%	4.9950	99.8	6.00	32.16				
－47年目	S 59	4%	4.8029	101.8	9.28	46.90				
－46年目	S 60	4%	4.6181	102.6	11.73	56.55				
－45年目	S 61	4%	4.4405	104.4	11.75	53.51				
－44年目	S 62	4%	4.2697	104.1	14.90	65.45				
－43年目	S 63	4%	4.1055	104.7	10.07	42.29				
－42年目	H 1	4%	3.9476	107.5	10.04	39.48				
－41年目	H 2	4%	3.7958	109.9	9.52	35.22				
－40年目	H 3	4%	3.6498	112.5	18.95	65.84				
－39年目	H 4	4%	3.5094	114.1	6.62	21.80				
－38年目	H 5	4%	3.3744	114.4	19.99	63.14				
－37年目	H 6	4%	3.2446	114.3	1.38	4.20				
－36年目	H 7	4%	3.1199	113.7	4.42	12.99				
－35年目	H 8	4%	2.9999	113.2	0.75	2.13				
－34年目	H 9	4%	2.8845	114.2	3.14	8.50				
－33年目	H 10	4%	2.7735	113.6	4.48	11.70				
－32年目	H 11	4%	2.6669	112.0	13.52	34.49				
－31年目	H 12	4%	2.5643	110.7	16.97	42.11				
－30年目	H 13	4%	2.4657	109.4	49.69	119.95				
－29年目	H 14	4%	2.3708	107.6	48.10	113.50				
－28年目	H 15	4%	2.2796	106.1	44.48	102.35				
－27年目	H 16	4%	2.1920	105.0	51.35	114.82				
－26年目	H 17	4%	2.1077	103.7	64.94	141.37				
－25年目	H 18	4%	2.0266	103.0	59.05	124.44				
－24年目	H 19	4%	1.9486	102.1	75.47	154.26				
－23年目	H 20	4%	1.8737	101.6	60.56	119.62				
－22年目	H 21	4%	1.8016	100.3	56.63	108.94				
－21年目	H 22	4%	1.7323	98.6	47.25	88.91				
－20年目	H 23	4%	1.6657	97.2	43.30	79.47				
－19年目	H 24	4%	1.6016	96.4	44.99	80.05				
－18年目	H 25	4%	1.5400	96.4	51.88	88.77				
－17年目	H 26	4%	1.4808	98.7	38.69	62.17				
－16年目	H 27	4%	1.4239	100.2	35.94	54.69				
－15年目	H 28	4%	1.3691	100.2	45.95	67.24				
－14年目	H 29	4%	1.3164	100.5	54.48	76.42				
－13年目	H 30	4%	1.2658	100.4	37.61	50.78				
－12年目	R 1	4%	1.2171	101.2	48.64	62.66				
－11年目	R 2	4%	1.1703	101.9	48.93	60.18				
－10年目	R 3	4%	1.1253	101.8	67.11	79.45				
－9年目	R 4	4%	1.0820	102.7	76.28	86.07				
－8年目	R 5	2%	1.0404	107.1	79.88	83.11				
－7年目	R 6	2%	1.0200	107.1	74.00	75.48				
基準年	R 7	2%	1.0000	107.1	49.65	49.65				
－5年目	R 8	2%	0.9804	107.1	49.05	48.09				
－4年目	R 9	2%	0.9612	107.1	40.17	38.61				
－3年目	R 10	2%	0.9423	107.1	36.68	34.57				
－2年目	R 11	2%	0.9238	107.1	35.05	32.38				
－1年目	R 12	2%	0.9057	107.1	33.37	30.23				
供用開始年次	R 13	2%	0.8880	107.1			5.85	5.19		
1年目	R 14	2%	0.8706	107.1			5.85	5.09		
2年目	R 15	2%	0.8535	107.1			5.85	4.99		
3年目	R 16	2%	0.8368	107.1			5.85	4.89		
4年目	R 17	2%	0.8203	107.1			5.85	4.80		
5年目	R 18	2%	0.8043	107.1			5.85	4.70		
6年目	R 19	2%	0.7885	107.1			5.85	4.61		
7年目	R 20	2%	0.7730	107.1			5.85	4.52		
8年目	R 21	2%	0.7579	107.1			5.85	4.43		
9年目	R 22	2%	0.7430	107.1			5.85	4.34		
10年目	R 23	2%	0.7284	107.1			5.85	4.26		
11年目	R 24	2%	0.7142	107.1			5.85	4.17		
12年目	R 25	2%	0.7002	107.1			5.85	4.09		
13年目	R 26	2%	0.6864	107.1			5.85	4.01		
14年目	R 27	2%	0.6730	107.1			5.85	3.93		
15年目	R 28	2%	0.6598	107.1			5.85	3.86		
16年目	R 29	2%	0.6468	107.1			5.85	3.78		
17年目	R 30	2%	0.6342	107.1			5.85	3.71		
18年目	R 31	2%	0.6217	107.1			5.85	3.63		
19年目	R 32	2%	0.6095	107.1			5.85	3.56		
20年目	R 33	2%	0.5976	107.1			5.85	3.49		
21年目	R 34	2%	0.5859	107.1			5.85	3.42		
22年目	R 35	2%	0.5744	107.1			5.85	3.36		
23年目	R 36	2%	0.5631	107.1			5.85	3.29		
24年目	R 37	2%	0.5521	107.1			5.85	3.23		
25年目	R 38	2%	0.5412	107.1			5.85	3.16		
26年目	R 39	2%	0.5306	107.1			5.85	3.10		
27年目	R 40	2%	0.5202	107.1			5.85	3.04		
28年目	R 41	2%	0.5100	107.1			5.85	2.98		
29年目	R 42	2%	0.5000	107.1			5.85	2.92		
30年目	R 43	2%	0.4902	107.1			5.85	2.87		
31年目	R 44	2%	0.4806	107.1			5.85	2.81		
32年目	R 45	2%	0.4712	107.1			5.85	2.75		
33年目	R 46	2%	0.4619	107.1			5.85	2.70		
34年目	R 47	2%	0.4529	107.1			5.85	2.65		
35年目	R 48	2%	0.4440	107.1			5.85	2.60		
36年目	R 49	2%	0.4353	107.1			5.85	2.54		
37年目	R 50	2%	0.4268	107.1			5.85	2.49		
38年目	R 51	2%	0.4184	107.1			5.85	2.45		
39年目	R 52	2%	0.4102	107.1			5.85	2.40		
40年目	R 53	2%	0.4022	107.1			5.85	2.35		
41年目	R 54	2%	0.3943	107.1			5.85	2.30		
42年目	R 55	2%	0.3865	107.1			5.85	2.26		
43年目	R 56	2%	0.3790	107.1			5.85	2.22		
44年目	R 57	2%	0.3715	107.1			5.85	2.17		
45年目	R 58	2%	0.3642	107.1			5.85	2.13		
46年目	R 59	2%	0.3571	107.1			5.85	2.09		
47年目	R 60	2%	0.3501	107.1			5.85	2.05		
48年目	R 61	2%	0.3432	107.1			5.85	2.01		
49年目	R 62	2%	0.3365	107.1	-163.18	-54.91	5.85	1.97		
合 計					1586.35	3198.15	292.27	166.37	0.00	0.00
単純事業費計					1749.53		292.27		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

						維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)				
箇所名：一般国道1号 静清バイパス(残事業)						単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)		
						0.43	2.4	1.02		
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 7	2%	1.0000	107.1						
－5年目	R 8	2%	0.9804	107.1	49.05	48.09				
－4年目	R 9	2%	0.9612	107.1	40.17	38.61				
－3年目	R 10	2%	0.9423	107.1	36.68	34.57				
－2年目	R 11	2%	0.9238	107.1	35.05	32.38				
－1年目	R 12	2%	0.9057	107.1	33.37	30.23				
供用開始年次	R 13	2%	0.8880	107.1			0.93	0.82		
1年目	R 14	2%	0.8706	107.1			0.93	0.81		
2年目	R 15	2%	0.8535	107.1			0.93	0.79		
3年目	R 16	2%	0.8368	107.1			0.93	0.78		
4年目	R 17	2%	0.8203	107.1			0.93	0.76		
5年目	R 18	2%	0.8043	107.1			0.93	0.75		
6年目	R 19	2%	0.7885	107.1			0.93	0.73		
7年目	R 20	2%	0.7730	107.1			0.93	0.72		
8年目	R 21	2%	0.7579	107.1			0.93	0.70		
9年目	R 22	2%	0.7430	107.1			0.93	0.69		
10年目	R 23	2%	0.7284	107.1			0.93	0.68		
11年目	R 24	2%	0.7142	107.1			0.93	0.66		
12年目	R 25	2%	0.7002	107.1			0.93	0.65		
13年目	R 26	2%	0.6864	107.1			0.93	0.64		
14年目	R 27	2%	0.6730	107.1			0.93	0.62		
15年目	R 28	2%	0.6598	107.1			0.93	0.61		
16年目	R 29	2%	0.6468	107.1			0.93	0.60		
17年目	R 30	2%	0.6342	107.1			0.93	0.59		
18年目	R 31	2%	0.6217	107.1			0.93	0.58		
19年目	R 32	2%	0.6095	107.1			0.93	0.57		
20年目	R 33	2%	0.5976	107.1			0.93	0.55		
21年目	R 34	2%	0.5859	107.1			0.93	0.54		
22年目	R 35	2%	0.5744	107.1			0.93	0.53		
23年目	R 36	2%	0.5631	107.1			0.93	0.52		
24年目	R 37	2%	0.5521	107.1			0.93	0.51		
25年目	R 38	2%	0.5412	107.1			0.93	0.50		
26年目	R 39	2%	0.5306	107.1			0.93	0.49		
27年目	R 40	2%	0.5202	107.1			0.93	0.48		
28年目	R 41	2%	0.5100	107.1			0.93	0.47		
29年目	R 42	2%	0.5000	107.1			0.93	0.46		
30年目	R 43	2%	0.4902	107.1			0.93	0.45		
31年目	R 44	2%	0.4806	107.1			0.93	0.45		
32年目	R 45	2%	0.4712	107.1			0.93	0.44		
33年目	R 46	2%	0.4619	107.1			0.93	0.43		
34年目	R 47	2%	0.4529	107.1			0.93	0.42		
35年目	R 48	2%	0.4440	107.1			0.93	0.41		
36年目	R 49	2%	0.4353	107.1			0.93	0.40		
37年目	R 50	2%	0.4268	107.1			0.93	0.40		
38年目	R 51	2%	0.4184	107.1			0.93	0.39		
39年目	R 52	2%	0.4102	107.1			0.93	0.38		
40年目	R 53	2%	0.4022	107.1			0.93	0.37		
41年目	R 54	2%	0.3943	107.1			0.93	0.37		
42年目	R 55	2%	0.3865	107.1			0.93	0.36		
43年目	R 56	2%	0.3790	107.1			0.93	0.35		
44年目	R 57	2%	0.3715	107.1			0.93	0.34		
45年目	R 58	2%	0.3642	107.1			0.93	0.34		
46年目	R 59	2%	0.3571	107.1			0.93	0.33		
47年目	R 60	2%	0.3501	107.1			0.93	0.32		
48年目	R 61	2%	0.3432	107.1			0.93	0.32		
49年目	R 62	2%	0.3365	107.1	-2.10	-0.71	0.93	0.31		
合 計					192.23	183.17	46.36	26.39	0.00	0.00
単純事業費計					194.33		46.36		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静清バイパス(事業全体)

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	2%	0.8880	107.1	144.37	49.73	29.70	223.80	198.73	13.49	4.26	1.98	19.72	17.51	5.16	4.58	248.68	220.82
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	2%	0.8706	107.1	144.22	50.06	29.43	223.72	194.76	13.47	4.29	1.96	19.72	17.17	5.15	4.48	248.58	216.41
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	2%	0.8535	107.1	144.07	50.39	29.16	223.63	190.86	13.46	4.32	1.94	19.71	16.83	5.14	4.39	248.49	212.08
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	2%	0.8368	107.1	143.92	50.72	28.89	223.54	187.05	13.44	4.34	1.92	19.71	16.49	5.14	4.30	248.39	207.84
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	2%	0.8203	107.1	143.77	51.05	28.63	223.45	183.31	13.43	4.37	1.90	19.71	16.17	5.13	4.21	248.29	203.69
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	2%	0.8043	107.1	143.62	51.38	28.36	223.36	179.64	13.42	4.40	1.89	19.70	15.85	5.13	4.12	248.20	199.62
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	2%	0.7885	107.1	143.47	51.72	28.09	223.27	176.05	13.40	4.43	1.87	19.70	15.53	5.12	4.04	248.10	195.62
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	2%	0.7730	107.1	143.32	52.05	27.82	223.19	172.53	13.39	4.46	1.85	19.70	15.23	5.12	3.96	248.00	191.71
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	2%	0.7579	107.1	143.17	52.38	27.55	223.10	169.08	13.37	4.49	1.83	19.69	14.93	5.11	3.87	247.90	187.88
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	2%	0.7430	107.1	142.10	52.37	27.35	221.82	164.81	13.27	4.49	1.82	19.58	14.55	5.08	3.78	246.48	183.14
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	2%	0.7284	107.1	141.03	52.36	27.14	220.53	160.65	13.17	4.48	1.81	19.46	14.18	5.05	3.68	245.05	178.51
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	2%	0.7142	107.1	139.96	52.35	26.94	219.25	156.58	13.07	4.48	1.79	19.35	13.82	5.02	3.58	243.62	173.99
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	2%	0.7002	107.1	138.89	52.34	26.73	217.97	152.61	12.97	4.48	1.78	19.24	13.47	4.99	3.49	242.19	169.57
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	2%	0.6864	107.1	137.82	52.33	26.53	216.69	148.74	12.87	4.48	1.76	19.12	13.13	4.96	3.40	240.77	165.27
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	2%	0.6730	107.1	136.75	52.33	26.32	215.40	144.96	12.77	4.48	1.75	19.01	12.79	4.93	3.32	239.34	161.07
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	2%	0.6598	107.1	135.68	52.32	26.12	214.12	141.27	12.67	4.48	1.74	18.89	12.47	4.90	3.23	237.91	156.97
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	2%	0.6468	107.1	134.62	52.31	25.91	212.84	137.67	12.57	4.48	1.72	18.78	12.15	4.86	3.15	236.48	152.97
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	2%	0.6342	107.1	133.55	52.30	25.71	211.56	134.16	12.47	4.48	1.71	18.67	11.84	4.83	3.07	235.06	149.06
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	2%	0.6217	107.1	132.48	52.29	25.50	210.27	130.73	12.38	4.48	1.70	18.55	11.53	4.80	2.99	233.63	145.25
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	2%	0.6095	107.1	131.41	52.28	25.30	208.99	127.39	12.28	4.48	1.68	18.44	11.24	4.77	2.91	232.20	141.53
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	2%	0.5976	107.1	130.34	52.28	25.10	207.71	124.12	12.18	4.48	1.67	18.32	10.95	4.74	2.83	230.77	137.91
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	2%	0.5859	107.1	129.27	52.27	24.89	206.43	120.94	12.08	4.48	1.66	18.21	10.67	4.71	2.76	229.35	134.36
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	2%	0.5744	107.1	128.20	52.26	24.69	205.15	117.83	11.98	4.48	1.64	18.09	10.39	4.68	2.69	227.92	130.91
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	2%	0.5631	107.1	127.13	52.25	24.48	203.86	114.80	11.88	4.48	1.63	17.98	10.12	4.65	2.62	226.49	127.54
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	2%	0.5521	107.1	126.06	52.24	24.28	202.58	111.84	11.78	4.47	1.62	17.87	9.86	4.62	2.55	225.06	124.25
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	2%	0.5412	107.1	124.99	52.23	24.07	201.30	108.95	11.68	4.47	1.60	17.75	9.61	4.59	2.48	223.64	121.04
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	2%	0.5306	107.1	123.92	52.23	23.87	200.02	106.14	11.58	4.47	1.59	17.64	9.36	4.56	2.42	222.21	117.91
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	2%	0.5202	107.1	122.85	52.22	23.66	198.73	103.39	11.48	4.47	1.57	17.52	9.12	4.52	2.35	220.78	114.86
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	2%	0.5100	107.1	121.79	52.21	23.46	197.45	100.71	11.38	4.47	1.56	17.41	8.88	4.49	2.29	219.35	111.88
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	2%	0.5000	107.1	120.72	52.20	23.25	196.17	98.09	11.28	4.47	1.55	17.29	8.65	4.46	2.23	217.93	108.97
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	2%	0.4902	107.1	119.65	52.19	23.05	194.89	95.54	11.18	4.47	1.53	17.18	8.42	4.43	2.17	216.50	106.13
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	2%	0.4806	107.1	118.58	52.18	22.84	193.60	93.05	11.08	4.47	1.52	17.07	8.20	4.40	2.11	215.07	103.36
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	2%	0.4712	107.1	117.51	52.18	22.64	192.32	90.62	10.98	4.47	1.51	16.95	7.99	4.37	2.06	213.64	100.67
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	2%	0.4619	107.1	116.44	52.17	22.43	191.04	88.25	10.88	4.47	1.49	16.84	7.78	4.34	2.00	212.21	98.03
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	2%	0.4529	107.1	115.37	52.16	22.23	189.76	85.94	10.78	4.47	1.48	16.72					

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	2%	0.8880	107.1	24.22	11.58	4.02	39.83	35.36	4.81	1.19	0.78	6.78	6.02	2.05	1.82	48.66	43.21
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	2%	0.8706	107.1	24.19	11.66	3.99	39.84	34.68	4.81	1.19	0.77	6.78	5.90	2.05	1.78	48.67	42.37
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	2%	0.8535	107.1	24.17	11.74	3.95	39.86	34.02	4.80	1.20	0.77	6.77	5.78	2.04	1.75	48.68	41.54
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	2%	0.8368	107.1	24.14	11.82	3.91	39.87	33.36	4.80	1.21	0.76	6.77	5.66	2.04	1.71	48.69	40.74
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	2%	0.8203	107.1	24.12	11.89	3.88	39.89	32.72	4.79	1.22	0.75	6.77	5.55	2.04	1.67	48.69	39.95
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	2%	0.8043	107.1	24.09	11.97	3.84	39.90	32.09	4.79	1.23	0.75	6.76	5.44	2.04	1.64	48.70	39.17
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	2%	0.7885	107.1	24.07	12.05	3.81	39.92	31.48	4.78	1.23	0.74	6.76	5.33	2.04	1.61	48.71	38.41
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	2%	0.7730	107.1	24.04	12.12	3.77	39.93	30.87	4.78	1.24	0.73	6.75	5.22	2.03	1.57	48.72	37.66
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	2%	0.7579	107.1	24.02	12.20	3.73	39.95	30.28	4.77	1.25	0.72	6.75	5.11	2.03	1.54	48.73	36.93
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	2%	0.7430	107.1	23.84	12.20	3.71	39.74	29.53	4.74	1.25	0.72	6.71	4.98	2.02	1.50	48.47	36.01
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	2%	0.7284	107.1	23.66	12.20	3.68	39.53	28.80	4.70	1.25	0.71	6.67	4.86	2.01	1.46	48.21	35.12
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	2%	0.7142	107.1	23.48	12.19	3.65	39.32	28.08	4.67	1.25	0.71	6.62	4.73	2.00	1.42	47.94	34.24
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	2%	0.7002	107.1	23.30	12.19	3.62	39.11	27.39	4.63	1.25	0.70	6.58	4.61	1.98	1.39	47.68	33.38
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	2%	0.6864	107.1	23.12	12.19	3.59	38.90	26.71	4.60	1.25	0.70	6.54	4.49	1.97	1.35	47.42	32.55
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	2%	0.6730	107.1	22.94	12.19	3.57	38.70	26.04	4.56	1.25	0.69	6.50	4.38	1.96	1.32	47.15	31.73
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	2%	0.6598	107.1	22.76	12.19	3.54	38.49	25.39	4.52	1.25	0.69	6.46	4.26	1.95	1.28	46.89	30.94
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	2%	0.6468	107.1	22.58	12.18	3.51	38.28	24.76	4.49	1.25	0.68	6.42	4.15	1.93	1.25	46.63	30.16
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	2%	0.6342	107.1	22.40	12.18	3.48	38.07	24.14	4.45	1.25	0.68	6.38	4.04	1.92	1.22	46.37	29.40
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	2%	0.6217	107.1	22.22	12.18	3.46	37.86	23.54	4.42	1.25	0.67	6.34	3.94	1.91	1.19	46.10	28.66
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	2%	0.6095	107.1	22.04	12.18	3.43	37.65	22.95	4.38	1.25	0.67	6.30	3.84	1.90	1.16	45.84	27.94
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	2%	0.5976	107.1	21.86	12.18	3.40	37.44	22.37	4.35	1.25	0.66	6.25	3.74	1.88	1.13	45.58	27.24
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	2%	0.5859	107.1	21.69	12.17	3.37	37.23	21.81	4.31	1.25	0.65	6.21	3.64	1.87	1.10	45.32	26.55
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	2%	0.5744	107.1	21.51	12.17	3.34	37.02	21.27	4.27	1.25	0.65	6.17	3.54	1.86	1.07	45.05	25.88
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	2%	0.5631	107.1	21.33	12.17	3.32	36.81	20.73	4.24	1.25	0.64	6.13	3.45	1.85	1.04	44.79	25.22
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	2%	0.5521	107.1	21.15	12.17	3.29	36.60	20.21	4.20	1.25	0.64	6.09	3.36	1.84	1.01	44.53	24.58
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	2%	0.5412	107.1	20.97	12.17	3.26	36.40	19.70	4.17	1.25	0.63	6.05	3.27	1.82	0.99	44.27	23.96
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	2%	0.5306	107.1	20.79	12.17	3.23	36.19	19.20	4.13	1.25	0.63	6.01	3.19	1.81	0.96	44.00	23.35
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	2%	0.5202	107.1	20.61	12.16	3.21	35.98	18.72	4.10	1.25	0.62	5.97	3.10	1.80	0.94	43.74	22.76
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	2%	0.5100	107.1	20.43	12.16	3.18	35.77	18.24	4.06	1.25	0.62	5.92	3.02	1.79	0.91	43.48	22.18
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	2%	0.5000	107.1	20.25	12.16	3.15	35.56	17.78	4.03	1.25	0.61	5.88	2.94	1.77	0.89	43.22	21.61
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	2%	0.4902	107.1	20.07	12.16	3.12	35.35	17.33	3.99	1.25	0.61	5.84	2.86	1.76	0.86	42.95	21.06
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	2%	0.4806	107.1	19.89	12.16	3.09	35.14	16.89	3.95	1.25	0.60	5.80	2.79	1.75	0.84	42.69	20.52
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	2%	0.4712	107.1	19.71	12.15	3.07	34.93	16.46	3.92	1.25	0.60	5.76	2.71	1.74	0.82	42.43	19.99
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	2%	0.4619	107.1	19.53	12.15	3.04	34.72	16.04	3.88	1.25	0.59	5.72	2.64	1.72	0.80	42.17	19.48
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	2%	0.4529	107.1	19.35	12.15	3.01	34.51	15.63	3.85	1.24	0.58	5.68	2.57	1.71	0.78	41.90	18.98
35年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	2%	0.4440	107.1	19.17	12.15	2.98	34.31	15.23	3.81	1.24	0.58	5.64	2.50	1.70	0.75	41.64	18.49
36年目	R 49																					

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(事業全体)							維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)				
							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)		
							0.27	24.2	6.43		
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
－59年目	S 47	4%	7.5395	50.2	0.09	1.38					
－58年目	S 48	4%	7.2495	57.8							
－57年目	S 49	4%	6.9707	69.0							
－56年目	S 50	4%	6.7026	72.9	0.63	6.24					
－55年目	S 51	4%	6.4448	79.1	3.79	33.09					
－54年目	S 52	4%	6.1969	83.8	1.76	13.96					
－53年目	S 53	4%	5.9586	87.4	1.46	10.64					
－52年目	S 54	4%	5.7294	89.6	4.90	33.55					
－51年目	S 55	4%	5.5090	95.3	5.76	35.65					
－50年目	S 56	4%	5.2972	97.8	5.52	32.03					
－49年目	S 57	4%	5.0934	98.9	2.94	16.21					
－48年目	S 58	4%	4.8975	99.8	6.00	31.53					
－47年目	S 59	4%	4.7092	101.8	9.28	45.99					
－46年目	S 60	4%	4.5280	102.6	11.73	55.45					
－45年目	S 61	4%	4.3539	104.4	11.75	52.46					
－44年目	S 62	4%	4.1864	104.1	14.90	64.18					
－43年目	S 63	4%	4.0254	104.7	10.07	41.46					
－42年目	H 1	4%	3.8706	107.5	10.04	38.71					
－41年目	H 2	4%	3.7217	109.9	9.52	34.53					
－40年目	H 3	4%	3.5786	112.5	18.95	64.56					
－39年目	H 4	4%	3.4409	114.1	6.62	21.37					
－38年目	H 5	4%	3.3086	114.4	19.99	61.91					
－37年目	H 6	4%	3.1813	114.3	1.38	4.12					
－36年目	H 7	4%	3.0590	113.7	4.42	12.74					
－35年目	H 8	4%	2.9413	113.2	0.75	2.09					
－34年目	H 9	4%	2.8282	114.2	3.14	8.34					
－33年目	H 10	4%	2.7194	113.6	4.48	11.48					
－32年目	H 11	4%	2.6148	112.0	13.52	33.82					
－31年目	H 12	4%	2.5143	110.7	16.97	41.29					
－30年目	H 13	4%	2.4176	109.4	49.69	117.61					
－29年目	H 14	4%	2.3246	107.6	48.10	111.28					
－28年目	H 15	4%	2.2352	106.1	44.48	100.35					
－27年目	H 16	4%	2.1492	105.0	51.35	112.58					
－26年目	H 17	4%	2.0665	103.7	64.94	138.61					
－25年目	H 18	4%	1.9871	103.0	59.05	122.01					
－24年目	H 19	4%	1.9106	102.1	75.47	151.25					
－23年目	H 20	4%	1.8371	101.6	60.56	117.28					
－22年目	H 21	4%	1.7665	100.3	56.63	106.81					
－21年目	H 22	4%	1.6985	98.6	47.25	87.18					
－20年目	H 23	4%	1.6332	97.2	43.30	77.92					
－19年目	H 24	4%	1.5704	96.4	44.99	78.49					
－18年目	H 25	4%	1.5100	96.4	51.88	87.04					
－17年目	H 26	4%	1.4519	98.7	38.69	60.96					
－16年目	H 27	4%	1.3961	100.2	35.94	53.62					
－15年目	H 28	4%	1.3424	100.2	45.95	65.93					
－14年目	H 29	4%	1.2908	100.5	54.48	74.93					
－13年目	H 30	4%	1.2411	100.4	37.61	49.79					
－12年目	R 1	4%	1.1934	101.2	48.64	61.44					
－11年目	R 2	4%	1.1475	101.9	48.93	59.01					
－10年目	R 3	4%	1.1033	101.8	67.11	77.90					
－9年目	R 4	4%	1.0609	102.7	76.28	84.39					
－8年目	R 5	1%	1.0201	107.1	79.88	81.49					
－7年目	R 6	1%	1.0100	107.1	74.00	74.74					
基準年	R 7	1%	1.0000	107.1	49.65	49.65					
－5年目	R 8	1%	0.9901	107.1	49.05	48.57					
－4年目	R 9	1%	0.9803	107.1	40.17	39.38					
－3年目	R 10	1%	0.9706	107.1	36.68	35.60					
－2年目	R 11	1%	0.9610	107.1	35.05	33.68					
－1年目	R 12	1%	0.9515	107.1	33.37	31.75					
供用開始年次	R 13	1%	0.9420	107.1			5.85	5.51			
1年目	R 14	1%	0.9327	107.1			5.85	5.45			
2年目	R 15	1%	0.9235	107.1			5.85	5.40			
3年目	R 16	1%	0.9143	107.1			5.85	5.34			
4年目	R 17	1%	0.9053	107.1			5.85	5.29			
5年目	R 18	1%	0.8963	107.1			5.85	5.24			
6年目	R 19	1%	0.8874	107.1			5.85	5.19			
7年目	R 20	1%	0.8787	107.1			5.85	5.14			
8年目	R 21	1%	0.8700	107.1			5.85	5.09			
9年目	R 22	1%	0.8613	107.1			5.85	5.03			
10年目	R 23	1%	0.8528	107.1			5.85	4.99			
11年目	R 24	1%	0.8444	107.1			5.85	4.94			
12年目	R 25	1%	0.8360	107.1			5.85	4.89			
13年目	R 26	1%	0.8277	107.1			5.85	4.84			
14年目	R 27	1%	0.8195	107.1			5.85	4.79			
15年目	R 28	1%	0.8114	107.1			5.85	4.74			
16年目	R 29	1%	0.8034	107.1			5.85	4.70			
17年目	R 30	1%	0.7954	107.1			5.85	4.65			
18年目	R 31	1%	0.7876	107.1			5.85	4.60			
19年目	R 32	1%	0.7798	107.1			5.85	4.56			
20年目	R 33	1%	0.7720	107.1			5.85	4.51			
21年目	R 34	1%	0.7644	107.1			5.85	4.47			
22年目	R 35	1%	0.7568	107.1			5.85	4.42			
23年目	R 36	1%	0.7493	107.1			5.85	4.38			
24年目	R 37	1%	0.7419	107.1			5.85	4.34			
25年目	R 38	1%	0.7346	107.1			5.85	4.29			
26年目	R 39	1%	0.7273	107.1			5.85	4.25			
27年目	R 40	1%	0.7201	107.1			5.85	4.21			
28年目	R 41	1%	0.7130	107.1			5.85	4.17			
29年目	R 42	1%	0.7059	107.1			5.85	4.13			
30年目	R 43	1%	0.6989	107.1			5.85	4.09			
31年目	R 44	1%	0.6920	107.1			5.85	4.05			
32年目	R 45	1%	0.6852	107.1			5.85	4.01			
33年目	R 46	1%	0.6784	107.1			5.85	3.97			
34年目	R 47	1%	0.6717	107.1			5.85	3.93			
35年目	R 48	1%	0.6650	107.1			5.85	3.89			
36年目	R 49	1%	0.6584	107.1			5.85	3.85			
37年目	R 50	1%	0.6519	107.1			5.85	3.81			
38年目	R 51	1%	0.6454	107.1			5.85	3.77			
39年目	R 52	1%	0.6391	107.1			5.85	3.74			
40年目	R 53	1%	0.6327	107.1			5.85	3.70			
41年目	R 54	1%	0.6265	107.1			5.85	3.66			
42年目	R 55	1%	0.6203	107.1			5.85	3.63			
43年目	R 56	1%	0.6141	107.1			5.85	3.59			
44年目	R 57	1%	0.6080	107.1			5.85	3.55			
45年目	R 58	1%	0.6020	107.1			5.85	3.52			
46年目	R 59	1%	0.5961	107.1			5.85	3.48			
47年目	R 60	1%	0.5902	107.1			5.85	3.45			
48年目	R 61	1%	0.5843	107.1			5.85	3.42			
49年目	R 62	1%	0.5785	107.1	－163.18	－94.40	5.85	3.38			
合 計						1586.35	3105.58	292.27	218.00	0.00	0.00
単純事業費計						1749.53		292.27		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。



費用の現在価値算定表

箇所名: 一般国道1号 静清バイパス(残事業)						維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)				
						単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)		
						0.43	2.4	1.02		
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 7	1%	1.0000	107.1						
－5年目	R 8	1%	0.9901	107.1	49.05	48.57				
－4年目	R 9	1%	0.9803	107.1	40.17	39.38				
－3年目	R 10	1%	0.9706	107.1	36.68	35.60				
－2年目	R 11	1%	0.9610	107.1	35.05	33.68				
－1年目	R 12	1%	0.9515	107.1	33.37	31.75				
供用開始年次	R 13	1%	0.9420	107.1			0.93	0.87		
1年目	R 14	1%	0.9327	107.1			0.93	0.86		
2年目	R 15	1%	0.9235	107.1			0.93	0.86		
3年目	R 16	1%	0.9143	107.1			0.93	0.85		
4年目	R 17	1%	0.9053	107.1			0.93	0.84		
5年目	R 18	1%	0.8963	107.1			0.93	0.83		
6年目	R 19	1%	0.8874	107.1			0.93	0.82		
7年目	R 20	1%	0.8787	107.1			0.93	0.81		
8年目	R 21	1%	0.8700	107.1			0.93	0.81		
9年目	R 22	1%	0.8613	107.1			0.93	0.80		
10年目	R 23	1%	0.8528	107.1			0.93	0.79		
11年目	R 24	1%	0.8444	107.1			0.93	0.78		
12年目	R 25	1%	0.8360	107.1			0.93	0.78		
13年目	R 26	1%	0.8277	107.1			0.93	0.77		
14年目	R 27	1%	0.8195	107.1			0.93	0.76		
15年目	R 28	1%	0.8114	107.1			0.93	0.75		
16年目	R 29	1%	0.8034	107.1			0.93	0.74		
17年目	R 30	1%	0.7954	107.1			0.93	0.74		
18年目	R 31	1%	0.7876	107.1			0.93	0.73		
19年目	R 32	1%	0.7798	107.1			0.93	0.72		
20年目	R 33	1%	0.7720	107.1			0.93	0.72		
21年目	R 34	1%	0.7644	107.1			0.93	0.71		
22年目	R 35	1%	0.7568	107.1			0.93	0.70		
23年目	R 36	1%	0.7493	107.1			0.93	0.69		
24年目	R 37	1%	0.7419	107.1			0.93	0.69		
25年目	R 38	1%	0.7346	107.1			0.93	0.68		
26年目	R 39	1%	0.7273	107.1			0.93	0.67		
27年目	R 40	1%	0.7201	107.1			0.93	0.67		
28年目	R 41	1%	0.7130	107.1			0.93	0.66		
29年目	R 42	1%	0.7059	107.1			0.93	0.65		
30年目	R 43	1%	0.6989	107.1			0.93	0.65		
31年目	R 44	1%	0.6920	107.1			0.93	0.64		
32年目	R 45	1%	0.6852	107.1			0.93	0.64		
33年目	R 46	1%	0.6784	107.1			0.93	0.63		
34年目	R 47	1%	0.6717	107.1			0.93	0.62		
35年目	R 48	1%	0.6650	107.1			0.93	0.62		
36年目	R 49	1%	0.6584	107.1			0.93	0.61		
37年目	R 50	1%	0.6519	107.1			0.93	0.60		
38年目	R 51	1%	0.6454	107.1			0.93	0.60		
39年目	R 52	1%	0.6391	107.1			0.93	0.59		
40年目	R 53	1%	0.6327	107.1			0.93	0.59		
41年目	R 54	1%	0.6265	107.1			0.93	0.58		
42年目	R 55	1%	0.6203	107.1			0.93	0.58		
43年目	R 56	1%	0.6141	107.1			0.93	0.57		
44年目	R 57	1%	0.6080	107.1			0.93	0.56		
45年目	R 58	1%	0.6020	107.1			0.93	0.56		
46年目	R 59	1%	0.5961	107.1			0.93	0.55		
47年目	R 60	1%	0.5902	107.1			0.93	0.55		
48年目	R 61	1%	0.5843	107.1			0.93	0.54		
49年目	R 62	1%	0.5785	107.1	-2.10	-1.21	0.93	0.54		
合 計					192.23	187.77	46.36	34.58	0.00	0.00
単純事業費計					194.33		46.36		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静清バイパス(事業全体)

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	1%	0.9420	107.1	144.37	49.73	29.70	223.80	210.83	13.49	4.26	1.98	19.72	18.58	5.16	4.86	248.68	234.27
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	1%	0.9327	107.1	144.22	50.06	29.43	223.72	208.66	13.47	4.29	1.96	19.72	18.39	5.15	4.80	248.58	231.86
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	1%	0.9235	107.1	144.07	50.39	29.16	223.63	206.52	13.46	4.32	1.94	19.71	18.21	5.14	4.75	248.49	229.47
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	1%	0.9143	107.1	143.92	50.72	28.89	223.54	204.39	13.44	4.34	1.92	19.71	18.02	5.14	4.70	248.39	227.11
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.9053	107.1	143.77	51.05	28.63	223.45	202.29	13.43	4.37	1.90	19.71	17.84	5.13	4.65	248.29	224.78
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8963	107.1	143.62	51.38	28.36	223.36	200.21	13.42	4.40	1.89	19.70	17.66	5.13	4.60	248.20	222.46
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8874	107.1	143.47	51.72	28.09	223.27	198.15	13.40	4.43	1.87	19.70	17.48	5.12	4.55	248.10	220.17
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8787	107.1	143.32	52.05	27.82	223.19	196.11	13.39	4.46	1.85	19.70	17.31	5.12	4.50	248.00	217.91
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8700	107.1	143.17	52.38	27.55	223.10	194.09	13.37	4.49	1.83	19.69	17.13	5.11	4.45	247.90	215.67
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8613	107.1	142.10	52.37	27.35	221.82	191.06	13.27	4.49	1.82	19.58	16.86	5.08	4.38	246.48	212.30
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8528	107.1	141.03	52.36	27.14	220.53	188.08	13.17	4.48	1.81	19.46	16.60	5.05	4.31	245.05	208.98
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8444	107.1	139.96	52.35	26.94	219.25	185.13	13.07	4.48	1.79	19.35	16.34	5.02	4.24	243.62	205.71
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8360	107.1	138.89	52.34	26.73	217.97	182.23	12.97	4.48	1.78	19.24	16.08	4.99	4.17	242.19	202.48
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8277	107.1	137.82	52.33	26.53	216.69	179.36	12.87	4.48	1.76	19.12	15.83	4.96	4.10	240.77	199.29
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8195	107.1	136.75	52.33	26.32	215.40	176.53	12.77	4.48	1.75	19.01	15.58	4.93	4.04	239.34	196.15
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8114	107.1	135.68	52.32	26.12	214.12	173.74	12.67	4.48	1.74	18.89	15.33	4.90	3.97	237.91	193.05
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.8034	107.1	134.62	52.31	25.91	212.84	170.99	12.57	4.48	1.72	18.78	15.09	4.86	3.91	236.48	189.99
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7954	107.1	133.55	52.30	25.71	211.56	168.28	12.47	4.48	1.71	18.67	14.85	4.83	3.85	235.06	186.97
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7876	107.1	132.48	52.29	25.50	210.27	165.60	12.38	4.48	1.70	18.55	14.61	4.80	3.78	233.63	184.00
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7798	107.1	131.41	52.28	25.30	208.99	162.97	12.28	4.48	1.68	18.44	14.38	4.77	3.72	232.20	181.06
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7720	107.1	130.34	52.28	25.10	207.71	160.36	12.18	4.48	1.67	18.32	14.15	4.74	3.66	230.77	178.17
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7644	107.1	129.27	52.27	24.89	206.43	157.79	12.08	4.48	1.66	18.21	13.92	4.71	3.60	229.35	175.31
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7568	107.1	128.20	52.26	24.69	205.15	155.26	11.98	4.48	1.64	18.09	13.69	4.68	3.54	227.92	172.50
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7493	107.1	127.13	52.25	24.48	203.86	152.76	11.88	4.48	1.63	17.98	13.47	4.65	3.48	226.49	169.72
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7419	107.1	126.06	52.24	24.28	202.58	150.30	11.78	4.47	1.62	17.87	13.26	4.62	3.43	225.06	166.98
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7346	107.1	124.99	52.23	24.07	201.30	147.87	11.68	4.47	1.60	17.75	13.04	4.59	3.37	223.64	164.28
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7273	107.1	123.92	52.23	23.87	200.02	145.47	11.58	4.47	1.59	17.64	12.83	4.56	3.31	222.21	161.61
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7201	107.1	122.85	52.22	23.66	198.73	143.11	11.48	4.47	1.57	17.52	12.62	4.52	3.26	220.78	158.98
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7130	107.1	121.79	52.21	23.46	197.45	140.78	11.38	4.47	1.56	17.41	12.41	4.49	3.20	219.35	156.39
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	1%	0.7059	107.1	120.72	52.20	23.25	196.17	138.48	11.28	4.47	1.55	17.29	12.21	4.46	3.15	217.93	153.84
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	1%	0.6989	107.1	119.65	52.19	23.05	194.89	136.21	11.18	4.47	1.53	17.18	12.01	4.43	3.10	216.50	151.32
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	1%	0.6920	107.1	118.58	52.18	22.84	193.60	133.97	11.08	4.47	1.52	17.07	11.81	4.40	3.05	215.07	148.83
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	1%	0.6852	107.1	117.51	52.18	22.64	192.32	131.77	10.98	4.47	1.51	16.95	11.61	4.37	2.99	213.64	146.38
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	1%	0.6784	107.1	116.44	52.17	22.43	191.04	129.59	10.88	4.47	1.49	16.84	11.42	4.34	2.94	212.21	143.96
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	1%	0.6717	107.1	115.37	52.16	22.23	189.76	127.45	10.78	4.47	1						



便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道1号 静岡バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	1%	0.9420	107.1	24.22	11.58	4.02	39.83	37.52	4.81	1.19	0.78	6.78	6.39	2.05	1.93	48.66	45.84
1年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	1%	0.9327	107.1	24.19	11.66	3.99	39.84	37.16	4.81	1.19	0.77	6.78	6.32	2.05	1.91	48.67	45.39
2年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	1%	0.9235	107.1	24.17	11.74	3.95	39.86	36.81	4.80	1.20	0.77	6.77	6.26	2.04	1.89	48.68	44.95
3年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	1%	0.9143	107.1	24.14	11.82	3.91	39.87	36.46	4.80	1.21	0.76	6.77	6.19	2.04	1.87	48.69	44.51
4年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.9053	107.1	24.12	11.89	3.88	39.89	36.11	4.79	1.22	0.75	6.77	6.12	2.04	1.85	48.69	44.08
5年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8963	107.1	24.09	11.97	3.84	39.90	35.77	4.79	1.23	0.75	6.76	6.06	2.04	1.83	48.70	43.65
6年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8874	107.1	24.07	12.05	3.81	39.92	35.43	4.78	1.23	0.74	6.76	6.00	2.04	1.81	48.71	43.23
7年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8787	107.1	24.04	12.12	3.77	39.93	35.09	4.78	1.24	0.73	6.75	5.93	2.03	1.79	48.72	42.81
8年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8700	107.1	24.02	12.20	3.73	39.95	34.75	4.77	1.25	0.72	6.75	5.87	2.03	1.77	48.73	42.39
9年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8613	107.1	23.84	12.20	3.71	39.74	34.23	4.74	1.25	0.72	6.71	5.78	2.02	1.74	48.47	41.75
10年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8528	107.1	23.66	12.20	3.68	39.53	33.71	4.70	1.25	0.71	6.67	5.69	2.01	1.71	48.21	41.11
11年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8444	107.1	23.48	12.19	3.65	39.32	33.20	4.67	1.25	0.71	6.62	5.59	2.00	1.68	47.94	40.48
12年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8360	107.1	23.30	12.19	3.62	39.11	32.70	4.63	1.25	0.70	6.58	5.50	1.98	1.66	47.68	39.86
13年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8277	107.1	23.12	12.19	3.59	38.90	32.20	4.60	1.25	0.70	6.54	5.42	1.97	1.63	47.42	39.25
14年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8195	107.1	22.94	12.19	3.57	38.70	31.71	4.56	1.25	0.69	6.50	5.33	1.96	1.60	47.15	38.65
15年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8114	107.1	22.76	12.19	3.54	38.49	31.23	4.52	1.25	0.69	6.46	5.24	1.95	1.58	46.89	38.05
16年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.8034	107.1	22.58	12.18	3.51	38.28	30.75	4.49	1.25	0.68	6.42	5.16	1.93	1.55	46.63	37.46
17年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7954	107.1	22.40	12.18	3.48	38.07	30.28	4.45	1.25	0.68	6.38	5.07	1.92	1.53	46.37	36.88
18年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7876	107.1	22.22	12.18	3.46	37.86	29.82	4.42	1.25	0.67	6.34	4.99	1.91	1.50	46.10	36.31
19年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7798	107.1	22.04	12.18	3.43	37.65	29.36	4.38	1.25	0.67	6.30	4.91	1.90	1.48	45.84	35.75
20年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7720	107.1	21.86	12.18	3.40	37.44	28.91	4.35	1.25	0.66	6.25	4.83	1.88	1.45	45.58	35.19
21年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7644	107.1	21.69	12.17	3.37	37.23	28.46	4.31	1.25	0.65	6.21	4.75	1.87	1.43	45.32	34.64
22年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7568	107.1	21.51	12.17	3.34	37.02	28.02	4.27	1.25	0.65	6.17	4.67	1.86	1.41	45.05	34.10
23年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7493	107.1	21.33	12.17	3.32	36.81	27.59	4.24	1.25	0.64	6.13	4.59	1.85	1.38	44.79	33.56
24年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7419	107.1	21.15	12.17	3.29	36.60	27.16	4.20	1.25	0.64	6.09	4.52	1.84	1.36	44.53	33.04
25年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7346	107.1	20.97	12.17	3.26	36.40	26.74	4.17	1.25	0.63	6.05	4.44	1.82	1.34	44.27	32.52
26年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7273	107.1	20.79	12.17	3.23	36.19	26.32	4.13	1.25	0.63	6.01	4.37	1.81	1.32	44.00	32.00
27年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7201	107.1	20.61	12.16	3.21	35.98	25.91	4.10	1.25	0.62	5.97	4.30	1.80	1.29	43.74	31.50
28年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7130	107.1	20.43	12.16	3.18	35.77	25.50	4.06	1.25	0.62	5.92	4.22	1.79	1.27	43.48	31.00
29年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	1%	0.7059	107.1	20.25	12.16	3.15	35.56	25.10	4.03	1.25	0.61	5.88	4.15	1.77	1.25	43.22	30.51
30年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	1%	0.6989	107.1	20.07	12.16	3.12	35.35	24.71	3.99	1.25	0.61	5.84	4.08	1.76	1.23	42.95	30.02
31年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	1%	0.6920	107.1	19.89	12.16	3.09	35.14	24.32	3.95	1.25	0.60	5.80	4.01	1.75	1.21	42.69	29.54
32年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	1%	0.6852	107.1	19.71	12.15	3.07	34.93	23.93	3.92	1.25	0.60	5.76	3.95	1.74	1.19	42.43	29.07
33年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	1%	0.6784	107.1	19.53	12.15	3.04	34.72	23.56	3.88	1.25	0.59	5.72	3.88	1.72	1.17	42.17	28.60
34年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	1%	0.6717	107.1	19.35	12.15	3.01	34.51	23.18	3.85	1.24	0.58	5.68	3.81	1.71	1.15	41.90	28.14
35年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	1%	0.6650	107.1	19.17	12.15	2.98	34.31	22.81	3.81	1.24	0.58	5.64	3.75	1.70	1.13	41.64	27.69
36年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	1%	0.6584	107.1	18.99	12.15	2.96	34.10	22.45	3.78	1.24	0.57	5.59	3.68	1.69	1.11	41.38	27.24
37年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	1%	0.6519	107.1	18.82	12.14	2.93	33.89	22.09	3.74	1.24	0.57	5.55	3.62	1.68	1.09	41.12	26.80
38年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	1%	0.6454	107.1	18.64	12.14	2.90	33.68	21.74	3.70	1.24	0.56	5.51	3.56	1.66	1.07	40.85	26.37
39年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	1%	0.6391	107.1	18.46	12.14	2.87	33.47	21.39	3.67	1.24	0.56	5.47	3.50	1.65	1.05	40.59	25.94
40年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	1%	0.6327	107.1	18.28	12.14	2.84	33.26	21.04	3.63	1.24	0.55	5.43	3.44	1.64	1.04	40.33	25.52
41年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99249	1%	0.6265	107.1	18.10	12.14	2.82	33.05	20.71	3.60	1.24	0.55	5.39	3.38	1.63	1.02	40.06	25.10
42年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	1%	0.6203	107.1	17.92	12.13	2.79	32.84	20.37	3.56	1.24	0.54	5.35	3.32	1.61	1.00	39.80	24.69
43年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	1%	0.6141	107.1	17.74	12.13	2.76	32.63	20.04	3.53	1.24	0.54	5.31	3.26	1.60	0.98	39.54	24.28
44年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	1%	0.6080	107.1	17.56	12.13	2.73	32.42	19.72	3.49	1.24	0.53	5.26	3.20	1.59	0.97	39.28	23.88
45年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	1%	0.6020	107.1	17.38	12.13	2.71	32.22	19.39	3.45	1.24	0.53	5.22	3.14	1.58	0.95	39.01	23.49
46年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	1%	0.5961	107.1	17.20	12.13	2.68	32.01	19.08	3.42	1.24	0.52	5.18	3.09	1.56	0.93	38.75	23.10
47年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	1%	0.5902	107.1	17.02	12.12	2.65	31.80	18.77	3.38	1.24	0.51	5.14	3.03	1.55	0.92	38.49	22.71
48年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	1%	0.5843	107.1	16.84	12.12	2.62	31.59	18.46	3.35	1.24	0.51	5.10	2.98	1.54	0.90	38.23	22.34
49年目	R 62	0.98935	0.99984	0.98942	0.99200	1%	0.5785	107.1	16.66	12.12	2.60	31.38	18.15	3.31	1.24	0.50	5.06	2.93	1.53	0.88	37.96	21.96
合 計									1,047.32	605.56	164.06	1,816.94	1,369.89	208.18	62.05	31.84	302.08	228.25	91.08	68.82	2,210.10	1,666.96
