

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	徳島南部自動車道・阿南芸芸自動車道・高知東部自動車道 徳島JCT～高知JCT (一般国道5号 南国芸芸道路)
事業区分	一般国道(高規格B)
事業主体	四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	(一) 体評価 徳島JCT～高知JCT 全 体: 費用便益比(3便益)(B/C)= 1.1 (経済的純現在価値(B-C)= 1,053億円、経済的内部収益率(EIRR)= 4.3%) 残事業: 費用便益比(3便益)(B/C)= 1.8 (経済的純現在価値(B-C)= 3,117億円、経済的内部収益率(EIRR)= 8.2%) (南国芸芸道路) 全 体: 費用便益比(3便益)(B/C)= 3.3 (経済的純現在価値(B-C)= 2,644億円、経済的内部収益率(EIRR)= 15.7%) 残事業: 費用便益比(3便益)(B/C)= 1.03 (経済的純現在価値(B-C)= 5億円、経済的内部収益率(EIRR)= 4.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力		
円滑なモビリティの確保	● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率	時間損失削減量: 258万人時間/年 削減率: 94.2%
	□ 並行区間における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	—
	■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	現道を利用する路線バス 高知東部交通(路線バス) 平日11便/日、休日10便/日(往復)
	□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	—
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	高知龍馬空港(第二種空港)へのアクセス向上 安芸市～高知龍馬空港: 約16分短縮(56分⇒40分)
	物流効率化の支援	
	■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	高知港(国際コンテナ航路の発着港湾: 韓国航路)へのアクセス向上 安芸市～高知新港: 約16分短縮(68分⇒52分)
	■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上 園芸流通センター～JA高知県あき支所: 約16分短縮(64分⇒48分)
	都市の再生	
	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	—
	□ 三大都市圏の環状道路を形成する	—
	□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	—

	国土・地域ネットワークの構築	
	■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	高規格幹線道路 高知東部自動車道の一部を構成
	■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成 高知市～安芸市：約16分短縮（84分⇒68分）
	■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	日常生活圏中心都市である高知市へのアクセス向上 香南市夜須支所（旧夜須町）～高知市：約11分短縮（49分⇒38分）
	個性ある地域の形成	
	■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	観光振興プロジェクト（香南市・安芸市・室戸市）、ゆず振興ビジョン（北川村）、過疎地域自立促進プロジェクト（安芸市・室戸市）を支援
	■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上 高知JCT～モネの庭マルモッタン：約16分短縮（94分⇒78分）
	□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	－
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	
	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上 田野町～高知医療センター：約16分短縮（84分⇒68分）
3. 安全	安全な生活環境の確保	
	□ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	－
	災害への備え	
	■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に指定
	■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成
	■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	並行する高知自動車道の代替路線としての機能
	□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	－
4. 環境	地球環境の保全	
	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量：4千t-CO2/年 CO2 排出削減率：1.0%
	生活環境の改善・保全	
	● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	NO2 排出削減量：42.8t-NOX/年 NO2 排出削減率：85.6%
	● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	SPM 排出削減量：2.6t-SPM/年 SPM 排出削減率：89.5%
	□ 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	－
	□ その他、環境や景観上の効果が期待される	－
5. その他	他のプロジェクトとの関係	
	■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	第2次南国市都市計画マスタープラン
	■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上 「南海トラフ地震」における自衛隊救援活動ルートの確保 阿南安芸自動車道等と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
徳島南部自動車道 阿南安芸自動車道 高知東部自動車道	徳島JCT ～高知JCT	L=151.4km	高速自動車国道 二次改築 高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,600～30,300	2、4	四国地方整備局 高知県 NEXCO西日本

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和7年度			
単純合計	10,577億円	1,729億円	1,577億円	13,882億円
うち残事業分	3,997億円	1,010億円	434億円	5,441億円
基準年における 現在価値 (C)	14,106億円	675億円	254億円	15,035億円
うち残事業分	3,401億円	319億円	45億円	3,765億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和7年度			
供用年	平成23年度、平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度、 平成28年度、令和3年度、令和4年度、令和7年度、 令和8年度、令和12年度、令和13年度、令和14年度、 令和15年度、令和16年度、令和17年度、令和18年度			
単年便益 (初年便益)	21億円	2.1億円	0.67億円	24億円
基準年における 現在価値 (B)	13,885億円	1,766億円	437億円	16,088億円
うち残事業分	5,924億円	760億円	198億円	6,882億円

③結果

【事業全体】

費用便益比 (B / C)	1.1 [4%]	[参考] 1.5 [2%]	[参考] 1.8 [1%]
経済的純現在価値 (B - C)	1,053億円 [4%]	[参考] 7,713億円 [2%]	[参考] 13,191億円 [1%]
経済的内部収益率 (E I R R)	4.3%		

※〔 〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比 (B / C)	1.8 [4%]	[参考] 2.6 [2%]	[参考] 3.1 [1%]
経済的純現在価値 (B - C)	3,117億円 [4%]	[参考] 6,962億円 [2%]	[参考] 10,214億円 [1%]
経済的内部収益率 (E I R R)	8.2%		

※〔 〕内は社会的割引率

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	2,600～30,300	±10%	1.01～1.1
事業費	10,577億円	±10%	1.04～1.1
事業期間	46年	±20%	1.03～1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	2,600～30,300	±10%	1.6～2.1
事業費	3,997億円	±10%	1.7～2.0
事業期間	10年	±20%	1.7～1.8

交通状況の変化

【事業全体】

様式－3①

事業名：徳島JCT～高知JCT

(推計時点 R22年)

			整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 [徳島JCT～高知JCT] : 151.4km		交通量 ^{※1}	[台/日]	12,700
		走行時間 ^{※2}	[分]	138.2
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	2,419.14
②主な周辺道路 ^{※4}	国道55号 : 141.4km	交通量	[台/日]	15,100
		走行時間	[分]	281
		走行時間費用	[億円/年]	11,573.14
	国道11号 : 4.3km	交通量	[台/日]	40,600
		走行時間	[分]	15
		走行時間費用	[億円/年]	1,374.45
	国道32号 : 4.6km	交通量	[台/日]	30,800
		走行時間	[分]	9
		走行時間費用	[億円/年]	689.84
	国道493号 : 43.7km	交通量	[台/日]	1,200
		走行時間	[分]	84
		走行時間費用	[億円/年]	255.41
	高知北環状線 : 3.6km	交通量	[台/日]	17,000
		走行時間	[分]	6
		走行時間費用	[億円/年]	279.80
③その他道路合計 : 4430.6km		走行時間費用	[億円/年]	91,589.07
				89,104.55

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：4779.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	105,761.71	105,147.81	613.90

※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

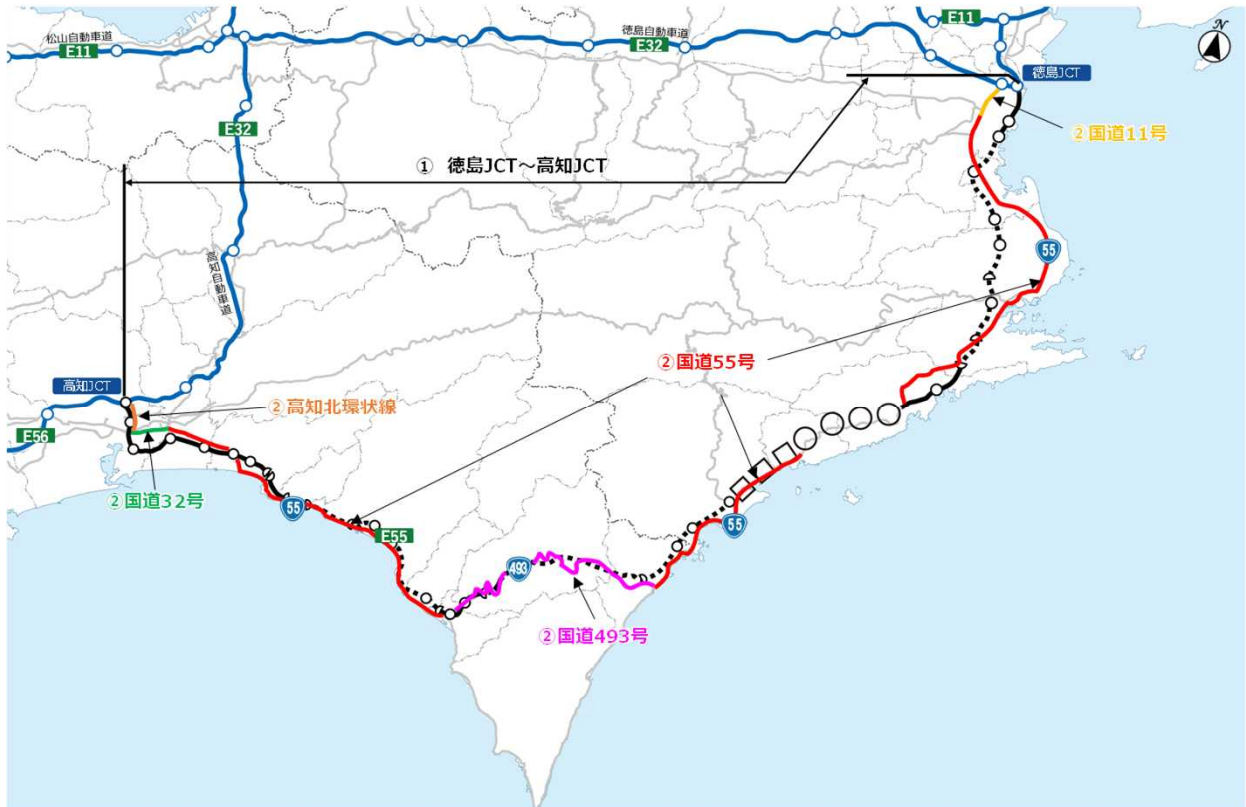

交通状況の変化

【残事業】

様式－3①

事業名：徳島JCT～高知JCT

(推計時点 R22年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 [徳島JCT～高知JCT] : 151.4km		交通量 ^{※1}	[台/日]	12,900	12,700
		走行時間 ^{※2}	[分]	45	138
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	1,621.09	1,898.56
②主な周辺道路 ^{※4}	国道55号 : 141.4km	交通量	[台/日]	12,300	7,900
		走行時間	[分]	235	208
		走行時間費用	[億円/年]	4,814.56	4,498.46
	国道11号 : 4.3km	交通量	[台/日]	24,600	22,600
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	504.87	501.78
	国道32号 : 4.6km	交通量	[台/日]	22,700	22,700
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	289.77	289.97
	国道493号 : 43.7km	交通量	[台/日]	800	100
		走行時間	[分]	80	77
		走行時間費用	[億円/年]	116.40	109.81
	高知北環状線 : 3.6km	交通量	[台/日]	15,500	15,900
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	131.57	132.29
③その他道路合計：4430.6km		走行時間費用	[億円/年]	40,650.29	40,313.88

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：4779.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	48,128.55	47,744.75	383.80

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

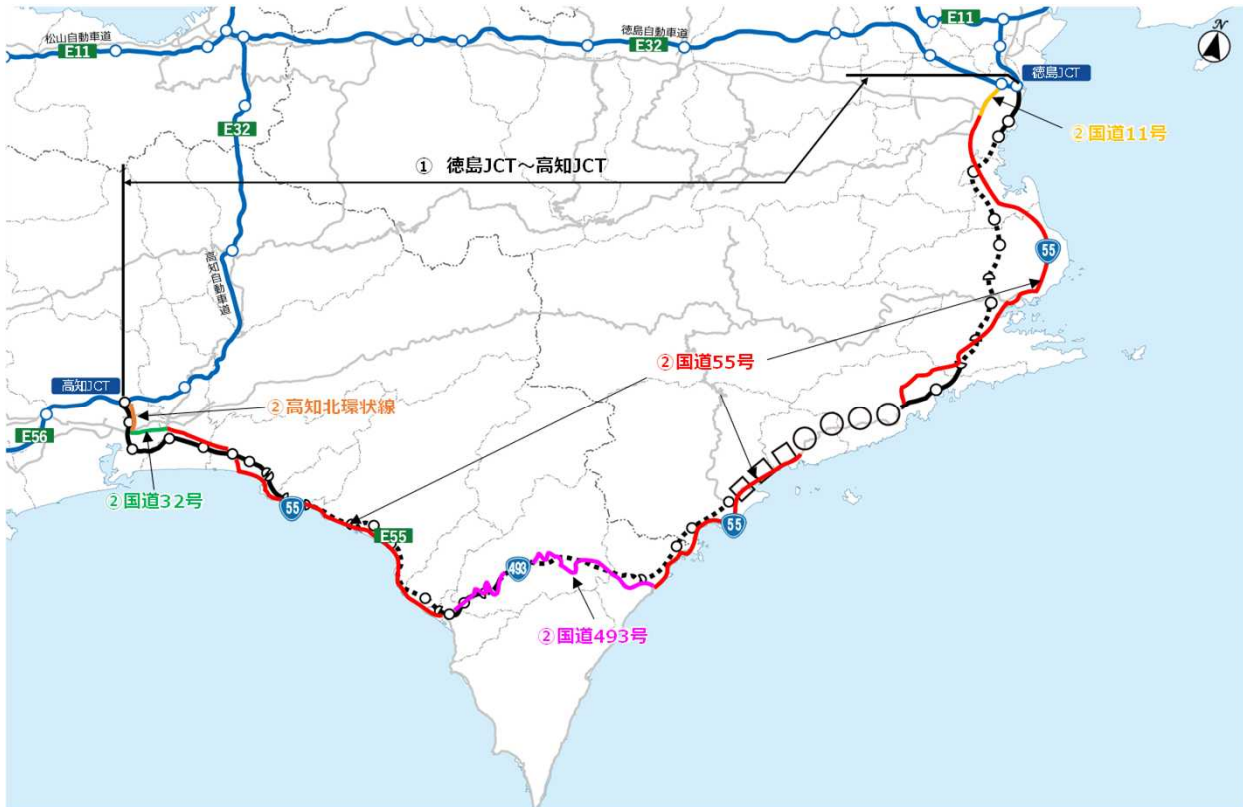

費用便益分析の条件

事業名：徳島JCT～高知JCT

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7月8月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	比較のための参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和7年度		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☐	
		複数時点での推計	☒ (H27、R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		無	☒	
	開発交通量の考慮	有	☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	
		Q-V式を用いた配分	☐	
		転換率式を用いた配分	☐	
	配分交通量の推計手法	Q-V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
		簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
その他()		☐		
速度設定の考え方		各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☒	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線交通容量(Qmin～Qmax)内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	☐		
	採用理由を記載			
その他()	☐			

(3)

項目			チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	☐	
		考慮する	☒	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数 並行現道(国道55号及び493号)における越波や土砂崩壊等による通行止め日数	(116.03) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
			考慮しない	☒
	冬期交通の 影響	考慮する	☐	
		考慮する 場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
			交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定
		その他 ()		☐
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	☒		
	中央分離帯の有無を考慮しない	☐		
走行時間短縮・走 行経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	☒		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	☐		
その他				

4. その他

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
							0.21	151.4	32.51	
-21年目	H 2	4%	3.9461	109.9	0.77	2.95				
-20年目	H 3	4%	3.7943	112.5	4.85	17.53				
-19年目	H 4	4%	3.6484	114.1	7.36	25.19				
-18年目	H 5	4%	3.5081	114.4	17.93	58.90				
-17年目	H 6	4%	3.3731	114.3	13.13	41.49				
-16年目	H 7	4%	3.2434	113.7	22.13	67.62				
-15年目	H 8	4%	3.1187	113.2	45.70	134.84				
-14年目	H 9	4%	2.9987	114.2	63.43	178.39				
-13年目	H 10	4%	2.8834	113.6	141.74	385.30				
-12年目	H 11	4%	2.7725	112.0	154.17	408.73				
-11年目	H 12	4%	2.6658	110.7	113.04	291.55				
-10年目	H 13	4%	2.5633	109.4	139.18	349.27				
-9年目	H 14	4%	2.4647	107.6	113.68	278.88				
-8年目	H 15	4%	2.3699	106.1	115.87	277.20				
-7年目	H 16	4%	2.2788	105.0	139.16	323.45				
-6年目	H 17	4%	2.1911	103.7	132.58	300.02				
-5年目	H 18	4%	2.1068	103.0	143.92	315.28				
-4年目	H 19	4%	2.0258	102.1	112.88	239.88				
-3年目	H 20	4%	1.9479	101.6	96.28	197.69				
-2年目	H 21	4%	1.8730	100.3	123.34	246.67				
-1年目	H 22	4%	1.8009	98.6	113.84	222.70				
供用開始年次	H 23	4%	1.7317	97.2	111.33	212.43	0.92	1.75		
供用開始(1年目)	H 24	4%	1.6651	96.4	158.99	294.11	2.83	5.23		
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.6010	96.4	176.86	314.59	3.42	6.08		
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.5395	98.7	168.20	280.97	3.86	6.45		
供用開始(4年目)	H 27	4%	1.4802	100.2	188.95	298.95	4.82	7.63		
供用開始(5年目)	H 28	4%	1.4233	100.2	324.87	494.23	5.65	8.60		
6年目	H 29	4%	1.3686	100.5	365.35	532.85	5.65	8.25		
7年目	H 30	4%	1.3159	100.4	393.24	552.01	5.65	7.94		
8年目	R 1	4%	1.2653	101.2	499.49	668.86	5.65	7.57		
9年目	R 2	4%	1.2167	101.9	488.52	624.69	5.65	7.23		
供用開始(10年目)	R 3	4%	1.1699	101.8	602.91	742.04	7.41	9.12		
供用開始(11年目)	R 4	4%	1.1249	102.7	349.17	409.60	9.91	11.62		
12年目	R 5	4%	1.0816	107.1	362.78	392.38	9.91	10.72		
13年目	R 6	4%	1.0400	107.1	318.60	331.35	9.91	10.31		
供用開始(14年目)	R 7	4%	1.0000	107.1	255.50	255.50	10.62	10.62		
供用開始(15年目)	R 8	4%	0.9615	107.1	443.87	426.80	11.18	10.75		
16年目	R 9	4%	0.9246	107.1	562.18	519.77	11.18	10.33		
17年目	R 10	4%	0.8890	107.1	652.58	580.14	11.18	9.94		
18年目	R 11	4%	0.8548	107.1	627.91	536.74	11.18	9.55		
供用開始(19年目)	R 12	4%	0.8219	107.1	556.31	457.25	13.20	10.85		
供用開始(20年目)	R 13	4%	0.7903	107.1	430.19	339.99	14.70	11.61		
供用開始(21年目)	R 14	4%	0.7599	107.1	361.73	274.89	16.73	12.71		
供用開始(22年目)	R 15	4%	0.7307	107.1	261.83	191.32	20.63	15.07		
供用開始(23年目)	R 16	4%	0.7026	107.1	147.82	103.86	24.30	17.07		
供用開始(24年目)	R 17	4%	0.6756	107.1	26.84	18.14	29.33	19.81		
完成供用年次	R 18	4%	0.6496	107.1	-8.79	-5.71	29.55	19.20		
26年目	R 19	4%	0.6246	107.1	-6.42	-4.01	29.55	18.46		
27年目	R 20	4%	0.6006	107.1	-4.77	-2.87	29.55	17.75		
28年目	R 21	4%	0.5775	107.1	-4.57	-2.64	29.55	17.06		
29年目	R 22	4%	0.5553	107.1	-4.57	-2.54	29.55	16.41		
30年目	R 23	4%	0.5339	107.1	-4.57	-2.44	29.55	15.78		
31年目	R 24	4%	0.5134	107.1	-4.57	-2.34	29.55	15.17		
32年目	R 25	4%	0.4936	107.1	-4.57	-2.25	29.55	14.59		
33年目	R 26	4%	0.4746	107.1	-4.57	-2.17	29.55	14.03		
34年目	R 27	4%	0.4564	107.1	-4.57	-2.08	29.55	13.49		
35年目	R 28	4%	0.4388	107.1	-4.57	-2.00	29.55	12.97		
36年目	R 29	4%	0.4220	107.1	-4.57	-1.93	29.55	12.47		
37年目	R 30	4%	0.4057	107.1	-4.46	-1.81	29.55	11.99		
38年目	R 31	4%	0.3901	107.1	-4.46	-1.74	29.55	11.53		
39年目	R 32	4%	0.3751	107.1	-4.46	-1.67	29.55	11.08		
40年目	R 33	4%	0.3607	107.1			29.55	10.66		
41年目	R 34	4%	0.3468	107.1			29.55	10.25		
42年目	R 35	4%	0.3335	107.1			29.55	9.85		
43年目	R 36	4%	0.3207	107.1			29.45	9.44		
44年目	R 37	4%	0.3083	107.1			29.45	9.08		
45年目	R 38	4%	0.2965	107.1			29.45	8.73		
46年目	R 39	4%	0.2851	107.1			29.45	8.40		
47年目	R 40	4%	0.2741	107.1			29.45	8.07		
48年目	R 41	4%	0.2636	107.1			29.45	7.76		
49年目	R 42	4%	0.2534	107.1			29.45	7.46		
50年目	R 43	4%	0.2437	107.1			29.45	7.18	57.76	14.08
51年目	R 44	4%	0.2343	107.1			29.45	6.90	98.26	23.02
52年目	R 45	4%	0.2253	107.1			29.45	6.64	31.15	7.02
53年目	R 46	4%	0.2166	107.1			29.45	6.38	23.73	5.14
54年目	R 47	4%	0.2083	107.1			29.45	6.13	120.58	25.12
55年目	R 48	4%	0.2003	107.1			29.45	5.90	80.70	16.16
56年目	R 49	4%	0.1926	107.1			29.45	5.67		
57年目	R 50	4%	0.1852	107.1			29.45	5.45		
58年目	R 51	4%	0.1780	107.1			29.45	5.24		
59年目	R 52	4%	0.1712	107.1			29.45	5.04		
60年目	R 53	4%	0.1646	107.1			29.45	4.85	529.64	87.18
61年目	R 54	4%	0.1583	107.1			29.45	4.66	151.06	23.91
62年目	R 55	4%	0.1522	107.1			29.45	4.48		
63年目	R 56	4%	0.1463	107.1			29.45	4.31		
64年目	R 57	4%	0.1407	107.1			29.45	4.14	49.56	6.97
65年目	R 58	4%	0.1353	107.1			29.45	3.98	33.94	4.59
66年目	R 59	4%	0.1301	107.1			29.35	3.82		
67年目	R 60	4%	0.1251	107.1			29.35	3.67		
68年目	R 61	4%	0.1203	107.1			29.35	3.53		
69年目	R 62	4%	0.1157	107.1			29.35	3.40	1.21	0.14
70年目	R 63	4%	0.1112	107.1			29.35	3.26	104.62	11.63
71年目	R 64	4%	0.1069	107.1			29.35	3.14	51.82	5.54
72年目	R 65	4%	0.1028	107.1			29.35	3.02	1.73	0.18
73年目	R 66	4%	0.0989	107.1			29.35	2.90	39.46	3.90
74年目	R 67	4%	0.0951	107.1	-762.57	-72.52	29.35	2.79	201.36	19.15
合 計					9,813.99	14,106.27	1,728.88	674.97	1,576.58	253.73
単純事業費計					10,576.56		1,728.88		1,576.58	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

〔参考：社会的割引率2%〕

維持管理費の単純価値の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-21年目	H 2	4%	3.9461	109.9	0.77	2.95				
-20年目	H 3	4%	3.6498	112.5	4.85	16.87				
-19年目	H 4	4%	3.5094	114.1	7.36	24.23				
-18年目	H 5	4%	3.3744	114.4	17.93	56.65				
-17年目	H 6	4%	3.2446	114.3	13.13	39.91				
-16年目	H 7	4%	3.1199	113.7	22.13	65.04				
-15年目	H 8	4%	2.9999	113.2	45.70	129.70				
-14年目	H 9	4%	2.8845	114.2	63.43	171.59				
-13年目	H 10	4%	2.7735	113.6	141.74	370.62				
-12年目	H 11	4%	2.6669	112.0	154.17	393.16				
-11年目	H 12	4%	2.5643	110.7	113.04	280.44				
-10年目	H 13	4%	2.4657	109.4	139.18	335.96				
-9年目	H 14	4%	2.3708	107.6	113.68	268.26				
-8年目	H 15	4%	2.2796	106.1	115.87	266.64				
-7年目	H 16	4%	2.1920	105.0	139.16	311.13				
-6年目	H 17	4%	2.1077	103.7	132.58	288.59				
-5年目	H 18	4%	2.0266	103.0	143.92	303.27				
-4年目	H 19	4%	1.9486	102.1	112.88	230.74				
-3年目	H 20	4%	1.8737	101.6	96.28	190.16				
-2年目	H 21	4%	1.8016	100.3	123.34	237.27				
-1年目	H 22	4%	1.7323	98.6	113.84	214.22				
供用開始年次	H 23	4%	1.6657	97.2	111.33	204.34	0.92	1.68		
供用開始(1年目)	H 24	4%	1.6016	96.4	158.99	282.90	2.83	5.03		
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.5400	96.4	176.86	302.60	3.42	5.84		
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.4808	98.7	168.20	270.27	3.86	6.21		
供用開始(4年目)	H 27	4%	1.4239	100.2	188.95	287.56	4.82	7.34		
供用開始(5年目)	H 28	4%	1.3691	100.2	324.87	475.41	5.65	8.28		
6年目	H 29	4%	1.3164	100.5	365.35	512.55	5.65	7.93		
7年目	H 30	4%	1.2658	100.4	393.24	530.98	5.65	7.64		
8年目	R 1	4%	1.2171	101.2	499.49	643.39	5.65	7.28		
9年目	R 2	4%	1.1703	101.9	488.52	600.89	5.65	6.96		
供用開始(10年目)	R 3	4%	1.1253	101.8	602.91	713.78	7.41	8.77		
供用開始(11年目)	R 4	4%	1.0820	102.7	349.17	393.99	9.91	11.18		
12年目	R 5	2%	1.0404	107.1	362.78	377.44	9.91	10.31		
13年目	R 6	2%	1.0200	107.1	318.60	324.98	9.91	10.11		
供用開始(14年目)	R 7	2%	1.0000	107.1	255.50	255.50	10.62	10.62		
供用開始(15年目)	R 8	2%	0.9804	107.1	443.87	435.17	11.18	10.96		
16年目	R 9	2%	0.9612	107.1	562.18	540.35	11.18	10.74		
17年目	R 10	2%	0.9423	107.1	652.58	614.94	11.18	10.53		
18年目	R 11	2%	0.9238	107.1	627.91	580.09	11.18	10.33		
供用開始(19年目)	R 12	2%	0.9057	107.1	556.31	503.87	13.20	11.96		
供用開始(20年目)	R 13	2%	0.8880	107.1	430.19	382.00	14.70	13.05		
供用開始(21年目)	R 14	2%	0.8706	107.1	361.73	314.91	16.73	14.57		
供用開始(22年目)	R 15	2%	0.8535	107.1	261.83	223.47	20.63	17.61		
供用開始(23年目)	R 16	2%	0.8368	107.1	147.82	123.69	24.30	20.33		
供用開始(24年目)	R 17	2%	0.8203	107.1	26.84	22.02	29.33	24.06		
完成供用年次	R 18	2%	0.8043	107.1	-8.79	-7.07	29.55	23.77		
26年目	R 19	2%	0.7885	107.1	-6.42	-5.06	29.55	23.30		
27年目	R 20	2%	0.7730	107.1	-4.77	-3.69	29.55	22.84		
28年目	R 21	2%	0.7579	107.1	-4.57	-3.46	29.55	22.40		
29年目	R 22	2%	0.7430	107.1	-4.57	-3.39	29.55	21.96		
30年目	R 23	2%	0.7284	107.1	-4.57	-3.33	29.55	21.53		
31年目	R 24	2%	0.7142	107.1	-4.57	-3.26	29.55	21.10		
32年目	R 25	2%	0.7002	107.1	-4.57	-3.20	29.55	20.69		
33年目	R 26	2%	0.6864	107.1	-4.57	-3.14	29.55	20.28		
34年目	R 27	2%	0.6730	107.1	-4.57	-3.07	29.55	19.89		
35年目	R 28	2%	0.6598	107.1	-4.57	-3.01	29.55	19.50		
36年目	R 29	2%	0.6468	107.1	-4.57	-2.95	29.55	19.11		
37年目	R 30	2%	0.6342	107.1	-4.46	-2.83	29.55	18.74		
38年目	R 31	2%	0.6217	107.1	-4.46	-2.77	29.55	18.37		
39年目	R 32	2%	0.6095	107.1	-4.46	-2.72	29.55	18.01		
40年目	R 33	2%	0.5976	107.1			29.55	17.66		
41年目	R 34	2%	0.5859	107.1			29.55	17.31		
42年目	R 35	2%	0.5744	107.1			29.55	16.97		
43年目	R 36	2%	0.5631	107.1			29.45	16.58		
44年目	R 37	2%	0.5521	107.1			29.45	16.26		
45年目	R 38	2%	0.5412	107.1			29.45	15.94		
46年目	R 39	2%	0.5306	107.1			29.45	15.63		
47年目	R 40	2%	0.5202	107.1			29.45	15.32		
48年目	R 41	2%	0.5100	107.1			29.45	15.02		
49年目	R 42	2%	0.5000	107.1			29.45	14.73		
50年目	R 43	2%	0.4902	107.1			29.45	14.44	57.76	28.31
51年目	R 44	2%	0.4806	107.1			29.45	14.15	98.26	47.22
52年目	R 45	2%	0.4712	107.1			29.45	13.88	31.15	14.68
53年目	R 46	2%	0.4619	107.1			29.45	13.60	23.73	10.96
54年目	R 47	2%	0.4529	107.1			29.45	13.34	120.58	54.61
55年目	R 48	2%	0.4440	107.1			29.45	13.08	80.70	35.83
56年目	R 49	2%	0.4353	107.1			29.45	12.82		
57年目	R 50	2%	0.4268	107.1			29.45	12.57		
58年目	R 51	2%	0.4184	107.1			29.45	12.32		
59年目	R 52	2%	0.4102	107.1			29.45	12.08		
60年目	R 53	2%	0.4022	107.1			29.45	11.84	529.64	213.02
61年目	R 54	2%	0.3943	107.1			29.45	11.61	151.06	59.56
62年目	R 55	2%	0.3865	107.1			29.45	11.38		
63年目	R 56	2%	0.3790	107.1			29.45	11.16		
64年目	R 57	2%	0.3715	107.1			29.45	10.94	49.56	18.41
65年目	R 58	2%	0.3642	107.1			29.45	10.73	33.94	12.36
66年目	R 59	2%	0.3571	107.1			29.35	10.48		
67年目	R 60	2%	0.3501	107.1			29.35	10.28		
68年目	R 61	2%	0.3432	107.1			29.35	10.07		
69年目	R 62	2%	0.3365	107.1			29.35	9.88	1.21	0.41
70年目	R 63	2%	0.3299	107.1			29.35	9.68	104.62	34.51
71年目	R 64	2%	0.3234	107.1			29.35	9.49	51.82	16.76
72年目	R 65	2%	0.3171	107.1			29.35	9.31	1.73	0.55
73年目	R 66	2%	0.3109	107.1			29.35	9.12	39.46	12.27
74年目	R 67	2%	0.3048	107.1	-762.57	-232.43	29.35	8.95	201.36	61.37
合 計					9,813.99	13,829.11	1,728.88	1,019.43	1,576.58	620.83
単純事業費計						10,576.56		1,728.88		1,576.58

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

〔参考：社会的割引率1%〕

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-21年目	H 2	4%	3.9461	109.9	0.77	2.95				
-20年目	H 3	4%	3.5786	112.5	4.85	16.54				
-19年目	H 4	4%	3.4409	114.1	7.36	23.76				
-18年目	H 5	4%	3.3086	114.4	17.93	55.55				
-17年目	H 6	4%	3.1813	114.3	13.13	39.14				
-16年目	H 7	4%	3.0590	113.7	22.13	63.77				
-15年目	H 8	4%	2.9413	113.2	45.70	127.17				
-14年目	H 9	4%	2.8282	114.2	63.43	168.24				
-13年目	H 10	4%	2.7194	113.6	141.74	363.39				
-12年目	H 11	4%	2.6148	112.0	154.17	385.49				
-11年目	H 12	4%	2.5143	110.7	113.04	274.97				
-10年目	H 13	4%	2.4176	109.4	139.18	329.41				
-9年目	H 14	4%	2.3246	107.6	113.68	263.02				
-8年目	H 15	4%	2.2352	106.1	115.87	261.44				
-7年目	H 16	4%	2.1492	105.0	139.16	305.06				
-6年目	H 17	4%	2.0665	103.7	132.58	282.96				
-5年目	H 18	4%	1.9871	103.0	143.92	297.35				
-4年目	H 19	4%	1.9106	102.1	112.88	226.24				
-3年目	H 20	4%	1.8371	101.6	96.28	186.45				
-2年目	H 21	4%	1.7665	100.3	123.34	232.64				
-1年目	H 22	4%	1.6985	98.6	113.84	210.04				
供用開始年次	H 23	4%	1.6332	97.2	111.33	200.35	0.92	1.65		
供用開始(1年目)	H 24	4%	1.5704	96.4	158.99	277.38	2.83	4.93		
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.5100	96.4	176.86	296.70	3.42	5.73		
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.4519	98.7	168.20	265.00	3.86	6.09		
供用開始(4年目)	H 27	4%	1.3961	100.2	188.95	281.95	4.82	7.19		
供用開始(5年目)	H 28	4%	1.3424	100.2	324.87	466.13	5.65	8.11		
6年目	H 29	4%	1.2908	100.5	365.35	502.55	5.65	7.78		
7年目	H 30	4%	1.2411	100.4	393.24	520.62	5.65	7.49		
8年目	R 1	4%	1.1934	101.2	499.49	630.83	5.65	7.14		
9年目	R 2	4%	1.1475	101.9	488.52	589.17	5.65	6.82		
供用開始(10年目)	R 3	4%	1.1033	101.8	602.91	699.85	7.41	8.60		
供用開始(11年目)	R 4	4%	1.0609	102.7	349.17	386.31	9.91	10.96		
12年目	R 5	1%	1.0201	107.1	362.78	370.07	9.91	10.11		
13年目	R 6	1%	1.0100	107.1	318.60	321.79	9.91	10.01		
供用開始(14年目)	R 7	1%	1.0000	107.1	255.50	255.50	10.62	10.62		
供用開始(15年目)	R 8	1%	0.9901	107.1	443.87	439.48	11.18	11.07		
16年目	R 9	1%	0.9803	107.1	562.18	551.10	11.18	10.96		
17年目	R 10	1%	0.9706	107.1	652.58	633.38	11.18	10.85		
18年目	R 11	1%	0.9610	107.1	627.91	603.41	11.18	10.74		
供用開始(19年目)	R 12	1%	0.9515	107.1	556.31	529.31	13.20	12.56		
供用開始(20年目)	R 13	1%	0.9420	107.1	430.19	405.26	14.70	13.84		
供用開始(21年目)	R 14	1%	0.9327	107.1	361.73	337.39	16.73	15.61		
供用開始(22年目)	R 15	1%	0.9235	107.1	261.83	241.80	20.63	19.05		
供用開始(23年目)	R 16	1%	0.9143	107.1	147.82	135.16	24.30	22.22		
供用開始(24年目)	R 17	1%	0.9053	107.1	26.84	24.30	29.33	26.55		
完成供用年次	R 18	1%	0.8963	107.1	-8.79	-7.87	29.55	26.49		
26年目	R 19	1%	0.8874	107.1	-6.42	-5.70	29.55	26.22		
27年目	R 20	1%	0.8787	107.1	-4.77	-4.19	29.55	25.96		
28年目	R 21	1%	0.8700	107.1	-4.57	-3.97	29.55	25.71		
29年目	R 22	1%	0.8613	107.1	-4.57	-3.93	29.55	25.45		
30年目	R 23	1%	0.8528	107.1	-4.57	-3.90	29.55	25.20		
31年目	R 24	1%	0.8444	107.1	-4.57	-3.86	29.55	24.95		
32年目	R 25	1%	0.8360	107.1	-4.57	-3.82	29.55	24.70		
33年目	R 26	1%	0.8277	107.1	-4.57	-3.78	29.55	24.46		
34年目	R 27	1%	0.8195	107.1	-4.57	-3.74	29.55	24.22		
35年目	R 28	1%	0.8114	107.1	-4.57	-3.71	29.55	23.98		
36年目	R 29	1%	0.8034	107.1	-4.57	-3.67	29.55	23.74		
37年目	R 30	1%	0.7954	107.1	-4.46	-3.54	29.55	23.51		
38年目	R 31	1%	0.7876	107.1	-4.46	-3.51	29.55	23.27		
39年目	R 32	1%	0.7798	107.1	-4.46	-3.47	29.55	23.04		
40年目	R 33	1%	0.7720	107.1			29.55	22.81		
41年目	R 34	1%	0.7644	107.1			29.55	22.59		
42年目	R 35	1%	0.7568	107.1			29.55	22.36		
43年目	R 36	1%	0.7493	107.1			29.45	22.07		
44年目	R 37	1%	0.7419	107.1			29.45	21.85		
45年目	R 38	1%	0.7346	107.1			29.45	21.63		
46年目	R 39	1%	0.7273	107.1			29.45	21.42		
47年目	R 40	1%	0.7201	107.1			29.45	21.21		
48年目	R 41	1%	0.7130	107.1			29.45	21.00		
49年目	R 42	1%	0.7059	107.1			29.45	20.79		
50年目	R 43	1%	0.6989	107.1			29.45	20.58	57.76	40.37
51年目	R 44	1%	0.6920	107.1			29.45	20.38	98.26	68.00
52年目	R 45	1%	0.6852	107.1			29.45	20.18	31.15	21.34
53年目	R 46	1%	0.6784	107.1			29.45	19.98	23.73	16.10
54年目	R 47	1%	0.6717	107.1			29.45	19.78	120.58	80.99
55年目	R 48	1%	0.6650	107.1			29.45	19.58	80.70	53.66
56年目	R 49	1%	0.6584	107.1			29.45	19.39		
57年目	R 50	1%	0.6519	107.1			29.45	19.20		
58年目	R 51	1%	0.6454	107.1			29.45	19.01		
59年目	R 52	1%	0.6391	107.1			29.45	18.82		
60年目	R 53	1%	0.6327	107.1			29.45	18.63	529.64	335.11
61年目	R 54	1%	0.6265	107.1			29.45	18.45	151.06	94.64
62年目	R 55	1%	0.6203	107.1			29.45	18.27		
63年目	R 56	1%	0.6141	107.1			29.45	18.09		
64年目	R 57	1%	0.6080	107.1			29.45	17.91	49.56	30.13
65年目	R 58	1%	0.6020	107.1			29.45	17.73	33.94	20.43
66年目	R 59	1%	0.5961	107.1			29.35	17.50		
67年目	R 60	1%	0.5902	107.1			29.35	17.32		
68年目	R 61	1%	0.5843	107.1			29.35	17.15		
69年目	R 62	1%	0.5785	107.1			29.35	16.98	1.21	0.70
70年目	R 63	1%	0.5728	107.1			29.35	16.81	104.62	59.93
71年目	R 64	1%	0.5671	107.1			29.35	16.64	51.82	29.39
72年目	R 65	1%	0.5615	107.1			29.35	16.48	1.73	0.97
73年目	R 66	1%	0.5560	107.1			29.35	16.32	39.46	21.94
74年目	R 67	1%	0.5504	107.1	-762.57	-419.72	29.35	16.15	201.36	110.83
合 計					9,813.99	13,597.99	1,728.88	1,312.64	1,576.58	984.53
単純事業費計					10,576.56		1,728.88		1,576.58	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)		更新費 (億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							0.18		115.0	20.93
供用開始年次	R 8	4%	0.9615	107.1	443.87	426.80	0.66	0.63		
1年目	R 9	4%	0.9246	107.1	562.18	519.77	0.66	0.61		
2年目	R 10	4%	0.8890	107.1	652.58	580.14	0.66	0.58		
3年目	R 11	4%	0.8548	107.1	627.91	536.74	0.66	0.56		
供用開始(4年目)	R 12	4%	0.8219	107.1	556.31	457.25	2.68	2.20		
供用開始(5年目)	R 13	4%	0.7903	107.1	430.19	339.99	4.17	3.30		
供用開始(6年目)	R 14	4%	0.7599	107.1	361.73	274.89	6.21	4.72		
供用開始(7年目)	R 15	4%	0.7307	107.1	261.83	191.32	10.11	7.38		
供用開始(8年目)	R 16	4%	0.7026	107.1	147.82	103.86	13.78	9.68		
供用開始(9年目)	R 17	4%	0.6756	107.1	26.84	18.14	18.81	12.70		
完成供用年次	R 18	4%	0.6496	107.1	-8.79	-5.71	19.03	12.36		
11年目	R 19	4%	0.6246	107.1	-6.42	-4.01	19.03	11.89		
12年目	R 20	4%	0.6006	107.1	-4.77	-2.87	19.03	11.43		
13年目	R 21	4%	0.5775	107.1	-4.57	-2.64	19.03	10.99		
14年目	R 22	4%	0.5553	107.1	-4.57	-2.54	19.03	10.57		
15年目	R 23	4%	0.5339	107.1	-4.57	-2.44	19.03	10.16		
16年目	R 24	4%	0.5134	107.1	-4.57	-2.34	19.03	9.77		
17年目	R 25	4%	0.4936	107.1	-4.57	-2.25	19.03	9.39		
18年目	R 26	4%	0.4746	107.1	-4.57	-2.17	19.03	9.03		
19年目	R 27	4%	0.4564	107.1	-4.57	-2.08	19.03	8.68		
20年目	R 28	4%	0.4388	107.1	-4.57	-2.00	19.03	8.35		
21年目	R 29	4%	0.4220	107.1	-4.57	-1.93	19.03	8.03		
22年目	R 30	4%	0.4057	107.1	-4.46	-1.81	19.03	7.72		
23年目	R 31	4%	0.3901	107.1	-4.46	-1.74	19.03	7.42		
24年目	R 32	4%	0.3751	107.1	-4.46	-1.67	19.03	7.14		
25年目	R 33	4%	0.3607	107.1			19.03	6.86		
26年目	R 34	4%	0.3468	107.1			19.03	6.60		
27年目	R 35	4%	0.3335	107.1			19.03	6.35		
28年目	R 36	4%	0.3207	107.1			19.03	6.10		
29年目	R 37	4%	0.3083	107.1			19.03	5.87		
30年目	R 38	4%	0.2965	107.1			19.03	5.64		
31年目	R 39	4%	0.2851	107.1			19.03	5.42		
32年目	R 40	4%	0.2741	107.1			19.03	5.22		
33年目	R 41	4%	0.2636	107.1			19.03	5.02		
34年目	R 42	4%	0.2534	107.1			19.03	4.82		
35年目	R 43	4%	0.2437	107.1			19.03	4.64		
36年目	R 44	4%	0.2343	107.1			19.03	4.46		
37年目	R 45	4%	0.2253	107.1			19.03	4.29		
38年目	R 46	4%	0.2166	107.1			19.03	4.12		
39年目	R 47	4%	0.2083	107.1			19.03	3.96		
40年目	R 48	4%	0.2003	107.1			19.03	3.81		
41年目	R 49	4%	0.1926	107.1			19.03	3.66		
42年目	R 50	4%	0.1852	107.1			19.03	3.52		
43年目	R 51	4%	0.1780	107.1			19.03	3.39		
44年目	R 52	4%	0.1712	107.1			19.03	3.26		
45年目	R 53	4%	0.1646	107.1			19.03	3.13		
46年目	R 54	4%	0.1583	107.1			19.03	3.01		
47年目	R 55	4%	0.1522	107.1			19.03	2.90		
48年目	R 56	4%	0.1463	107.1			19.03	2.78		
49年目	R 57	4%	0.1407	107.1			19.03	2.68		
50年目	R 58	4%	0.1353	107.1			19.03	2.57	33.94	4.59
51年目	R 59	4%	0.1301	107.1			19.03	2.48		
52年目	R 60	4%	0.1251	107.1			19.03	2.38		
53年目	R 61	4%	0.1203	107.1			19.03	2.29		
54年目	R 62	4%	0.1157	107.1			19.03	2.20	1.21	0.14
55年目	R 63	4%	0.1112	107.1			19.03	2.12	104.62	11.63
56年目	R 64	4%	0.1069	107.1			19.03	2.03	51.82	5.54
57年目	R 65	4%	0.1028	107.1			19.03	1.96	1.73	0.18
58年目	R 66	4%	0.0989	107.1			19.03	1.88	75.81	7.50
59年目	R 67	4%	0.0951	107.1	-102.10	-9.71	19.03	1.81	165.00	15.69
合 計					3,894.72	3,400.99	1,009.82	318.52	434.13	45.27
単純事業費計					3,996.82		1,009.82		434.13	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

〔参考：社会的割引率2%〕

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							0.18	115.0	20.93	
供用開始年次	R 8	2%	0.9804	107.1	443.87	435.17	0.66	0.64		
1年目	R 9	2%	0.9612	107.1	562.18	540.35	0.66	0.63		
2年目	R 10	2%	0.9423	107.1	652.58	614.94	0.66	0.62		
3年目	R 11	2%	0.9238	107.1	627.91	580.09	0.66	0.61		
供用開始(4年目)	R 12	2%	0.9057	107.1	556.31	503.87	2.68	2.43		
供用開始(5年目)	R 13	2%	0.8880	107.1	430.19	382.00	4.17	3.71		
供用開始(6年目)	R 14	2%	0.8706	107.1	361.73	314.91	6.21	5.41		
供用開始(7年目)	R 15	2%	0.8535	107.1	261.83	223.47	10.11	8.63		
供用開始(8年目)	R 16	2%	0.8368	107.1	147.82	123.69	13.78	11.53		
供用開始(9年目)	R 17	2%	0.8203	107.1	26.84	22.02	18.81	15.43		
完成供用年次	R 18	2%	0.8043	107.1	-8.79	-7.07	19.03	15.30		
11年目	R 19	2%	0.7885	107.1	-6.42	-5.06	19.03	15.00		
12年目	R 20	2%	0.7730	107.1	-4.77	-3.69	19.03	14.71		
13年目	R 21	2%	0.7579	107.1	-4.57	-3.46	19.03	14.42		
14年目	R 22	2%	0.7430	107.1	-4.57	-3.39	19.03	14.14		
15年目	R 23	2%	0.7284	107.1	-4.57	-3.33	19.03	13.86		
16年目	R 24	2%	0.7142	107.1	-4.57	-3.26	19.03	13.59		
17年目	R 25	2%	0.7002	107.1	-4.57	-3.20	19.03	13.32		
18年目	R 26	2%	0.6864	107.1	-4.57	-3.14	19.03	13.06		
19年目	R 27	2%	0.6730	107.1	-4.57	-3.07	19.03	12.81		
20年目	R 28	2%	0.6598	107.1	-4.57	-3.01	19.03	12.55		
21年目	R 29	2%	0.6468	107.1	-4.57	-2.95	19.03	12.31		
22年目	R 30	2%	0.6342	107.1	-4.46	-2.83	19.03	12.07		
23年目	R 31	2%	0.6217	107.1	-4.46	-2.77	19.03	11.83		
24年目	R 32	2%	0.6095	107.1	-4.46	-2.72	19.03	11.60		
25年目	R 33	2%	0.5976	107.1			19.03	11.37		
26年目	R 34	2%	0.5859	107.1			19.03	11.15		
27年目	R 35	2%	0.5744	107.1			19.03	10.93		
28年目	R 36	2%	0.5631	107.1			19.03	10.72		
29年目	R 37	2%	0.5521	107.1			19.03	10.51		
30年目	R 38	2%	0.5412	107.1			19.03	10.30		
31年目	R 39	2%	0.5306	107.1			19.03	10.10		
32年目	R 40	2%	0.5202	107.1			19.03	9.90		
33年目	R 41	2%	0.5100	107.1			19.03	9.71		
34年目	R 42	2%	0.5000	107.1			19.03	9.51		
35年目	R 43	2%	0.4902	107.1			19.03	9.33		
36年目	R 44	2%	0.4806	107.1			19.03	9.15		
37年目	R 45	2%	0.4712	107.1			19.03	8.97		
38年目	R 46	2%	0.4619	107.1			19.03	8.79		
39年目	R 47	2%	0.4529	107.1			19.03	8.62		
40年目	R 48	2%	0.4440	107.1			19.03	8.45		
41年目	R 49	2%	0.4353	107.1			19.03	8.28		
42年目	R 50	2%	0.4268	107.1			19.03	8.12		
43年目	R 51	2%	0.4184	107.1			19.03	7.96		
44年目	R 52	2%	0.4102	107.1			19.03	7.81		
45年目	R 53	2%	0.4022	107.1			19.03	7.65		
46年目	R 54	2%	0.3943	107.1			19.03	7.50		
47年目	R 55	2%	0.3865	107.1			19.03	7.36		
48年目	R 56	2%	0.3790	107.1			19.03	7.21		
49年目	R 57	2%	0.3715	107.1			19.03	7.07		
50年目	R 58	2%	0.3642	107.1			19.03	6.93	33.94	12.36
51年目	R 59	2%	0.3571	107.1			19.03	6.80		
52年目	R 60	2%	0.3501	107.1			19.03	6.66		
53年目	R 61	2%	0.3432	107.1			19.03	6.53		
54年目	R 62	2%	0.3365	107.1			19.03	6.40	1.21	0.41
55年目	R 63	2%	0.3299	107.1			19.03	6.28	104.62	34.51
56年目	R 64	2%	0.3234	107.1			19.03	6.15	51.82	16.76
57年目	R 65	2%	0.3171	107.1			19.03	6.03	1.73	0.55
58年目	R 66	2%	0.3109	107.1			19.03	5.92	75.81	23.57
59年目	R 67	2%	0.3048	107.1	-102.10	-31.12	19.03	5.80	165.00	50.29
合 計					3,894.72	3,656.44	1,009.82	540.18	434.13	138.45
単純事業費計					3,996.82		1,009.82		434.13	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

〔参考：社会的割引率1%〕

維持管理費の単純価値の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							0.18	115.0	20.93	
供用開始年次	R 8	1%	0.9901	107.1	443.87	439.48	0.66	0.65		
1年目	R 9	1%	0.9803	107.1	562.18	551.10	0.66	0.64		
2年目	R 10	1%	0.9706	107.1	652.58	633.38	0.66	0.64		
3年目	R 11	1%	0.9610	107.1	627.91	603.41	0.66	0.63		
供用開始(4年目)	R 12	1%	0.9515	107.1	556.31	529.31	2.68	2.55		
供用開始(5年目)	R 13	1%	0.9420	107.1	430.19	405.26	4.17	3.93		
供用開始(6年目)	R 14	1%	0.9327	107.1	361.73	337.39	6.21	5.79		
供用開始(7年目)	R 15	1%	0.9235	107.1	261.83	241.80	10.11	9.33		
供用開始(8年目)	R 16	1%	0.9143	107.1	147.82	135.16	13.78	12.60		
供用開始(9年目)	R 17	1%	0.9053	107.1	26.84	24.30	18.81	17.02		
完成供用年次	R 18	1%	0.8963	107.1	-8.79	-7.87	19.03	17.06		
11年目	R 19	1%	0.8874	107.1	-6.42	-5.70	19.03	16.89		
12年目	R 20	1%	0.8787	107.1	-4.77	-4.19	19.03	16.72		
13年目	R 21	1%	0.8700	107.1	-4.57	-3.97	19.03	16.55		
14年目	R 22	1%	0.8613	107.1	-4.57	-3.93	19.03	16.39		
15年目	R 23	1%	0.8528	107.1	-4.57	-3.90	19.03	16.23		
16年目	R 24	1%	0.8444	107.1	-4.57	-3.86	19.03	16.07		
17年目	R 25	1%	0.8360	107.1	-4.57	-3.82	19.03	15.91		
18年目	R 26	1%	0.8277	107.1	-4.57	-3.78	19.03	15.75		
19年目	R 27	1%	0.8195	107.1	-4.57	-3.74	19.03	15.59		
20年目	R 28	1%	0.8114	107.1	-4.57	-3.71	19.03	15.44		
21年目	R 29	1%	0.8034	107.1	-4.57	-3.67	19.03	15.29		
22年目	R 30	1%	0.7954	107.1	-4.46	-3.54	19.03	15.14		
23年目	R 31	1%	0.7876	107.1	-4.46	-3.51	19.03	14.99		
24年目	R 32	1%	0.7798	107.1	-4.46	-3.47	19.03	14.84		
25年目	R 33	1%	0.7720	107.1			19.03	14.69		
26年目	R 34	1%	0.7644	107.1			19.03	14.55		
27年目	R 35	1%	0.7568	107.1			19.03	14.40		
28年目	R 36	1%	0.7493	107.1			19.03	14.26		
29年目	R 37	1%	0.7419	107.1			19.03	14.12		
30年目	R 38	1%	0.7346	107.1			19.03	13.98		
31年目	R 39	1%	0.7273	107.1			19.03	13.84		
32年目	R 40	1%	0.7201	107.1			19.03	13.70		
33年目	R 41	1%	0.7130	107.1			19.03	13.57		
34年目	R 42	1%	0.7059	107.1			19.03	13.43		
35年目	R 43	1%	0.6989	107.1			19.03	13.30		
36年目	R 44	1%	0.6920	107.1			19.03	13.17		
37年目	R 45	1%	0.6852	107.1			19.03	13.04		
38年目	R 46	1%	0.6784	107.1			19.03	12.91		
39年目	R 47	1%	0.6717	107.1			19.03	12.78		
40年目	R 48	1%	0.6650	107.1			19.03	12.65		
41年目	R 49	1%	0.6584	107.1			19.03	12.53		
42年目	R 50	1%	0.6519	107.1			19.03	12.40		
43年目	R 51	1%	0.6454	107.1			19.03	12.28		
44年目	R 52	1%	0.6391	107.1			19.03	12.16		
45年目	R 53	1%	0.6327	107.1			19.03	12.04		
46年目	R 54	1%	0.6265	107.1			19.03	11.92		
47年目	R 55	1%	0.6203	107.1			19.03	11.80		
48年目	R 56	1%	0.6141	107.1			19.03	11.69		
49年目	R 57	1%	0.6080	107.1			19.03	11.57		
50年目	R 58	1%	0.6020	107.1			19.03	11.46	33.94	20.43
51年目	R 59	1%	0.5961	107.1			19.03	11.34		
52年目	R 60	1%	0.5902	107.1			19.03	11.23		
53年目	R 61	1%	0.5843	107.1			19.03	11.12		
54年目	R 62	1%	0.5785	107.1			19.03	11.01	1.21	0.70
55年目	R 63	1%	0.5728	107.1			19.03	10.90	104.62	59.93
56年目	R 64	1%	0.5671	107.1			19.03	10.79	51.82	29.39
57年目	R 65	1%	0.5615	107.1			19.03	10.68	1.73	0.97
58年目	R 66	1%	0.5560	107.1			19.03	10.58	75.81	42.15
59年目	R 67	1%	0.5504	107.1	-102.10	-56.20	19.03	10.47	165.00	90.83
合 計					3,894.72	3,781.73	1,009.82	729.00	434.13	244.40
単純事業費計					3,996.82		1,009.82		434.13	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)～(3)	現在価値
供用開始年次	H 23	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.7317	97.2	13.47	2.77	4.64	20.88	39.84	1.45	0.26	0.39	2.09	3.99	0.67	1.27	23.63	45.10
供用開始(1年目)	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.6651	96.4	37.98	7.76	9.68	55.41	102.50	4.37	0.87	0.85	6.10	11.28	1.38	2.56	62.89	116.34
供用開始(2年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.6010	96.4	47.56	9.48	12.85	69.89	124.32	5.79	1.09	1.13	8.01	14.25	1.66	2.95	79.56	141.52
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.5395	98.7	65.34	12.92	18.40	96.66	161.46	9.26	1.55	1.78	12.59	21.04	2.75	4.59	112.00	187.09
供用開始(4年目)	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.4802	100.2	78.12	14.53	21.15	113.80	180.05	11.21	1.74	2.01	14.96	23.67	3.05	4.83	131.81	208.55
供用開始(5年目)	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.4233	100.2	113.40	20.26	30.80	164.46	250.19	16.60	2.36	2.89	21.85	33.24	4.83	7.35	191.13	290.77
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.3686	100.5	112.89	20.42	30.34	163.66	238.69	16.52	2.38	2.85	21.75	31.72	4.80	7.01	190.21	277.42
7年目	R 1	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.3159	100.4	112.39	20.59	29.89	162.86	228.62	16.45	2.39	2.81	21.65	30.39	4.78	6.71	189.29	265.72
8年目	R 2	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.2653	101.2	111.88	20.75	29.44	162.07	217.02	16.37	2.41	2.77	21.56	28.86	4.75	6.36	188.38	252.25
9年目	R 3	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.2167	101.9	111.38	20.91	28.98	161.27	206.23	16.30	2.43	2.72	21.46	27.44	4.73	6.04	187.46	239.71
供用開始(10年目)	R 4	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1699	101.8	123.81	24.31	31.24	179.36	220.75	18.85	2.96	2.97	24.78	30.50	5.98	7.36	210.12	258.61
供用開始(11年目)	R 5	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.1249	102.7	151.16	44.60	37.77	233.54	273.95	21.56	3.55	3.39	28.51	33.44	6.96	8.17	269.01	315.56
12年目	R 6	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	4%	1.0816	107.1	150.47	44.95	37.16	232.58	251.56	21.46	3.58	3.34	28.38	30.69	6.93	7.49	267.88	289.74
13年目	R 7	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	4%	1.0400	107.1	149.77	45.29	36.55	231.62	240.88	21.37	3.60	3.28	28.25	29.38	6.89	7.16	266.76	277.43
供用開始(14年目)	R 8	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	4%	1.0000	107.1	158.46	47.31	38.61	244.38	244.38	23.38	3.90	3.74	31.02	31.02	7.62	7.62	283.02	283.02
供用開始(15年目)	R 9	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	4%	0.9615	107.1	172.72	50.07	41.16	263.94	253.79	25.28	4.12	3.92	33.32	32.04	8.23	7.91	305.49	293.74
16年目	R 10	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	4%	0.9246	107.1	171.91	50.44	40.44	262.80	242.97	25.16	4.16	3.85	33.17	30.66	8.19	7.57	304.15	281.20
17年目	R 11	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	4%	0.8890	107.1	171.10	50.82	39.73	261.65	232.61	25.04	4.19	3.78	33.01	29.35	8.14	7.24	302.80	269.19
18年目	R 12	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	4%	0.8548	107.1	170.30	51.19	39.02	260.51	222.69	24.92	4.22	3.71	32.86	28.09	8.09	6.92	301.46	257.69
供用開始(19年目)	R 13	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	4%	0.8219	107.1	178.72	53.41	41.06	273.18	224.54	25.59	4.36	3.79	33.74	27.73	8.09	6.65	315.02	258.92
供用開始(20年目)	R 14	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	4%	0.7903	107.1	190.00	56.63	44.13	290.76	229.79	28.69	5.11	4.34	38.14	30.14	9.32	7.37	338.22	267.30
供用開始(21年目)	R 15	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	4%	0.7599	107.1	294.93	82.70	66.84	444.47	337.76	42.81	8.52	6.63	57.96	44.05	12.93	9.83	515.37	391.64
供用開始(22年目)	R 16	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	4%	0.7307	107.1	302.31	85.01	68.55	455.86	333.09	45.18	9.03	7.10	61.31	44.80	13.76	10.05	530.92	387.94
供用開始(23年目)	R 17	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	4%	0.7026	107.1	310.34	88.97	70.62	469.94	330.17	46.67	9.34	7.04	63.05	44.30	15.65	11.00	548.64	385.47
供用開始(24年目)	R 18	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	4%	0.6756	107.1	408.49	111.66	91.82	611.97	413.43	58.08	10.64	8.49	77.20	52.15	19.88	13.43	709.06	479.01
完成供用年次	R 19	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	4%	0.6496	107.1	412.32	118.18	94.07	624.58	405.71	58.88	11.55	9.10	79.53	51.66	20.42	13.26	724.53	470.64
26年目	R 20	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	4%	0.6246	107.1	410.18	118.84	92.88	621.91	388.44	58.58	11.62	8.98	79.18	49.45	20.32	12.69	721.40	450.59
27年目	R 21	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	4%	0.6006	107.1	408.04	119.51	91.69	619.24	371.90	58.27	11.69	8.87	78.82	47.34	20.21	12.14	718.28	431.38
28年目	R 22	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	4%	0.5775	107.1	405.90	120.18	90.49	616.57	356.05	57.97	11.75	8.75	78.47	45.31	20.11	11.61	715.15	412.98
29年目	R 23	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	4%	0.5553	107.1	403.76	120.84	89.30	613.90	340.88	57.66	11.82	8.64	78.11	43.37	20.01	11.11	712.02	395.36
30年目	R 24	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	4%	0.5339	107.1	400.10	120.85	88.57	609.52	325.43	57.14	11.82	8.57	77.52	41.39	19.85	10.60	706.89	377.42
31年目	R 25	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	4%	0.5134	107.1	396.44	120.85	87.84	605.13	310.66	56.61	11.82	8.49	76.93	39.49	19.70	10.11	701.76	360.27
32年目	R 26	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	4%	0.4936	107.1	392.79	120.85	87.11	600.75	296.55	56.09	11.82	8.42	76.33	37.68	19.55	9.65	696.63	343.88
33年目	R 27	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	4%	0.4746	107.1	389.13	120.86	86.38	596.37	283.06	55.57	11.82	8.35	75.74	35.95	19.40	9.21	691.51	328.22
34年目	R 28	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	4%	0.4564	107.1	385.47	120.86	85.65	591.98	270.17	55.05	11.82	8.28	75.15	34.30	19.25	8.78	686.38	313.25
35年目	R 29	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	4%	0.4388	107.1	381.81	120.86	84.92	587.60	257.86	54.53	11.82	8.21	74.56	32.72	19.10	8.38	681.25	298.95
36年目	R 30	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	4%	0.4220	107.1	378.15	120.87	84.19	583.21	246.09	54.00	11.82	8.14	73.96	31.21	18.95	7.99	676.12	285.29
37年目	R 31	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	4%	0.4057	107.1	374.50	120.87	83.46	578.83	234.85	53.48	11.82	8.07	73.37	29.77	18.79	7.63	670.99	272.24
38年目	R 32	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	4%	0.3901	107.1	370.84	120.87	82.73	574.44	224.10	52.96	11.82	8.00	72.78	28.39	18.64	7.27	665.86	259.77
39年目	R 33	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	4%	0.3751	107.1	367.18	120.88	82.00	570.06	213.84	52.44	11.82	7.93	72.18	27.08	18.49	6.94	660.73	247.85
40年目	R 34	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	4%	0.360															

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

【参考：社会的割引率2%】

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)				
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車					乗用車					③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
									乗用車	普通貨物車	小型貨物車	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	普通貨物車	小型貨物車	② 計	現在価値 (A)×②							
供用開始年次	H 23	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.6657	97.2	13.47	2.77	4.64	20.88	38.32	1.45	0.26	0.39	2.09	3.84	0.67	1.22	23.63	43.38			
供用開始(1年目)	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.6016	96.4	37.98	7.76	9.68	55.41	98.60	4.37	0.87	0.85	6.10	10.85	1.38	2.46	62.89	111.90			
供用開始(2年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.5400	96.4	47.56	9.48	12.85	69.89	119.58	5.79	1.09	1.13	8.01	13.70	1.66	2.84	79.56	136.13			
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.4808	98.7	65.34	12.92	18.40	96.66	155.31	9.26	1.55	1.78	12.59	20.24	2.75	4.42	112.00	179.96			
供用開始(4年目)	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.4239	100.2	78.12	14.53	21.15	113.80	173.19	11.21	1.74	2.01	14.96	22.77	3.05	4.64	131.81	200.60			
供用開始(5年目)	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.3691	100.2	113.40	20.26	30.80	164.46	240.66	16.60	2.36	2.89	21.85	31.97	4.83	7.07	191.13	279.70			
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.3164	100.5	112.89	20.42	30.34	163.66	229.60	16.52	2.38	2.85	21.75	30.51	4.80	6.74	190.21	266.85			
7年目	H 30	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.2658	100.4	112.39	20.59	29.89	162.86	219.91	16.45	2.39	2.81	21.65	29.24	4.78	6.45	189.29	255.60			
8年目	R 1	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.2171	101.2	111.88	20.75	29.44	162.07	208.76	16.37	2.41	2.77	21.56	27.76	4.75	6.12	188.38	242.64			
9年目	R 2	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.1703	101.9	111.38	20.91	28.98	161.27	198.37	16.30	2.43	2.72	21.46	26.39	4.73	5.81	187.46	230.58			
供用開始(10年目)	R 3	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1253	101.8	123.81	24.31	31.24	179.36	212.34	18.85	2.96	2.97	24.78	29.34	5.98	7.08	210.12	248.76			
供用開始(11年目)	R 4	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.0820	102.7	151.16	44.60	37.77	233.54	263.52	21.56	3.55	3.39	28.51	32.16	6.96	7.86	269.01	303.54			
12年目	R 5	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	2%	1.0404	107.1	150.47	44.95	37.16	232.58	241.97	21.46	3.34	28.38	29.53	6.93	7.21	267.88	278.71				
13年目	R 6	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	2%	1.0200	107.1	149.77	45.29	36.55	231.62	236.25	21.37	3.60	3.28	28.25	28.82	6.89	7.03	266.76	272.09			
供用開始(14年目)	R 7	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	2%	1.0000	107.1	158.46	47.31	38.61	244.38	244.38	23.38	3.90	3.74	31.02	31.02	7.62	7.62	283.02	283.02			
供用開始(15年目)	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	2%	0.9804	107.1	172.72	50.07	41.16	263.94	258.76	25.28	4.12	3.92	33.32	32.67	8.23	8.07	305.49	299.50			
16年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	2%	0.9612	107.1	171.91	50.44	40.44	262.80	252.59	25.16	4.16	3.85	33.17	31.88	8.19	7.87	304.15	292.34			
17年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	2%	0.9423	107.1	171.10	50.82	39.73	261.65	246.56	25.04	4.19	3.78	33.01	31.11	8.14	7.67	302.80	285.34			
18年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	2%	0.9238	107.1	170.30	51.19	39.02	260.51	240.67	24.92	4.22	3.71	32.86	30.35	8.09	7.48	301.46	278.50			
供用開始(19年目)	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	2%	0.9057	107.1	178.72	53.41	41.06	273.18	247.43	25.59	4.36	3.79	33.74	30.56	8.09	7.33	315.02	285.32			
供用開始(20年目)	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	2%	0.8880	107.1	190.00	56.63	44.13	290.76	258.18	28.69	5.11	4.34	38.14	33.87	9.32	8.28	338.22	300.33			
供用開始(21年目)	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	2%	0.8706	107.1	294.93	82.70	66.84	444.47	386.94	42.81	8.52	6.63	57.96	50.46	12.93	11.26	515.37	448.16			
供用開始(22年目)	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	2%	0.8535	107.1	302.31	85.01	68.55	455.86	389.07	45.18	9.03	7.10	61.31	52.32	13.76	11.74	530.92	453.14			
供用開始(23年目)	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	2%	0.8368	107.1	310.34	88.97	70.62	469.94	393.22	46.67	9.34	7.04	63.05	52.76	15.65	13.10	548.64	459.08			
供用開始(24年目)	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	2%	0.8203	107.1	408.49	111.66	91.82	611.97	503.23	58.08	10.64	8.49	77.20	63.33	19.88	16.31	709.06	581.68			
完成供用年次	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	2%	0.8043	107.1	412.32	118.18	94.07	624.58	502.32	58.88	11.55	9.10	79.53	63.97	20.42	16.42	724.53	582.71			
26年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	2%	0.7885	107.1	410.18	118.84	92.88	621.91	490.37	58.58	11.62	8.98	79.18	62.43	20.32	16.02	721.40	568.82			
27年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	2%	0.7730	107.1	408.04	119.51	91.69	619.24	478.69	58.27	11.69	8.87	78.82	60.93	20.21	15.63	718.28	555.25			
28年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	2%	0.7579	107.1	405.90	120.18	90.49	616.57	467.28	57.97	11.75	8.75	78.47	59.47	20.11	15.24	715.15	541.99			
29年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	2%	0.7430	107.1	403.76	120.84	89.30	613.90	456.14	57.66	11.82	8.64	78.11	58.04	20.01	14.86	712.02	529.04			
30年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	2%	0.7284	107.1	400.10	120.85	88.57	609.52	444.00	57.14	11.82	8.57	77.52	56.47	19.85	14.46	706.89	514.93			
31年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	2%	0.7142	107.1	396.44	120.85	87.84	605.13	432.16	56.61	11.82	8.49	76.93	54.94	19.70	14.07	701.76	501.17			
32年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	2%	0.7002	107.1	392.79	120.85	87.11	600.75	420.62	56.09	11.82	8.42	76.33	53.45	19.55	13.69	696.63	487.76			
33年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	2%	0.6864	107.1	389.13	120.86	86.38	596.37	409.36	55.57	11.82	8.35	75.74	51.99	19.40	13.32	691.51	474.61			
34年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	2%	0.6730	107.1	385.47	120.86	85.65	591.98	398.39	55.05	11.82	8.28	75.15	50.57	19.25	12.95	686.38	461.97			
35年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	2%	0.6598	107.1	381.81	120.86	84.92	587.60	387.68	54.53	11.82	8.21	74.56	49.19	19.10	12.60	681.25	449.47			
36年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	2%	0.6468	107.1	378.15	120.87	84.19	583.21	377.24	54.00	11.82	8.14	73.96	47.84	18.95	12.25	676.12	437.34			
37年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	2%	0.6342	107.1	374.50	120.87	83.46	578.83	367.07	53.48	11.82	8.07	73.37	46.53	18.79	11.92	670.99	425.51			
38年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	2%	0.6217	107.1	370.84	120.87	82.73	574.44	357.14	52.96	11.82	8.00	72.78	45.25	18.64	11.59</					

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：徳島JCT～高知JCT

【参考：社会的割引率1%】

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)					社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計	乗用車				普通貨物車	小型貨物車	① 計	現在価値 (1) × (A)	乗用車	普通貨物車	小型貨物車	② 計	現在価値 (A) × (2)	③	現在価値 (3) × (A)	便益合計 (1) ~ (3)	現在価値	
供用開始年次	H 23	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.6332	97.2	13.47	2.77	4.64	20.88	37.57	1.45	0.26	0.39	2.09	3.76	0.67	1.20	23.63	42.53	
供用開始(1年目)	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.5704	96.4	37.98	7.76	9.68	55.41	96.67	4.37	0.87	0.85	6.10	10.64	1.38	2.41	62.89	109.72	
供用開始(2年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.5100	96.4	47.56	9.48	12.85	69.89	117.25	5.79	1.09	1.13	8.01	13.44	1.66	2.79	79.56	133.47	
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.4519	98.7	65.34	12.92	18.40	96.66	152.28	9.26	1.55	1.78	12.59	19.84	2.75	4.33	112.00	176.45	
供用開始(4年目)	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.3961	100.2	78.12	14.53	21.15	113.80	169.81	11.21	1.74	2.01	14.96	22.32	3.05	4.55	131.81	196.69	
供用開始(5年目)	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.3424	100.2	113.40	20.26	30.80	164.46	235.96	16.60	2.36	2.89	21.85	31.35	4.83	6.93	191.13	274.24	
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.2908	100.5	112.89	20.42	30.34	163.66	225.12	16.52	2.38	2.85	21.75	29.92	4.80	6.61	190.21	261.64	
7年目	H 30	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.2411	100.4	112.39	20.59	29.89	162.86	215.62	16.45	2.39	2.81	21.65	28.67	4.78	6.33	189.29	250.61	
8年目	R 1	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.1934	101.2	111.88	20.75	29.44	162.07	204.68	16.37	2.41	2.77	21.56	27.22	4.75	6.00	188.38	237.91	
9年目	R 2	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.1475	101.9	111.38	20.91	28.98	161.27	194.50	16.30	2.43	2.72	21.46	25.88	4.73	5.70	187.46	226.08	
供用開始(10年目)	R 3	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1033	101.8	123.81	24.31	31.24	179.36	208.19	18.85	2.96	2.97	24.78	28.76	5.98	6.95	210.12	243.90	
供用開始(11年目)	R 4	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.0609	102.7	151.16	44.60	37.77	233.54	258.38	21.56	3.55	3.39	28.51	31.54	6.96	7.70	269.01	297.62	
12年目	R 5	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	1%	1.0201	107.1	150.47	44.95	37.16	232.58	237.25	21.46	3.58	3.34	28.38	28.95	6.93	7.06	267.88	273.27	
13年目	R 6	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	1%	1.0100	107.1	149.77	45.29	36.55	231.62	233.94	21.37	3.60	3.28	28.25	28.53	6.89	6.96	266.76	269.43	
供用開始(14年目)	R 7	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	1%	1.0000	107.1	158.46	47.31	38.61	244.38	244.38	23.38	3.90	3.74	31.02	31.02	7.62	7.62	283.02	283.02	
供用開始(15年目)	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	1%	0.9901	107.1	172.72	50.07	41.16	263.94	261.33	25.28	4.12	3.92	33.32	32.99	8.23	8.15	305.49	302.47	
16年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	1%	0.9803	107.1	171.91	50.44	40.44	262.80	257.62	25.16	4.16	3.85	33.17	32.51	8.19	8.02	304.15	298.15	
17年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	1%	0.9706	107.1	171.10	50.82	39.73	261.65	253.96	25.04	4.19	3.78	33.01	32.04	8.14	7.90	302.80	293.90	
18年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	1%	0.9610	107.1	170.30	51.19	39.02	260.51	250.35	24.92	4.22	3.71	32.86	31.57	8.09	7.78	301.46	289.70	
供用開始(19年目)	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	1%	0.9515	107.1	178.72	53.41	41.06	273.18	259.93	25.59	4.36	3.79	33.74	32.10	8.09	7.70	315.02	299.73	
供用開始(20年目)	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	1%	0.9420	107.1	190.00	56.63	44.13	290.76	273.91	28.69	5.11	4.34	38.14	35.93	9.32	8.78	338.22	318.62	
供用開始(21年目)	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	1%	0.9327	107.1	294.93	82.70	66.84	444.47	414.56	42.81	8.52	6.63	57.96	54.06	12.93	12.06	515.37	480.69	
供用開始(22年目)	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	1%	0.9235	107.1	302.31	85.01	68.55	455.86	420.98	45.18	9.03	7.10	61.31	56.61	13.76	12.71	530.92	490.30	
供用開始(23年目)	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	1%	0.9143	107.1	310.34	88.97	70.62	469.94	429.68	46.67	9.34	7.04	63.05	57.65	15.65	14.31	548.64	501.65	
供用開始(24年目)	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	1%	0.9053	107.1	408.49	111.66	91.82	611.97	554.01	58.08	10.64	8.49	77.20	69.89	19.88	18.00	709.06	641.90	
完成供用年次	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	1%	0.8963	107.1	412.32	118.18	94.07	624.58	559.82	58.88	11.55	9.10	79.53	71.29	20.42	18.30	724.53	649.41	
26年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	1%	0.8874	107.1	410.18	118.84	92.88	621.91	551.91	58.58	11.62	8.98	79.18	70.27	20.32	18.03	721.40	640.21	
27年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	1%	0.8787	107.1	408.04	119.51	91.69	619.24	544.10	58.27	11.69	8.87	78.82	69.26	20.21	17.76	718.28	631.12	
28年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	1%	0.8700	107.1	405.90	120.18	90.49	616.57	536.39	57.97	11.75	8.75	78.47	68.26	20.11	17.49	715.15	622.15	
29年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	1%	0.8613	107.1	403.76	120.84	89.30	613.90	528.79	57.66	11.82	8.64	78.11	67.28	20.01	17.23	712.02	613.30	
30年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	1%	0.8528	107.1	400.10	120.85	88.57	609.52	519.81	57.14	11.82	8.57	77.52	66.11	19.85	16.93	706.89	602.85	
31年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	1%	0.8444	107.1	396.44	120.85	87.84	605.13	510.96	56.61	11.82	8.49	76.93	64.95	19.70	16.64	701.76	592.55	
32年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	1%	0.8360	107.1	392.79	120.85	87.11	600.75	502.24	56.09	11.82	8.42	76.33	63.82	19.55	16.35	696.63	582.40	
33年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	1%	0.8277	107.1	389.13	120.86	86.38	596.37	493.64	55.57	11.82	8.35	75.74	62.69	19.40	16.06	691.51	572.39	
34年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	1%	0.8195	107.1	385.47	120.86	85.65	591.98	485.16	55.05	11.82	8.28	75.15	61.59	19.25	15.77	686.38	562.52	
35年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	1%	0.8114	107.1	381.81	120.86	84.92	587.60	476.79	54.53	11.82	8.21	74.56	60.50	19.10	15.50	681.25	552.79	
36年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	1%	0.8034	107.1	378.15	120.87	84.19	583.21	468.55	54.00	11.82	8.14	73.96	59.42	18.95	15.22	676.12	543.19	
37年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	1%	0.7954	107.1	374.50	120.87	83.46	578.83	460.42	53.48	11.82	8.07	73.37	58.36	18.79	14.95	670.99	533.73	
38年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	1%	0.7876	107.1	370.84	120.87	82.73	574.44	452.41	52.96	11.82	8.00	72.78	57.32	18.64	14.68	665.86	524.41	
39年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	1%	0.7798	107.1	367.18	120.88	82.00	570.06	444.51	52.44	11.82	7.93	72.18	56.29	18.49	14.42	660.73	515.22	
40年目	R 33	0.99004																					

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

年次	年度 (基準年)	総走行台枠の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車種類	普通貨物	小型貨物	① 計	①×(A)	乗用車種類	普通貨物	小型貨物	② 計	②×(A)	③	③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	4%	0.9615	107.1	14.99	2.40	3.20	20.60	19.80	2.01	0.19	0.24	2.44	2.35	0.66	0.63	23.70	22.78
1年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	4%	0.9246	107.1	14.92	2.42	3.15	20.49	18.94	2.00	0.19	0.24	2.43	2.25	0.65	0.60	23.57	21.80
2年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	4%	0.8890	107.1	14.85	2.44	3.09	20.38	18.12	1.99	0.20	0.24	2.42	2.15	0.65	0.58	23.45	20.85
3年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	4%	0.8548	107.1	14.78	2.46	3.04	20.28	17.33	1.98	0.20	0.23	2.41	2.06	0.65	0.55	23.33	19.94
供用開始(4年目)	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	4%	0.8219	107.1	23.94	4.32	5.73	33.99	27.93	2.75	0.31	0.37	3.43	2.82	0.69	0.57	38.10	31.32
供用開始(5年目)	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	4%	0.7903	107.1	36.00	7.25	9.21	52.47	41.46	5.97	1.03	0.96	7.97	6.30	1.95	1.54	62.39	49.30
供用開始(6年目)	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	4%	0.7599	107.1	141.71	33.04	32.34	207.09	157.37	20.21	4.42	3.29	27.92	21.22	5.60	4.26	240.61	182.84
供用開始(7年目)	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	4%	0.7307	107.1	149.86	35.06	34.46	219.39	160.31	22.69	4.91	3.80	31.39	22.94	6.46	4.72	257.24	187.97
供用開始(8年目)	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	4%	0.7026	107.1	158.68	38.74	36.96	234.37	164.67	24.30	5.20	3.78	33.27	23.38	8.39	5.90	276.04	193.94
供用開始(9年目)	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	4%	0.6756	107.1	257.61	61.14	58.57	377.32	254.91	35.81	6.47	5.27	47.55	32.13	12.66	8.55	437.53	295.58
完成供用年次	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	4%	0.6496	107.1	262.22	67.37	61.24	390.83	253.88	36.74	7.36	5.92	50.02	32.49	13.23	8.60	454.08	294.96
11年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	4%	0.6246	107.1	260.86	67.75	60.46	389.07	243.01	36.55	7.40	5.84	49.79	31.10	13.17	8.22	452.03	282.34
12年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	4%	0.6006	107.1	259.50	68.13	59.69	387.31	232.61	36.35	7.45	5.77	49.57	29.77	13.10	7.87	449.98	270.25
13年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	4%	0.5775	107.1	258.13	68.51	58.91	385.56	222.65	36.16	7.49	5.69	49.35	28.50	13.03	7.53	447.93	258.67
14年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	4%	0.5553	107.1	256.77	68.89	58.13	383.80	213.11	35.97	7.53	5.62	49.12	27.28	12.96	7.20	445.88	247.58
15年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	4%	0.5339	107.1	254.45	68.89	57.66	381.00	203.42	35.65	7.53	5.57	48.75	26.03	12.87	6.87	442.61	236.32
16年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	4%	0.5134	107.1	252.12	68.89	57.18	378.20	194.16	35.32	7.53	5.53	48.38	24.84	12.77	6.56	439.35	225.55
17年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	4%	0.4936	107.1	249.79	68.90	56.71	375.40	185.31	35.00	7.53	5.48	48.01	23.70	12.67	6.25	436.08	215.26
18年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	4%	0.4746	107.1	247.47	68.90	56.23	372.60	176.85	34.67	7.53	5.44	47.63	22.61	12.57	5.97	432.81	205.43
19年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	4%	0.4564	107.1	245.14	68.90	55.76	369.80	168.77	34.34	7.53	5.39	47.26	21.57	12.47	5.69	429.54	196.04
20年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	4%	0.4388	107.1	242.82	68.90	55.28	367.00	161.05	34.02	7.53	5.34	46.89	20.58	12.38	5.43	426.27	187.06
21年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	4%	0.4220	107.1	240.49	68.90	54.81	364.20	153.68	33.69	7.53	5.30	46.52	19.63	12.28	5.18	423.00	178.49
22年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	4%	0.4057	107.1	238.16	68.90	54.33	361.40	146.63	33.37	7.53	5.25	46.15	18.72	12.18	4.94	419.73	170.30
23年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	4%	0.3901	107.1	235.84	68.91	53.86	358.60	139.90	33.04	7.53	5.21	45.78	17.86	12.08	4.71	416.46	162.47
24年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	4%	0.3751	107.1	233.51	68.91	53.38	355.80	133.47	32.71	7.53	5.16	45.40	17.03	11.98	4.50	413.19	154.99
25年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	4%	0.3607	107.1	231.19	68.91	52.91	353.00	127.32	32.39	7.53	5.11	45.03	16.24	11.89	4.29	409.92	147.85
26年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	4%	0.3468	107.1	228.86	68.91	52.43	350.20	121.46	32.06	7.53	5.07	44.66	15.49	11.79	4.09	406.65	141.03
27年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	4%	0.3335	107.1	226.53	68.91	51.96	347.40	115.85	31.74	7.53	5.02	44.29	14.77	11.69	3.90	403.38	134.52
28年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	4%	0.3207	107.1	224.21	68.92	51.48	344.60	110.50	31.41	7.53	4.98	43.92	14.08	11.59	3.72	400.11	128.30
29年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	4%	0.3083	107.1	221.88	68.92	51.01	341.80	105.38	31.08	7.53	4.93	43.55	13.43	11.49	3.54	396.84	122.35
30年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	4%	0.2965	107.1	219.55	68.92	50.53	339.01	100.50	30.76	7.53	4.88	43.18	12.80	11.39	3.38	393.57	116.68
31年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	4%	0.2851	107.1	217.23	68.92	50.06	336.21	95.84	30.43	7.53	4.84	42.80	12.20	11.30	3.22	390.31	111.26
32年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	4%	0.2741	107.1	214.90	68.92	49.58	333.41	91.38	30.11	7.53	4.79	42.43	11.63	11.20	3.07	387.04	106.08
33年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	4%	0.2636	107.1	212.58	68.92	49.11	330.61	87.13	29.78	7.53	4.75	42.06	11.09	11.10	2.93	383.77	101.14
34年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	4%	0.2534	107.1	210.25	68.93	48.63	327.81	83.07	29.46	7.53	4.70	41.69	10.56	11.00	2.79	380.50	96.42
35年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	4%	0.2437	107.1	207.92	68.93	48.16	325.01	79.19	29.13	7.53	4.65	41.32	10.07	10.90	2.66	377.23	91.92
36年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	4%	0.2343	107.1	205.60	68.93	47.68	322.21	75.49	28.80	7.53	4.61	40.95	9.59	10.81	2.53	373.96	87.62
37年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	4%	0.2253	107.1	203.27	68.93	47.21	319.41	71.96	28.48	7.53	4.56	40.57	9.14	10.71	2.41	370.69	83.51
38年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	4%	0.2166	107.1	200.95	68.93	46.73	316.61	68.58	28.15	7.53	4.52	40.20	8.71	10.61	2.30	367.42	79.59
39年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	4%	0.2083	107.1	198.62	68.93	46.26	313.81	65.36	27.83	7.53	4.47	39.83	8.30	10.51	2.19	364.15	75.85
40年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	4%	0.2003	107.1	196.29	68.94	45.78	311.01	62.29	27.50	7.53	4.42	39.46	7.90	10.41	2.09	360.88	72.28
41年目	R 49	0.98																				

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

【参考：社会的割引率2%】

年次	年度 (基準年)	総走行台枠の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
R 7					(A)																	
供用開始年次	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	2%	0.9804	107.1	14.99	2.40	3.20	20.60	20.19	2.01	0.19	0.24	2.44	2.39	0.66	0.64	23.70	23.23
1年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	2%	0.9612	107.1	14.92	2.42	3.15	20.49	19.69	2.00	0.19	0.24	2.43	2.34	0.65	0.63	23.57	22.66
2年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	2%	0.9423	107.1	14.85	2.44	3.09	20.38	19.21	1.99	0.20	0.24	2.42	2.28	0.65	0.61	23.45	22.10
3年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	2%	0.9238	107.1	14.78	2.46	3.04	20.28	18.73	1.98	0.20	0.23	2.41	2.22	0.65	0.60	23.33	21.55
供用開始(4年目)	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	2%	0.9057	107.1	23.94	4.32	5.73	33.99	30.78	2.75	0.31	0.37	3.43	3.11	0.69	0.62	38.10	34.51
供用開始(5年目)	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	2%	0.8880	107.1	36.00	7.25	9.21	52.47	46.59	5.97	1.03	0.96	7.97	7.08	1.95	1.73	62.39	55.40
供用開始(6年目)	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	2%	0.8706	107.1	141.71	33.04	32.34	207.09	180.28	20.21	4.42	3.29	27.92	24.31	5.60	4.88	240.61	209.46
供用開始(7年目)	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	2%	0.8535	107.1	149.86	35.06	34.46	219.39	187.24	22.69	4.91	3.80	31.39	26.79	6.46	5.52	257.24	219.56
供用開始(8年目)	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	2%	0.8368	107.1	158.68	38.74	36.96	234.37	196.11	24.30	5.20	3.78	33.27	27.84	8.39	7.02	276.04	230.98
供用開始(9年目)	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	2%	0.8203	107.1	257.61	61.14	58.57	377.32	309.54	35.81	6.47	5.27	47.55	39.01	12.66	10.38	437.53	358.93
完成供用年次	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	2%	0.8043	107.1	262.22	67.37	61.24	390.83	314.33	36.74	7.36	5.92	50.02	40.23	13.23	10.64	454.08	365.20
11年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	2%	0.7885	107.1	260.86	67.75	60.46	389.07	306.78	36.55	7.40	5.84	49.79	39.26	13.17	10.38	452.03	356.43
12年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	2%	0.7730	107.1	259.50	68.13	59.69	387.31	299.41	36.35	7.45	5.77	49.57	38.32	13.10	10.13	449.98	347.85
13年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	2%	0.7579	107.1	258.13	68.51	58.91	385.56	292.20	36.16	7.49	5.69	49.35	37.40	13.03	9.88	447.93	339.48
14年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	2%	0.7430	107.1	256.77	68.89	58.13	383.80	285.17	35.97	7.53	5.62	49.12	36.50	12.96	9.63	445.88	331.30
15年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	2%	0.7284	107.1	254.45	68.89	57.66	381.00	277.54	35.65	7.53	5.57	48.75	35.51	12.87	9.37	442.61	322.42
16年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	2%	0.7142	107.1	252.12	68.89	57.18	378.20	270.10	35.32	7.53	5.53	48.38	34.55	12.77	9.12	439.35	313.76
17年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	2%	0.7002	107.1	249.79	68.90	56.71	375.40	262.84	35.00	7.53	5.48	48.01	33.61	12.67	8.87	436.08	305.32
18年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	2%	0.6864	107.1	247.47	68.90	56.23	372.60	255.76	34.67	7.53	5.44	47.63	32.70	12.57	8.63	432.81	297.09
19年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	2%	0.6730	107.1	245.14	68.90	55.76	369.80	248.86	34.34	7.53	5.39	47.26	31.81	12.47	8.39	429.54	289.07
20年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	2%	0.6598	107.1	242.82	68.90	55.28	367.00	242.14	34.02	7.53	5.34	46.89	30.94	12.38	8.17	426.27	281.24
21年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	2%	0.6468	107.1	240.49	68.90	54.81	364.20	235.58	33.69	7.53	5.30	46.52	30.09	12.28	7.94	423.00	273.61
22年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	2%	0.6342	107.1	238.16	68.90	54.33	361.40	229.18	33.37	7.53	5.25	46.15	29.27	12.18	7.72	419.73	266.17
23年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	2%	0.6217	107.1	235.84	68.91	53.86	358.60	222.95	33.04	7.53	5.21	45.78	28.46	12.08	7.51	416.46	258.92
24年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	2%	0.6095	107.1	233.51	68.91	53.38	355.80	216.87	32.71	7.53	5.16	45.40	27.68	11.98	7.30	413.19	251.85
25年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	2%	0.5976	107.1	231.19	68.91	52.91	353.00	210.95	32.39	7.53	5.11	45.03	26.91	11.89	7.10	409.92	244.96
26年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	2%	0.5859	107.1	228.86	68.91	52.43	350.20	205.17	32.06	7.53	5.07	44.66	26.17	11.79	6.91	406.65	238.24
27年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	2%	0.5744	107.1	226.53	68.91	51.96	347.40	199.54	31.74	7.53	5.02	44.29	25.44	11.69	6.71	403.38	231.69
28年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	2%	0.5631	107.1	224.21	68.92	51.48	344.60	194.05	31.41	7.53	4.98	43.92	24.73	11.59	6.53	400.11	225.31
29年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	2%	0.5521	107.1	221.88	68.92	51.01	341.80	188.70	31.08	7.53	4.93	43.55	24.04	11.49	6.34	396.84	219.09
30年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	2%	0.5412	107.1	219.55	68.92	50.53	339.01	183.49	30.76	7.53	4.88	43.18	23.37	11.39	6.17	393.57	213.02
31年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	2%	0.5306	107.1	217.23	68.92	50.06	336.21	178.40	30.43	7.53	4.84	42.80	22.71	11.30	5.99	390.31	207.11
32年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	2%	0.5202	107.1	214.90	68.92	49.58	333.41	173.45	30.11	7.53	4.79	42.43	22.07	11.20	5.83	387.04	201.35
33年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	2%	0.5100	107.1	212.58	68.92	49.11	330.61	168.62	29.78	7.53	4.75	42.06	21.45	11.10	5.66	383.77	195.73
34年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	2%	0.5000	107.1	210.25	68.93	48.63	327.81	163.91	29.46	7.53	4.70	41.69	20.85	11.00	5.50	380.50	190.26
35年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	2%	0.4902	107.1	207.92	68.93	48.16	325.01	159.33	29.13	7.53	4.65	41.32	20.25	10.90	5.35	377.23	184.93
36年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	2%	0.4806	107.1	205.60	68.93	47.68	322.21	154.86	28.80	7.53	4.61	40.95	19.68	10.81	5.19	373.96	179.73
37年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	2%	0.4712	107.1	203.27	68.93	47.21	319.41	150.50	28.48	7.53	4.56	40.57	19.12	10.71	5.05	370.69	174.66
38年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	2%	0.4619	107.1	200.95	68.93	46.73	316.61	146.26	28.15	7.53	4.52	40.20	18.57	10.61	4.90	367.42	169.73
39年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	2%	0.4529	107.1	198.62	68.93	46.26	313.81	142.12	27.83	7.53	4.47	39.83	18.04	10.51	4.76	364.15	164.92
40年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	2%	0.4440	107.1	196.29	68.94	45.78	311.01	138.									

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：徳島JCT～高知JCT

【参考：社会的割引率1%】

年次	年度 (基準年)	総走行台枠の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 7	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	1%	0.9901	107.1	14.99	2.40	3.20	20.60	20.39	2.01	0.19	0.24	2.44	2.42	0.66	0.65	23.70	23.46
1年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	1%	0.9803	107.1	14.92	2.42	3.15	20.49	20.09	2.00	0.19	0.24	2.43	2.38	0.65	0.64	23.57	23.11
2年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	1%	0.9706	107.1	14.85	2.44	3.09	20.38	19.78	1.99	0.20	0.24	2.42	2.35	0.65	0.63	23.45	22.76
3年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	1%	0.9610	107.1	14.78	2.46	3.04	20.28	19.48	1.98	0.20	0.23	2.41	2.31	0.65	0.62	23.33	22.42
供用開始(4年目)	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	1%	0.9515	107.1	23.94	4.32	5.73	33.99	32.34	2.75	0.31	0.37	3.43	3.26	0.69	0.65	38.10	36.25
供用開始(5年目)	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	1%	0.9420	107.1	36.00	7.25	9.21	52.47	49.43	5.97	1.03	0.96	7.97	7.51	1.95	1.84	62.39	58.77
供用開始(6年目)	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	1%	0.9327	107.1	141.71	33.04	32.34	207.09	193.15	20.21	4.42	3.29	27.92	26.04	5.60	5.22	240.61	224.42
供用開始(7年目)	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	1%	0.9235	107.1	149.86	35.06	34.46	219.39	202.60	22.69	4.91	3.80	31.39	28.99	6.46	5.97	257.24	237.56
供用開始(8年目)	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	1%	0.9143	107.1	158.68	38.74	36.96	234.37	214.30	24.30	5.20	3.78	33.27	30.42	8.39	7.67	276.04	252.39
供用開始(9年目)	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	1%	0.9053	107.1	257.61	61.14	58.57	377.32	341.58	35.81	6.47	5.27	47.55	43.05	12.66	11.46	437.53	396.09
完成供用年次	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	1%	0.8963	107.1	262.22	67.37	61.24	390.83	350.31	36.74	7.36	5.92	50.02	44.83	13.23	11.86	454.08	407.01
11年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	1%	0.8874	107.1	260.86	67.75	60.46	389.07	345.28	36.55	7.40	5.84	49.79	44.19	13.17	11.68	452.03	401.16
12年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	1%	0.8787	107.1	259.50	68.13	59.69	387.31	340.32	36.35	7.45	5.77	49.57	43.56	13.10	11.51	449.98	395.38
13年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	1%	0.8700	107.1	258.13	68.51	58.91	385.56	335.42	36.16	7.49	5.69	49.35	42.93	13.03	11.34	447.93	389.69
14年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	1%	0.8613	107.1	256.77	68.89	58.13	383.80	330.58	35.97	7.53	5.62	49.12	42.31	12.96	11.17	445.88	384.06
15年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	1%	0.8528	107.1	254.45	68.89	57.66	381.00	324.92	35.65	7.53	5.57	48.75	41.57	12.87	10.97	442.61	377.47
16年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	1%	0.8444	107.1	252.12	68.89	57.18	378.20	319.34	35.32	7.53	5.53	48.38	40.85	12.77	10.78	439.35	370.97
17年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	1%	0.8360	107.1	249.79	68.90	56.71	375.40	313.84	35.00	7.53	5.48	48.01	40.13	12.67	10.59	436.08	364.57
18年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	1%	0.8277	107.1	247.47	68.90	56.23	372.60	308.42	34.67	7.53	5.44	47.63	39.43	12.57	10.41	432.81	358.25
19年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	1%	0.8195	107.1	245.14	68.90	55.76	369.80	303.07	34.34	7.53	5.39	47.26	38.73	12.47	10.22	429.54	352.02
20年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	1%	0.8114	107.1	242.82	68.90	55.28	367.00	297.80	34.02	7.53	5.34	46.89	38.05	12.38	10.04	426.27	345.89
21年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	1%	0.8034	107.1	240.49	68.90	54.81	364.20	292.60	33.69	7.53	5.30	46.52	37.37	12.28	9.86	423.00	339.84
22年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	1%	0.7954	107.1	238.16	68.90	54.33	361.40	287.47	33.37	7.53	5.25	46.15	36.71	12.18	9.69	419.73	333.87
23年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	1%	0.7876	107.1	235.84	68.91	53.86	358.60	282.42	33.04	7.53	5.21	45.78	36.05	12.08	9.51	416.46	327.99
24年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	1%	0.7798	107.1	233.51	68.91	53.38	355.80	277.44	32.71	7.53	5.16	45.40	35.41	11.98	9.34	413.19	322.19
25年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	1%	0.7720	107.1	231.19	68.91	52.91	353.00	272.54	32.39	7.53	5.11	45.03	34.77	11.89	9.18	409.92	316.48
26年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	1%	0.7644	107.1	228.86	68.91	52.43	350.20	267.70	32.06	7.53	5.07	44.66	34.14	11.79	9.01	406.65	310.85
27年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	1%	0.7568	107.1	226.53	68.91	51.96	347.40	262.93	31.74	7.53	5.02	44.29	33.52	11.69	8.85	403.38	305.29
28年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	1%	0.7493	107.1	224.21	68.92	51.48	344.60	258.23	31.41	7.53	4.98	43.92	32.91	11.59	8.69	400.11	299.82
29年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	1%	0.7419	107.1	221.88	68.92	51.01	341.80	253.59	31.08	7.53	4.93	43.55	32.31	11.49	8.53	396.84	294.43
30年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	1%	0.7346	107.1	219.55	68.92	50.53	339.01	249.03	30.76	7.53	4.88	43.18	31.72	11.39	8.37	393.57	289.11
31年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	1%	0.7273	107.1	217.23	68.92	50.06	336.21	244.52	30.43	7.53	4.84	42.80	31.13	11.30	8.22	390.31	283.87
32年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	1%	0.7201	107.1	214.90	68.92	49.58	333.41	240.09	30.11	7.53	4.79	42.43	30.56	11.20	8.06	387.04	278.71
33年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	1%	0.7130	107.1	212.58	68.92	49.11	330.61	235.71	29.78	7.53	4.75	42.06	29.99	11.10	7.91	383.77	273.62
34年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	1%	0.7059	107.1	210.25	68.93	48.63	327.81	231.40	29.46	7.53	4.70	41.69	29.43	11.00	7.77	380.50	268.60
35年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	1%	0.6989	107.1	207.92	68.93	48.16	325.01	227.16	29.13	7.53	4.65	41.32	28.88	10.90	7.62	377.23	263.65
36年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	1%	0.6920	107.1	205.60	68.93	47.68	322.21	222.97	28.80	7.53	4.61	40.95	28.33	10.81	7.48	373.96	258.78
37年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	1%	0.6852	107.1	203.27	68.93	47.21	319.41	218.84	28.48	7.53	4.56	40.57	27.80	10.71	7.34	370.69	253.98
38年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	1%	0.6784	107.1	200.95	68.93	46.73	316.61	214.78	28.15	7.53	4.52	40.20	27.27	10.61	7.20	367.42	249.25
39年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	1%	0.6717	107.1	198.62	68.93	46.26	313.81	210.77	27.83	7.53	4.47	39.83	26.75	10.51	7.06	364.15	244.58
40年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	1%	0.6650	107.1	196.29	68.94	45.78	311.01	206.82	27.50	7.53	4.42	39.46	26.24				

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P ・その他の別
一般国道55号	南国安芸道路	L=12. 5km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17, 300～26, 800	4	四国地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和7年度			
単純合計	667億円	175億円		842億円
うち残事業分	139億円	97億円		236億円
基準年における 現在価値 (C)	1, 044億円	112億円		1, 155億円
うち残事業分	126億円	36億円		162億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和7年度			
供用年	平成23年度、平成25年度、平成26年度、令和7年度 令和12年度			
単年便益 (初年便益)	40億円	2.9億円	1.2億円	44億円
基準年における 現在価値 (B)	3,318億円	371億円	110億円	3,799億円
うち残事業分	175億円	-9.0億円	1.2億円	167億円

③結果

【事業全体】

費用便益比 (B / C)	3.3 [4%]	[参考] 3.9 [2%]	[参考] 4.3 [1%]
経済的純現在価値 (B - C)	2,644億円 [4%]	[参考] 3,258億円 [2%]	[参考] 3,689億円 [1%]
経済的内部収益率 (E I R R)	15.7%		

※〔 〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比 (B / C)	1.03 [4%]	[参考] 1.4 [2%]	[参考] 1.6 [1%]
経済的純現在価値 (B - C)	5億円 [4%]	[参考] 68億円 [2%]	[参考] 119億円 [1%]
経済的内部収益率 (E I R R)	4.2%		

※〔 〕内は社会的割引率

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	17,300～26,800	±10%	3.3～3.3
事業費	667億円	±10%	3.3～3.3
事業期間	31年	±20%	3.3～3.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	17,300～26,800	±10%	0.8～1.4
事業費	139億円	±10%	0.96～1.1
事業期間	4年	±20%	0.99～1.03

交通状況の変化

【事業全体】

様式－3①

事業名：南国安芸道路

(推計時点 R22年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔南国安芸道路〕 : 12.5km		交通量※ ¹	[台/日]	22,000	
		走行時間※ ²	[分]	9	
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	145.81	
②主な周辺道路※ ⁴	国道55号 (現道) : 13.1km	交通量	[台/日]	25,500	6,000
		走行時間	[分]	30	18
		走行時間費用	[億円/年]	416.90	291.69
	国道55号 : 6.0km	交通量	[台/日]	24,500	22,900
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	251.06	246.94
	(主) 春 野赤岡線 : 3.6km	交通量	[台/日]	5,300	1,700
		走行時間	[分]	7	6
		走行時間費用	[億円/年]	31.52	25.91
	(一) 山 川野市線 : 1.1km	交通量	[台/日]	3,100	2,500
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	12.67	11.73
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 : 1072.0km		走行時間費用	[億円/年]	7,983.08	7,876.81

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1108.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	8,695.23	8,598.89	96.34

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

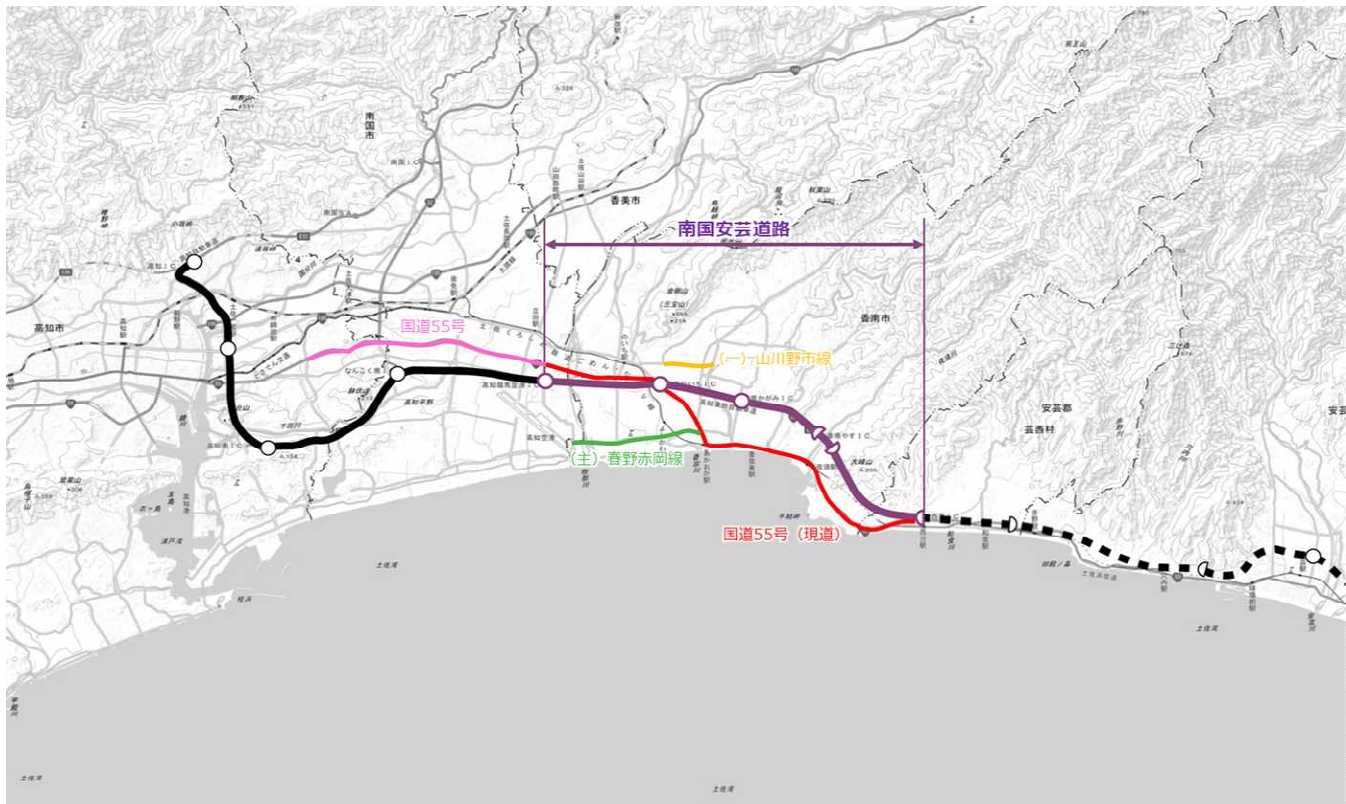

交通状況の変化

【残事業】

様式－3①

事業名：南国安芸道路

(推計時点 R22年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔南国安芸道路〕 : 12.5km		交通量※ ¹	[台/日]	20,600	22,000
		走行時間※ ²	[分]	12	9
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	48.31	41.27
②主な周辺道路※ ⁴	国道55号 (現道) : 13.1km	交通量	[台/日]	7,100	6,000
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	26.56	22.08
	国道55号 : 6.0km	交通量	[台/日]	23,000	22,900
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	46.66	46.61
	(主) 春 野赤岡線 : 3.6km	交通量	[台/日]	1,900	1,700
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	2.65	2.38
	(一) 山 川野市線 : 1.1km	交通量	[台/日]	2,600	2,500
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	1.70	1.57
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 : 1072.0km		走行時間費用	[億円/年]	1,576.51	1,578.40

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1108.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	1,702.39	1,692.31	10.08

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

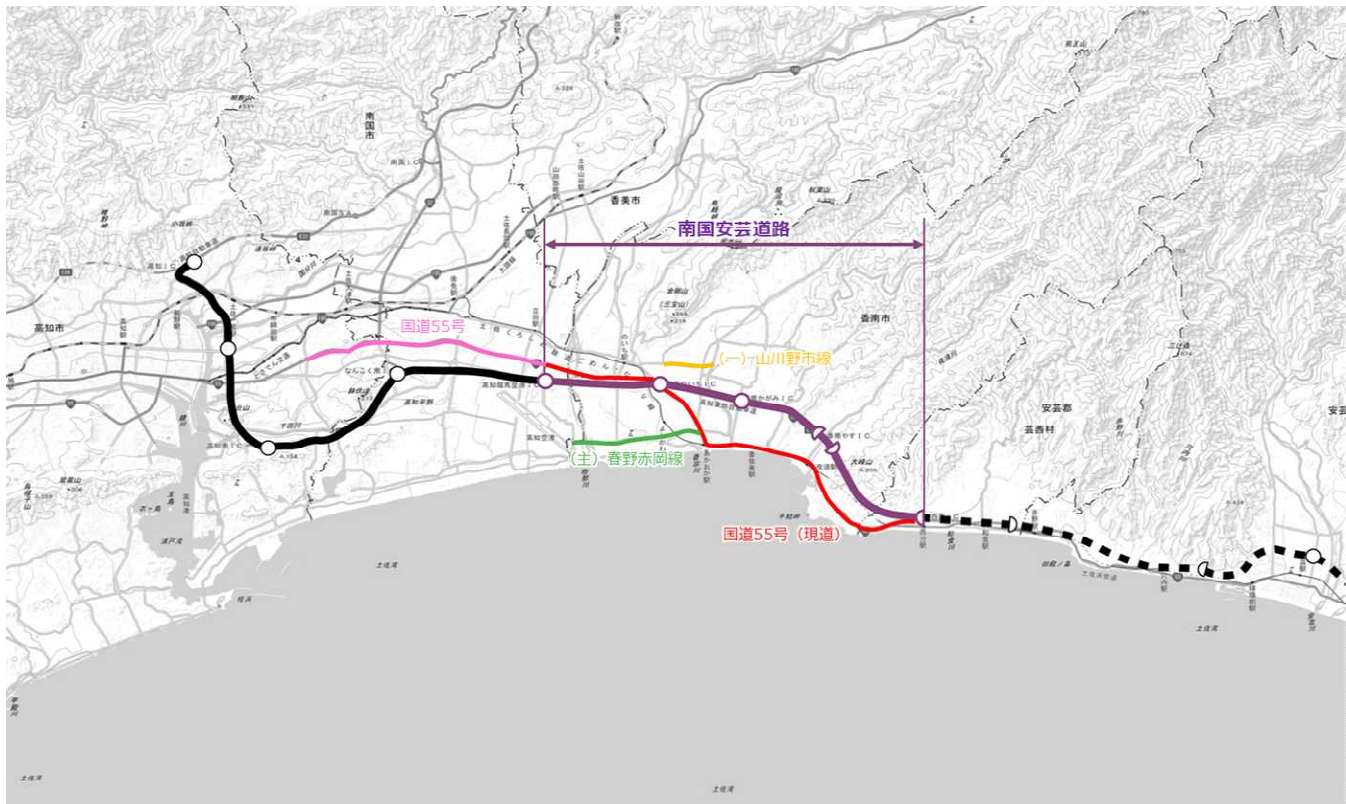

費用便益分析の条件

事業名：南国安芸道路

(2)

項目		チェック欄			
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7月8月 国土交通省 道路局 都市局)	☒			
	その他	☐			
分析の基本的事項	分析対象期間	50年			
	社会的割引率	4%			
	比較のための参考とすべき値	2%、1%			
	基準年次	令和7年度			
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)		
		複数時点での推計	☐		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載		
	推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐	
		その他()		☐	
				☐	
	開発交通量の 考慮	無		☒	
		有		☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載		
	配分交通量の 推計手法	Q－V式を用いた配分		☐	
		転換率式を用いた配分		☐	
		Q－V式と転換率式の併用による配分		☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐	
		簡易手法		☐	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である		☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない		☐
その他()					
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)					
その他()		☐			
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒		
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線交通容量(Qmin～Qmax) 内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の 生ずる「加重平均速度」を用いた。				
	最終配分の速度		☐		
	採用理由を記載				
	その他()		☐		

項目			チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	面的に考慮		□
			対象路線のみ考慮		□
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 		() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載		□
	冬期交通の影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載		() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■	
		その他 (			

[illegible]

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：南国安芸道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

事業名：南国安芸道路					単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
					0.39		12.5		4.93	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-12年目	H 11	4%	2.7725	112.0	0.95	2.52				
-11年目	H 12	4%	2.6658	110.7	0.95	2.46				
-10年目	H 13	4%	2.5633	109.4	3.81	9.56				
-9年目	H 14	4%	2.4647	107.6	2.43	5.96				
-8年目	H 15	4%	2.3699	106.1	3.52	8.43				
-7年目	H 16	4%	2.2788	105.0	8.37	19.45				
-6年目	H 17	4%	2.1911	103.7	23.50	53.19				
-5年目	H 18	4%	2.1068	103.0	40.11	87.86				
-4年目	H 19	4%	2.0258	102.1	44.21	93.94				
-3年目	H 20	4%	1.9479	101.6	30.59	62.82				
-2年目	H 21	4%	1.8730	100.3	24.28	48.56				
-1年目	H 22	4%	1.8009	98.6	42.41	82.96				
供用開始年次	H 23	4%	1.7317	97.2	38.60	73.65	0.79	1.51		
1年目	H 24	4%	1.6651	96.4	41.91	77.54	0.79	1.47		
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.6010	96.4	36.07	64.15	1.38	2.46		
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.5395	98.7	12.44	20.79	1.83	3.06		
4年目	H 27	4%	1.4802	100.2	11.73	18.56	1.83	2.90		
5年目	H 28	4%	1.4233	100.2	10.41	15.84	1.83	2.79		
6年目	H 29	4%	1.3686	100.5	13.82	20.16	1.83	2.67		
7年目	H 30	4%	1.3159	100.4	10.08	14.15	1.83	2.57		
8年目	R 1	4%	1.2653	101.2	12.28	16.44	1.83	2.45		
9年目	R 2	4%	1.2167	101.9	20.29	25.95	1.83	2.34		
10年目	R 3	4%	1.1699	101.8	26.33	32.40	1.83	2.25		
11年目	R 4	4%	1.1249	102.7	15.92	18.67	1.83	2.15		
12年目	R 5	4%	1.0816	107.1	34.21	37.00	1.83	1.98		
13年目	R 6	4%	1.0400	107.1	18.12	18.84	1.83	1.91		
供用開始(14年目)	R 7	4%	1.0000	107.1	1.18	1.18	2.54	2.54		
15年目	R 8	4%	0.9615	107.1	35.63	34.26	2.54	2.45		
16年目	R 9	4%	0.9246	107.1	35.63	32.94	2.54	2.35		
17年目	R 10	4%	0.8890	107.1	33.82	30.06	2.54	2.26		
18年目	R 11	4%	0.8548	107.1	33.81	28.90	2.54	2.18		
完成供用年次	R 12	4%	0.8219	107.1			4.48	3.68		
20年目	R 13	4%	0.7903	107.1			4.48	3.54		
21年目	R 14	4%	0.7599	107.1			4.48	3.40		
22年目	R 15	4%	0.7307	107.1			4.48	3.27		
23年目	R 16	4%	0.7026	107.1			4.48	3.15		
24年目	R 17	4%	0.6756	107.1			4.48	3.03		
25年目	R 18	4%	0.6496	107.1			4.48	2.91		
26年目	R 19	4%	0.6246	107.1			4.48	2.80		
27年目	R 20	4%	0.6006	107.1			4.48	2.69		
28年目	R 21	4%	0.5775	107.1			4.48	2.59		
29年目	R 22	4%	0.5553	107.1			4.48	2.49		
30年目	R 23	4%	0.5339	107.1			4.48	2.39		
31年目	R 24	4%	0.5134	107.1			4.48	2.30		
32年目	R 25	4%	0.4936	107.1			4.48	2.21		
33年目	R 26	4%	0.4746	107.1			4.48	2.13		
34年目	R 27	4%	0.4564	107.1			4.48	2.04		
35年目	R 28	4%	0.4388	107.1			4.48	1.97		
36年目	R 29	4%	0.4220	107.1			4.48	1.89		
37年目	R 30	4%	0.4057	107.1			4.48	1.82		
38年目	R 31	4%	0.3901	107.1			4.48	1.75		
39年目	R 32	4%	0.3751	107.1			4.48	1.68		
40年目	R 33	4%	0.3607	107.1			4.48	1.62		
41年目	R 34	4%	0.3468	107.1			4.48	1.55		
42年目	R 35	4%	0.3335	107.1			4.48	1.49		
43年目	R 36	4%	0.3207	107.1			4.48	1.44		
44年目	R 37	4%	0.3083	107.1			4.48	1.38		
45年目	R 38	4%	0.2965	107.1			4.48	1.33		
46年目	R 39	4%	0.2851	107.1			4.48	1.28		
47年目	R 40	4%	0.2741	107.1			4.48	1.23		
48年目	R 41	4%	0.2636	107.1			4.48	1.18		
49年目	R 42	4%	0.2534	107.1	-61.10	-15.48	4.48	1.14		
合 計					606.30	1,043.71	174.71	111.66	0.00	0.00
単純事業費計					667.40		174.71		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：南国安芸道路

〔参考：社会的割引率2%〕

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
									0.39	12.5
									4.93	
-12年目	H 11	4%	2.6669	112.0	0.95	2.43				
-11年目	H 12	4%	2.5643	110.7	0.95	2.36				
-10年目	H 13	4%	2.4657	109.4	3.81	9.20				
-9年目	H 14	4%	2.3708	107.6	2.43	5.73				
-8年目	H 15	4%	2.2796	106.1	3.52	8.11				
-7年目	H 16	4%	2.1920	105.0	8.37	18.71				
-6年目	H 17	4%	2.1077	103.7	23.50	51.16				
-5年目	H 18	4%	2.0266	103.0	40.11	84.51				
-4年目	H 19	4%	1.9486	102.1	44.21	90.36				
-3年目	H 20	4%	1.8737	101.6	30.59	60.43				
-2年目	H 21	4%	1.8016	100.3	24.28	46.71				
-1年目	H 22	4%	1.7323	98.6	42.41	79.80				
供用開始年次	H 23	4%	1.6657	97.2	38.60	70.84	0.79	1.46		
1年目	H 24	4%	1.6016	96.4	41.91	74.58	0.79	1.41		
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.5400	96.4	36.07	61.71	1.38	2.37		
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.4808	98.7	12.44	20.00	1.83	2.94		
4年目	H 27	4%	1.4239	100.2	11.73	17.85	1.83	2.79		
5年目	H 28	4%	1.3691	100.2	10.41	15.23	1.83	2.68		
6年目	H 29	4%	1.3164	100.5	13.82	19.39	1.83	2.57		
7年目	H 30	4%	1.2658	100.4	10.08	13.61	1.83	2.47		
8年目	R 1	4%	1.2171	101.2	12.28	15.82	1.83	2.36		
9年目	R 2	4%	1.1703	101.9	20.29	24.96	1.83	2.25		
10年目	R 3	4%	1.1253	101.8	26.33	31.17	1.83	2.17		
11年目	R 4	4%	1.0820	102.7	15.92	17.96	1.83	2.07		
12年目	R 5	2%	1.0404	107.1	34.21	35.59	1.83	1.91		
13年目	R 6	2%	1.0200	107.1	18.12	18.48	1.83	1.87		
供用開始(14年目)	R 7	2%	1.0000	107.1	1.18	1.18	2.54	2.54		
15年目	R 8	2%	0.9804	107.1	35.63	34.93	2.54	2.49		
16年目	R 9	2%	0.9612	107.1	35.63	34.24	2.54	2.45		
17年目	R 10	2%	0.9423	107.1	33.82	31.87	2.54	2.40		
18年目	R 11	2%	0.9238	107.1	33.81	31.23	2.54	2.35		
完成供用年次	R 12	2%	0.9057	107.1			4.48	4.06		
20年目	R 13	2%	0.8880	107.1			4.48	3.98		
21年目	R 14	2%	0.8706	107.1			4.48	3.90		
22年目	R 15	2%	0.8535	107.1			4.48	3.82		
23年目	R 16	2%	0.8368	107.1			4.48	3.75		
24年目	R 17	2%	0.8203	107.1			4.48	3.67		
25年目	R 18	2%	0.8043	107.1			4.48	3.60		
26年目	R 19	2%	0.7885	107.1			4.48	3.53		
27年目	R 20	2%	0.7730	107.1			4.48	3.46		
28年目	R 21	2%	0.7579	107.1			4.48	3.39		
29年目	R 22	2%	0.7430	107.1			4.48	3.33		
30年目	R 23	2%	0.7284	107.1			4.48	3.26		
31年目	R 24	2%	0.7142	107.1			4.48	3.20		
32年目	R 25	2%	0.7002	107.1			4.48	3.14		
33年目	R 26	2%	0.6864	107.1			4.48	3.07		
34年目	R 27	2%	0.6730	107.1			4.48	3.01		
35年目	R 28	2%	0.6598	107.1			4.48	2.96		
36年目	R 29	2%	0.6468	107.1			4.48	2.90		
37年目	R 30	2%	0.6342	107.1			4.48	2.84		
38年目	R 31	2%	0.6217	107.1			4.48	2.78		
39年目	R 32	2%	0.6095	107.1			4.48	2.73		
40年目	R 33	2%	0.5976	107.1			4.48	2.68		
41年目	R 34	2%	0.5859	107.1			4.48	2.62		
42年目	R 35	2%	0.5744	107.1			4.48	2.57		
43年目	R 36	2%	0.5631	107.1			4.48	2.52		
44年目	R 37	2%	0.5521	107.1			4.48	2.47		
45年目	R 38	2%	0.5412	107.1			4.48	2.42		
46年目	R 39	2%	0.5306	107.1			4.48	2.38		
47年目	R 40	2%	0.5202	107.1			4.48	2.33		
48年目	R 41	2%	0.5100	107.1			4.48	2.28		
49年目	R 42	2%	0.5000	107.1	-61.10	-30.55	4.48	2.24		
合 計					606.30	999.60	174.71	138.44	0.00	0.00
単純事業費計					667.40		174.71		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：南国安芸道路

〔参考：社会的割引率1%〕

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

事業名：南国安芸道路				【参考：社会的割引率1%】				単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
						0.39		12.5		4.93			
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)				
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値			
-12年目	H 11	4%	2.6148	112.0	0.95	2.38							
-11年目	H 12	4%	2.5143	110.7	0.95	2.32							
-10年目	H 13	4%	2.4176	109.4	3.81	9.02							
-9年目	H 14	4%	2.3246	107.6	2.43	5.62							
-8年目	H 15	4%	2.2352	106.1	3.52	7.95							
-7年目	H 16	4%	2.1492	105.0	8.37	18.34							
-6年目	H 17	4%	2.0665	103.7	23.50	50.16							
-5年目	H 18	4%	1.9871	103.0	40.11	82.86							
-4年目	H 19	4%	1.9106	102.1	44.21	88.60							
-3年目	H 20	4%	1.8371	101.6	30.59	59.25							
-2年目	H 21	4%	1.7665	100.3	24.28	45.80							
-1年目	H 22	4%	1.6985	98.6	42.41	78.24							
供用開始年次	H 23	4%	1.6332	97.2	38.60	69.46	0.79	1.43					
1年目	H 24	4%	1.5704	96.4	41.91	73.13	0.79	1.39					
供用開始(2年目)	H 25	4%	1.5100	96.4	36.07	60.50	1.38	2.32					
供用開始(3年目)	H 26	4%	1.4519	98.7	12.44	19.61	1.83	2.89					
4年目	H 27	4%	1.3961	100.2	11.73	17.51	1.83	2.73					
5年目	H 28	4%	1.3424	100.2	10.41	14.93	1.83	2.63					
6年目	H 29	4%	1.2908	100.5	13.82	19.01	1.83	2.52					
7年目	H 30	4%	1.2411	100.4	10.08	13.34	1.83	2.43					
8年目	R 1	4%	1.1934	101.2	12.28	15.51	1.83	2.31					
9年目	R 2	4%	1.1475	101.9	20.29	24.47	1.83	2.21					
10年目	R 3	4%	1.1033	101.8	26.33	30.56	1.83	2.13					
11年目	R 4	4%	1.0609	102.7	15.92	17.61	1.83	2.03					
12年目	R 5	1%	1.0201	107.1	34.21	34.90	1.83	1.87					
13年目	R 6	1%	1.0100	107.1	18.12	18.30	1.83	1.85					
供用開始(14年目)	R 7	1%	1.0000	107.1	1.18	1.18	2.54	2.54					
15年目	R 8	1%	0.9901	107.1	35.63	35.27	2.54	2.52					
16年目	R 9	1%	0.9803	107.1	35.63	34.93	2.54	2.49					
17年目	R 10	1%	0.9706	107.1	33.82	32.82	2.54	2.47					
18年目	R 11	1%	0.9610	107.1	33.81	32.49	2.54	2.45					
完成供用年次	R 12	1%	0.9515	107.1			4.48	4.26					
20年目	R 13	1%	0.9420	107.1			4.48	4.22					
21年目	R 14	1%	0.9327	107.1			4.48	4.18					
22年目	R 15	1%	0.9235	107.1			4.48	4.14					
23年目	R 16	1%	0.9143	107.1			4.48	4.10					
24年目	R 17	1%	0.9053	107.1			4.48	4.06					
25年目	R 18	1%	0.8963	107.1			4.48	4.01					
26年目	R 19	1%	0.8874	107.1			4.48	3.98					
27年目	R 20	1%	0.8787	107.1			4.48	3.94					
28年目	R 21	1%	0.8700	107.1			4.48	3.90					
29年目	R 22	1%	0.8613	107.1			4.48	3.86					
30年目	R 23	1%	0.8528	107.1			4.48	3.82					
31年目	R 24	1%	0.8444	107.1			4.48	3.78					
32年目	R 25	1%	0.8360	107.1			4.48	3.74					
33年目	R 26	1%	0.8277	107.1			4.48	3.71					
34年目	R 27	1%	0.8195	107.1			4.48	3.67					
35年目	R 28	1%	0.8114	107.1			4.48	3.63					
36年目	R 29	1%	0.8034	107.1			4.48	3.60					
37年目	R 30	1%	0.7954	107.1			4.48	3.56					
38年目	R 31	1%	0.7876	107.1			4.48	3.53					
39年目	R 32	1%	0.7798	107.1			4.48	3.49					
40年目	R 33	1%	0.7720	107.1			4.48	3.46					
41年目	R 34	1%	0.7644	107.1			4.48	3.42					
42年目	R 35	1%	0.7568	107.1			4.48	3.39					
43年目	R 36	1%	0.7493	107.1			4.48	3.36					
44年目	R 37	1%	0.7419	107.1			4.48	3.32					
45年目	R 38	1%	0.7346	107.1			4.48	3.29					
46年目	R 39	1%	0.7273	107.1			4.48	3.26					
47年目	R 40	1%	0.7201	107.1			4.48	3.23					
48年目	R 41	1%	0.7130	107.1			4.48	3.19					
49年目	R 42	1%	0.7059	107.1	-61.10	-43.13	4.48	3.16					
合 計					606.30	972.94	174.71	157.47	0.00		0.00		
単純事業費計					667.40		174.71		0.00				

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-4年目	R 8	4%	0.9615	107.1	35.63	34.26				
-3年目	R 9	4%	0.9246	107.1	35.63	32.94				
-2年目	R 10	4%	0.8890	107.1	33.82	30.06				
-1年目	R 11	4%	0.8548	107.1	33.81	28.90				
供用開始年次	R 12	4%	0.8219	107.1			1.93	1.59		
1年目	R 13	4%	0.7903	107.1			1.93	1.53		
2年目	R 14	4%	0.7599	107.1			1.93	1.47		
3年目	R 15	4%	0.7307	107.1			1.93	1.41		
4年目	R 16	4%	0.7026	107.1			1.93	1.36		
5年目	R 17	4%	0.6756	107.1			1.93	1.31		
6年目	R 18	4%	0.6496	107.1			1.93	1.26		
7年目	R 19	4%	0.6246	107.1			1.93	1.21		
8年目	R 20	4%	0.6006	107.1			1.93	1.16		
9年目	R 21	4%	0.5775	107.1			1.93	1.12		
10年目	R 22	4%	0.5553	107.1			1.93	1.07		
11年目	R 23	4%	0.5339	107.1			1.93	1.03		
12年目	R 24	4%	0.5134	107.1			1.93	0.99		
13年目	R 25	4%	0.4936	107.1			1.93	0.96		
14年目	R 26	4%	0.4746	107.1			1.93	0.92		
15年目	R 27	4%	0.4564	107.1			1.93	0.88		
16年目	R 28	4%	0.4388	107.1			1.93	0.85		
17年目	R 29	4%	0.4220	107.1			1.93	0.82		
18年目	R 30	4%	0.4057	107.1			1.93	0.78		
19年目	R 31	4%	0.3901	107.1			1.93	0.75		
20年目	R 32	4%	0.3751	107.1			1.93	0.73		
21年目	R 33	4%	0.3607	107.1			1.93	0.70		
22年目	R 34	4%	0.3468	107.1			1.93	0.67		
23年目	R 35	4%	0.3335	107.1			1.93	0.65		
24年目	R 36	4%	0.3207	107.1			1.93	0.62		
25年目	R 37	4%	0.3083	107.1			1.93	0.60		
26年目	R 38	4%	0.2965	107.1			1.93	0.57		
27年目	R 39	4%	0.2851	107.1			1.93	0.55		
28年目	R 40	4%	0.2741	107.1			1.93	0.53		
29年目	R 41	4%	0.2636	107.1			1.93	0.51		
30年目	R 42	4%	0.2534	107.1			1.93	0.49		
31年目	R 43	4%	0.2437	107.1			1.93	0.47		
32年目	R 44	4%	0.2343	107.1			1.93	0.45		
33年目	R 45	4%	0.2253	107.1			1.93	0.44		
34年目	R 46	4%	0.2166	107.1			1.93	0.42		
35年目	R 47	4%	0.2083	107.1			1.93	0.40		
36年目	R 48	4%	0.2003	107.1			1.93	0.39		
37年目	R 49	4%	0.1926	107.1			1.93	0.37		
38年目	R 50	4%	0.1852	107.1			1.93	0.36		
39年目	R 51	4%	0.1780	107.1			1.93	0.34		
40年目	R 52	4%	0.1712	107.1			1.93	0.33		
41年目	R 53	4%	0.1646	107.1			1.93	0.32		
42年目	R 54	4%	0.1583	107.1			1.93	0.31		
43年目	R 55	4%	0.1522	107.1			1.93	0.29		
44年目	R 56	4%	0.1463	107.1			1.93	0.28		
45年目	R 57	4%	0.1407	107.1			1.93	0.27		
46年目	R 58	4%	0.1353	107.1			1.93	0.26		
47年目	R 59	4%	0.1301	107.1			1.93	0.25		
48年目	R 60	4%	0.1251	107.1			1.93	0.24		
49年目	R 61	4%	0.1203	107.1			1.93	0.23		
合 計					138.88	126.16	96.74	35.51	0.00	0.00
単純事業費計					138.88		96.74		0.00	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 （投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

〔参考：社会的割引率2%〕

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-4年目	R 8	2%	0.9804	107.1	35.63	34.93				
-3年目	R 9	2%	0.9612	107.1	35.63	34.24				
-2年目	R 10	2%	0.9423	107.1	33.82	31.87				
-1年目	R 11	2%	0.9238	107.1	33.81	31.23				
供用開始年次	R 12	2%	0.9057	107.1			1.93	1.75		
1年目	R 13	2%	0.8880	107.1			1.93	1.72		
2年目	R 14	2%	0.8706	107.1			1.93	1.68		
3年目	R 15	2%	0.8535	107.1			1.93	1.65		
4年目	R 16	2%	0.8368	107.1			1.93	1.62		
5年目	R 17	2%	0.8203	107.1			1.93	1.59		
6年目	R 18	2%	0.8043	107.1			1.93	1.56		
7年目	R 19	2%	0.7885	107.1			1.93	1.53		
8年目	R 20	2%	0.7730	107.1			1.93	1.50		
9年目	R 21	2%	0.7579	107.1			1.93	1.47		
10年目	R 22	2%	0.7430	107.1			1.93	1.44		
11年目	R 23	2%	0.7284	107.1			1.93	1.41		
12年目	R 24	2%	0.7142	107.1			1.93	1.38		
13年目	R 25	2%	0.7002	107.1			1.93	1.35		
14年目	R 26	2%	0.6864	107.1			1.93	1.33		
15年目	R 27	2%	0.6730	107.1			1.93	1.30		
16年目	R 28	2%	0.6598	107.1			1.93	1.28		
17年目	R 29	2%	0.6468	107.1			1.93	1.25		
18年目	R 30	2%	0.6342	107.1			1.93	1.23		
19年目	R 31	2%	0.6217	107.1			1.93	1.20		
20年目	R 32	2%	0.6095	107.1			1.93	1.18		
21年目	R 33	2%	0.5976	107.1			1.93	1.16		
22年目	R 34	2%	0.5859	107.1			1.93	1.13		
23年目	R 35	2%	0.5744	107.1			1.93	1.11		
24年目	R 36	2%	0.5631	107.1			1.93	1.09		
25年目	R 37	2%	0.5521	107.1			1.93	1.07		
26年目	R 38	2%	0.5412	107.1			1.93	1.05		
27年目	R 39	2%	0.5306	107.1			1.93	1.03		
28年目	R 40	2%	0.5202	107.1			1.93	1.01		
29年目	R 41	2%	0.5100	107.1			1.93	0.99		
30年目	R 42	2%	0.5000	107.1			1.93	0.97		
31年目	R 43	2%	0.4902	107.1			1.93	0.95		
32年目	R 44	2%	0.4806	107.1			1.93	0.93		
33年目	R 45	2%	0.4712	107.1			1.93	0.91		
34年目	R 46	2%	0.4619	107.1			1.93	0.89		
35年目	R 47	2%	0.4529	107.1			1.93	0.88		
36年目	R 48	2%	0.4440	107.1			1.93	0.86		
37年目	R 49	2%	0.4353	107.1			1.93	0.84		
38年目	R 50	2%	0.4268	107.1			1.93	0.83		
39年目	R 51	2%	0.4184	107.1			1.93	0.81		
40年目	R 52	2%	0.4102	107.1			1.93	0.79		
41年目	R 53	2%	0.4022	107.1			1.93	0.78		
42年目	R 54	2%	0.3943	107.1			1.93	0.76		
43年目	R 55	2%	0.3865	107.1			1.93	0.75		
44年目	R 56	2%	0.3790	107.1			1.93	0.73		
45年目	R 57	2%	0.3715	107.1			1.93	0.72		
46年目	R 58	2%	0.3642	107.1			1.93	0.70		
47年目	R 59	2%	0.3571	107.1			1.93	0.69		
48年目	R 60	2%	0.3501	107.1			1.93	0.68		
49年目	R 61	2%	0.3432	107.1			1.93	0.66		
合 計					138.88	132.27	96.74	56.19	0.00	0.00
単純事業費計					138.88		96.74		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

〔参考：社会的割引率1%〕

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-4年目	R 8	1%	0.9901	107.1	35.63	35.27				
-3年目	R 9	1%	0.9803	107.1	35.63	34.93				
-2年目	R 10	1%	0.9706	107.1	33.82	32.82				
-1年目	R 11	1%	0.9610	107.1	33.81	32.49				
供用開始年次	R 12	1%	0.9515	107.1			1.93	1.84		
1年目	R 13	1%	0.9420	107.1			1.93	1.82		
2年目	R 14	1%	0.9327	107.1			1.93	1.80		
3年目	R 15	1%	0.9235	107.1			1.93	1.79		
4年目	R 16	1%	0.9143	107.1			1.93	1.77		
5年目	R 17	1%	0.9053	107.1			1.93	1.75		
6年目	R 18	1%	0.8963	107.1			1.93	1.73		
7年目	R 19	1%	0.8874	107.1			1.93	1.72		
8年目	R 20	1%	0.8787	107.1			1.93	1.70		
9年目	R 21	1%	0.8700	107.1			1.93	1.68		
10年目	R 22	1%	0.8613	107.1			1.93	1.67		
11年目	R 23	1%	0.8528	107.1			1.93	1.65		
12年目	R 24	1%	0.8444	107.1			1.93	1.63		
13年目	R 25	1%	0.8360	107.1			1.93	1.62		
14年目	R 26	1%	0.8277	107.1			1.93	1.60		
15年目	R 27	1%	0.8195	107.1			1.93	1.59		
16年目	R 28	1%	0.8114	107.1			1.93	1.57		
17年目	R 29	1%	0.8034	107.1			1.93	1.55		
18年目	R 30	1%	0.7954	107.1			1.93	1.54		
19年目	R 31	1%	0.7876	107.1			1.93	1.52		
20年目	R 32	1%	0.7798	107.1			1.93	1.51		
21年目	R 33	1%	0.7720	107.1			1.93	1.49		
22年目	R 34	1%	0.7644	107.1			1.93	1.48		
23年目	R 35	1%	0.7568	107.1			1.93	1.46		
24年目	R 36	1%	0.7493	107.1			1.93	1.45		
25年目	R 37	1%	0.7419	107.1			1.93	1.44		
26年目	R 38	1%	0.7346	107.1			1.93	1.42		
27年目	R 39	1%	0.7273	107.1			1.93	1.41		
28年目	R 40	1%	0.7201	107.1			1.93	1.39		
29年目	R 41	1%	0.7130	107.1			1.93	1.38		
30年目	R 42	1%	0.7059	107.1			1.93	1.37		
31年目	R 43	1%	0.6989	107.1			1.93	1.35		
32年目	R 44	1%	0.6920	107.1			1.93	1.34		
33年目	R 45	1%	0.6852	107.1			1.93	1.33		
34年目	R 46	1%	0.6784	107.1			1.93	1.31		
35年目	R 47	1%	0.6717	107.1			1.93	1.30		
36年目	R 48	1%	0.6650	107.1			1.93	1.29		
37年目	R 49	1%	0.6584	107.1			1.93	1.27		
38年目	R 50	1%	0.6519	107.1			1.93	1.26		
39年目	R 51	1%	0.6454	107.1			1.93	1.25		
40年目	R 52	1%	0.6391	107.1			1.93	1.24		
41年目	R 53	1%	0.6327	107.1			1.93	1.22		
42年目	R 54	1%	0.6265	107.1			1.93	1.21		
43年目	R 55	1%	0.6203	107.1			1.93	1.20		
44年目	R 56	1%	0.6141	107.1			1.93	1.19		
45年目	R 57	1%	0.6080	107.1			1.93	1.18		
46年目	R 58	1%	0.6020	107.1			1.93	1.16		
47年目	R 59	1%	0.5961	107.1			1.93	1.15		
48年目	R 60	1%	0.5902	107.1			1.93	1.14		
49年目	R 61	1%	0.5843	107.1			1.93	1.13		
合 計					138.88	135.51	96.74	72.86	0.00	0.00
単純事業費計					138.88		96.74		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

年次	年度 (基準年)	総走行台数の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 7	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.7317	97.2	26.61	4.76	8.56	39.93	76.18	2.47	0.14	0.30	2.91	5.56	1.19	2.28	44.04	84.02
1年目	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.6651	96.4	27.43	4.90	8.84	41.17	76.17	2.54	0.15	0.31	3.00	5.56	1.23	2.28	45.41	84.00
供用開始(3年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.6010	96.4	38.22	6.59	12.38	57.20	101.74	4.23	0.18	0.49	4.89	8.70	1.58	2.81	63.67	113.25
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.5395	98.7	56.24	9.29	17.70	83.24	139.05	7.81	0.58	1.26	9.65	16.12	2.71	4.53	95.60	159.69
4年目	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.4802	100.2	56.89	9.40	17.92	84.22	133.24	7.90	0.59	1.28	9.76	15.44	2.74	4.34	96.72	153.02
5年目	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.4233	100.2	56.64	9.47	17.66	83.78	127.45	7.86	0.59	1.26	9.71	14.78	2.73	4.15	96.22	146.38
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.3686	100.5	56.39	9.55	17.40	83.34	121.55	7.83	0.60	1.24	9.66	14.09	2.71	3.96	95.72	139.60
7年目	H 30	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.3159	100.4	56.14	9.63	17.14	82.91	116.38	7.79	0.60	1.22	9.62	13.50	2.70	3.79	95.22	133.66
8年目	R 1	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.2653	101.2	55.88	9.70	16.88	82.47	110.43	7.76	0.61	1.20	9.57	12.81	2.68	3.59	94.72	126.84
9年目	R 2	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.2167	101.9	55.63	9.78	16.62	82.03	104.90	7.72	0.61	1.18	9.52	12.17	2.67	3.41	94.22	120.48
10年目	R 3	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1699	101.8	55.38	9.86	16.36	81.60	100.43	7.69	0.62	1.16	9.47	11.65	2.65	3.27	93.72	115.35
11年目	R 4	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.1249	102.7	55.13	9.93	16.10	81.16	95.21	7.65	0.62	1.15	9.42	11.05	2.64	3.10	93.22	109.35
12年目	R 5	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	4%	1.0816	107.1	54.87	10.01	15.84	80.73	87.31	7.62	0.63	1.13	9.37	10.14	2.63	2.84	92.72	100.29
13年目	R 6	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	4%	1.0400	107.1	54.62	10.09	15.58	80.29	83.50	7.58	0.63	1.11	9.32	9.70	2.61	2.72	92.22	95.91
供用開始(14年目)	R 7	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	4%	1.0000	107.1	63.67	11.47	18.09	93.23	93.23	9.83	0.60	1.57	12.01	12.01	3.43	3.43	108.67	

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：南国安芸道路

【参考：社会的割引率2%】

年次	年度 (基準年)	総走行台枠の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	H 23	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.6657	97.2	26.61	4.76	8.56	39.93	73.28	2.47	0.14	0.30	2.91	5.35	1.19	2.19	44.04	80.82
1年目	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.6016	96.4	27.43	4.90	8.84	41.17	73.27	2.54	0.15	0.31	3.00	5.35	1.23	2.19	45.41	80.80
供用開始(2年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.5400	96.4	38.22	6.59	12.38	57.20	97.87	4.23	0.18	0.49	4.89	8.37	1.58	2.70	63.67	108.94
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.4808	98.7	56.24	9.29	17.70	83.24	133.75	7.81	0.58	1.26	9.65	15.50	2.71	4.35	95.60	153.61
4年目	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.4239	100.2	56.89	9.40	17.92	84.22	128.17	7.90	0.59	1.28	9.76	14.86	2.74	4.17	96.72	147.20
5年目	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.3691	100.2	56.64	9.47	17.66	83.78	122.60	7.86	0.59	1.26	9.71	14.21	2.73	3.99	96.22	140.80
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.3164	100.5	56.39	9.55	17.40	83.34	116.92	7.83	0.60	1.24	9.66	13.56	2.71	3.80	95.72	134.28
7年目	H 30	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.2658	100.4	56.14	9.63	17.14	82.91	111.95	7.79	0.60	1.22	9.62	12.98	2.70	3.64	95.22	128.57
8年目	R 1	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.2171	101.2	55.88	9.70	16.88	82.47	106.23	7.76	0.61	1.20	9.57	12.32	2.68	3.46	94.72	122.01
9年目	R 2	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.1703	101.9	55.63	9.78	16.62	82.03	100.90	7.72	0.61	1.18	9.52	11.71	2.67	3.28	94.22	115.89
10年目	R 3	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1253	101.8	55.38	9.86	16.36	81.60	96.60	7.69	0.62	1.16	9.47	11.21	2.65	3.14	93.72	110.95
11年目	R 4	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.0820	102.7	55.13	9.93	16.10	81.16	91.58	7.65	0.62	1.15	9.42	10.63	2.64	2.98	93.22	105.19
12年目	R 5	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	2%	1.0404	107.1	54.87	10.01	15.84	80.73	83.99	7.62	0.63	1.13	9.37	9.75	2.63	2.73	92.72	96.47
13年目	R 6	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	2%	1.0200	107.1	54.62	10.09	15.58	80.29	81.89	7.58	0.63	1.11	9.32	9.51	2.61	2.66	92.22	94.07
供用開始(14年目)	R 7	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	2%	1.0000	107.1	63.67	11.47	18.09	93.23	93.23	9.83	0.60	1.57	12.01	12.01	3.43	3.43	108.67	108.67
15年目	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	2%	0.9804	107.1	63.38	11.56	17.78	92.71	90.90	9.79	0.61	1.55	11.94	11.70	3.41	3.34	108.06	105.94
16年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	2%	0.9612	107.1	63.08	11.65	17.47	92.20	88.62	9.74	0.61	1.52	11.87	11.41	3.39	3.26	107.46	103.29
17年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	2%	0.9423	107.1	62.78	11.73	17.16	91.68	86.39	9.70	0.61	1.49	11.80	11.12	3.37	3.18	106.86	100.69
18年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	2%	0.9238	107.1	62.49	11.82	16.86	91.16	84.22	9.65	0.62	1.47	11.73	10.84	3.35	3.10	106.25	98.16
完成供用年次	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	2%	0.9057	107.1	69.46	13.43	18.33	101.21	91.67	9.59	0.31	1.26	11.16	10.11	3.41	3.09	115.79	104.87
20年目	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	2%	0.8880	107.1	69.11	13.50	18.11	100.73	89.44	9.54	0.31	1.24	11.10	9.86	3.39	3.01	115.22	102.31
21年目	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	2%	0.8706	107.1	68.76	13.58	17.90	100.24	87.26	9.50	0.32	1.23	11.04	9.61	3.37	2.94	114.65	99.81
22年目	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	2%	0.8535	107.1	68.41	13.66	17.68	99.75	85.14	9.45	0.32	1.21	10.98	9.37	3.36	2.87	114.09	97.37
23年目	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	2%	0.8368	107.1	68.06	13.74	17.47	99.26	83.06	9.40	0.32	1.20	10.92	9.14	3.34	2.80	113.52	94.99
24年目	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	2%	0.8203	107.1	67.71	13.82	17.25	98.78	81.03	9.35	0.32	1.18	10.86	8.91	3.32	2.73	112.96	92.66
25年目	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	2%	0.8043	107.1	67.36	13.90	17.03	98.29	79.05	9.30	0.32	1.17	10.80	8.68	3.31	2.66	112.39	90.39
26年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	2%	0.7885	107.1	67.01	13.97	16.82	97.80	77.12	9.25	0.32	1.15	10.73	8.46	3.29	2.59	111.83	88.17
27年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	2%	0.7730	107.1	66.66	14.05	16.60	97.31	75.23	9.21	0.33	1.14	10.67	8.25	3.27	2.53	111.26	86.01
28年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	2%	0.7579	107.1	66.31	14.13	16.39	96.83	73.38	9.16	0.33	1.12	10.61	8.04	3.26	2.47	110.70	83.89
29年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	2%	0.7430	107.1	65.96	14.21	16.17	96.34	71.58	9.11	0.33	1.11	10.55	7.84	3.24	2.41	110.13	81.83
30年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	2%	0.7284	107.1	65.36	14.21	16.04	95.61	69.65	9.03	0.33	1.10	10.46	7.62	3.22	2.34	109.28	79.61
31年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	2%	0.7142	107.1	64.76	14.21	15.91	94.88	67.76	8.94	0.33	1.09	10.37	7.40	3.19	2.28	108.44	77.44
32年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	2%	0.7002	107.1	64.17	14.21	15.77	94.15	65.92	8.86	0.33	1.08	10.28	7.19	3.17	2.22	107.59	75.33
33年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	2%	0.6864	107.1	63.57	14.21	15.64	93.42	64.13	8.78	0.33	1.07	10.18	6.99	3.14	2.16	106.75	73.28
34年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	2%	0.6730	107.1	62.97	14.21	15.51	92.69	62.38	8.70	0.33	1.06	10.09	6.79	3.12	2.10	105.90	71.27
35年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	2%	0.6598	107.1	62.37	14.21	15.38	91.96	60.68	8.61	0.33	1.06	10.00	6.60	3.09	2.04	105.06	69.31
36年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	2%	0.6468	107.1	61.78	14.21	15.24	91.23	59.01	8.53	0.33	1.05	9.91	6.41	3.07	1.98	104.21	67.41
37年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	2%	0.6342	107.1	61.18	14.21	15.11	90.51	57.39	8.45	0.33	1.04	9.82	6.23	3.04	1.93	103.37	65.55
38年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	2%	0.6217	107.1	60.58	14.21	14.98	89.78	55.82	8.37	0.33	1.03	9.73	6.05	3.02	1.88	102.52	63.74
39年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	2%	0.6095	107.1	59.98	14.21	14.85	89.05	54.28	8.28	0.33	1.02	9.63	5.87	2.99	1.83	101.68	61.97
40年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	2%	0.5976	107.1	59.39	14.21	14.72	88.32	52.78	8.20	0.33	1.01	9.54	5.70	2.97	1.77	100.83	60.25
41年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	2%	0.5859	107.1	58.79	14.21	14.58	87.59	51.31	8.12	0.33	1.00	9.45	5.54	2.95	1.73</		

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：南国安芸道路

【参考：社会的割引率1%】

年次	年度 (基準年)	総走行台枠の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	H 23	1.00577	1.00528	1.00694	1.00596	4%	1.6332	97.2	26.61	4.76	8.56	39.93	71.85	2.47	0.14	0.30	2.91	5.24	1.19	2.15	44.04	79.24
1年目	H 24	1.03103	1.03054	1.03220	1.03122	4%	1.5704	96.4	27.43	4.90	8.84	41.17	71.84	2.54	0.15	0.31	3.00	5.24	1.23	2.15	45.41	79.23
供用開始(2年目)	H 25	1.00858	1.00811	1.00970	1.00876	4%	1.5100	96.4	38.22	6.59	12.38	57.20	95.96	4.23	0.18	0.49	4.89	8.20	1.58	2.65	63.67	106.81
供用開始(3年目)	H 26	0.99961	0.99915	1.00069	0.99978	4%	1.4519	98.7	56.24	9.29	17.70	83.24	131.14	7.81	0.58	1.26	9.65	15.20	2.71	4.27	95.60	150.61
4年目	H 27	1.01157	1.01112	1.01264	1.01174	4%	1.3961	100.2	56.89	9.40	17.92	84.22	125.67	7.90	0.59	1.28	9.76	14.57	2.74	4.09	96.72	144.32
5年目	H 28	0.99556	1.00813	0.98549	0.99474	4%	1.3424	100.2	56.64	9.47	17.66	83.78	120.21	7.86	0.59	1.26	9.71	13.94	2.73	3.91	96.22	138.06
6年目	H 29	0.99554	1.00806	0.98528	0.99471	4%	1.2908	100.5	56.39	9.55	17.40	83.34	114.64	7.83	0.60	1.24	9.66	13.29	2.71	3.73	95.72	131.66
7年目	H 30	0.99552	1.00800	0.98506	0.99468	4%	1.2411	100.4	56.14	9.63	17.14	82.91	109.76	7.79	0.60	1.22	9.62	12.73	2.70	3.57	95.22	126.06
8年目	R 1	0.99550	1.00794	0.98483	0.99465	4%	1.1934	101.2	55.88	9.70	16.88	82.47	104.16	7.76	0.61	1.20	9.57	12.08	2.68	3.39	94.72	119.63
9年目	R 2	0.99548	1.00787	0.98460	0.99462	4%	1.1475	101.9	55.63	9.78	16.62	82.03	98.94	7.72	0.61	1.18	9.52	11.48	2.67	3.22	94.22	113.63
10年目	R 3	0.99546	1.00781	0.98436	0.99459	4%	1.1033	101.8	55.38	9.86	16.36	81.60	94.72	7.69	0.62	1.16	9.47	10.99	2.65	3.08	93.72	108.79
11年目	R 4	0.99544	1.00775	0.98411	0.99456	4%	1.0609	102.7	55.13	9.93	16.10	81.16	89.79	7.65	0.62	1.15	9.42	10.42	2.64	2.92	93.22	103.14
12年目	R 5	0.99542	1.00769	0.98385	0.99453	1%	1.0201	107.1	54.87	10.01	15.84	80.73	82.35	7.62	0.63	1.13	9.37	9.56	2.63	2.68	92.72	94.59
13年目	R 6	0.99540	1.00763	0.98359	0.99450	1%	1.0100	107.1	54.62	10.09	15.58	80.29	81.09	7.58	0.63	1.11	9.32	9.42	2.61	2.64	92.22	93.15
供用開始(14年目)	R 7	0.99538	1.00758	0.98331	0.99447	1%	1.0000	107.1	63.67	11.47	18.09	93.23	93.23	9.83	0.60	1.57	12.01	12.01	3.43	3.43	108.67	108.67
15年目	R 8	0.99535	1.00752	0.98303	0.99444	1%	0.9901	107.1	63.38	11.56	17.78	92.71	91.80	9.79	0.61	1.55	11.94	11.82	3.41	3.38	108.06	106.99
16年目	R 9	0.99533	1.00746	0.98274	0.99441	1%	0.9803	107.1	63.08	11.65	17.47	92.20	90.38	9.74	0.61	1.52	11.87	11.64	3.39	3.32	107.46	105.34
17年目	R 10	0.99531	1.00741	0.98243	0.99438	1%	0.9706	107.1	62.78	11.73	17.16	91.68	88.98	9.70	0.61	1.49	11.80	11.46	3.37	3.27	106.86	103.71
18年目	R 11	0.99529	1.00735	0.98212	0.99435	1%	0.9610	107.1	62.49	11.82	16.86	91.16	87.61	9.65	0.62	1.47	11.73	11.28	3.35	3.22	106.25	102.11
完成供用年次	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	1%	0.9515	107.1	69.46	13.43	18.33	101.21	96.30	9.59	0.31	1.26	11.16	10.62	3.41	3.24	115.79	110.17
20年目	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	1%	0.9420	107.1	69.11	13.50	18.11	100.73	94.89	9.54	0.31	1.24	11.10	10.46	3.39	3.19	115.22	108.54
21年目	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	1%	0.9327	107.1	68.76	13.58	17.90	100.24	93.50	9.50	0.32	1.23	11.04	10.30	3.37	3.15	114.65	106.94
22年目	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	1%	0.9235	107.1	68.41	13.66	17.68	99.75	92.12	9.45	0.32	1.21	10.98	10.14	3.36	3.10	114.09	105.36
23年目	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	1%	0.9143	107.1	68.06	13.74	17.47	99.26	90.76	9.40	0.32	1.20	10.92	9.98	3.34	3.05	113.52	103.80
24年目	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	1%	0.9053	107.1	67.71	13.82	17.25	98.78	89.42	9.35	0.32	1.18	10.86	9.83	3.32	3.01	112.96	102.26
25年目	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	1%	0.8963	107.1	67.36	13.90	17.03	98.29	88.10	9.30	0.32	1.17	10.80	9.68	3.31	2.96	112.39	100.74
26年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	1%	0.8874	107.1	67.01	13.97	16.82	97.80	86.79	9.25	0.32	1.15	10.73	9.53	3.29	2.92	111.83	99.24
27年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	1%	0.8787	107.1	66.66	14.05	16.60	97.31	85.51	9.21	0.33	1.14	10.67	9.38	3.27	2.88	111.26	97.76
28年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	1%	0.8700	107.1	66.31	14.13	16.39	96.83	84.24	9.16	0.33	1.12	10.61	9.23	3.26	2.83	110.70	96.30
29年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	1%	0.8613	107.1	65.96	14.21	16.17	96.34	82.98	9.11	0.33	1.11	10.55	9.09	3.24	2.79	110.13	94.86
30年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	1%	0.8528	107.1	65.36	14.21	16.04	95.61	81.54	9.03	0.33	1.10	10.46	8.92	3.22	2.74	109.28	93.20
31年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	1%	0.8444	107.1	64.76	14.21	15.91	94.88	80.12	8.94	0.33	1.09	10.37	8.75	3.19	2.69	108.44	91.56
32年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	1%	0.8360	107.1	64.17	14.21	15.77	94.15	78.71	8.86	0.33	1.08	10.28	8.59	3.17	2.65	107.59	89.95
33年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	1%	0.8277	107.1	63.57	14.21	15.64	93.42	77.33	8.78	0.33	1.07	10.18	8.43	3.14	2.60	106.75	88.36
34年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	1%	0.8195	107.1	62.97	14.21	15.51	92.69	75.97	8.70	0.33	1.06	10.09	8.27	3.12	2.55	105.90	86.79
35年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	1%	0.8114	107.1	62.37	14.21	15.38	91.96	74.62	8.61	0.33	1.06	10.00	8.11	3.09	2.51	105.06	85.25
36年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	1%	0.8034	107.1	61.78	14.21	15.24	91.23	73.30	8.53	0.33	1.05	9.91	7.96	3.07	2.47	104.21	83.72
37年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	1%	0.7954	107.1	61.18	14.21	15.11	90.51	71.99	8.45	0.33	1.04	9.82	7.81	3.04	2.42	103.37	82.22
38年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	1%	0.7876	107.1	60.58	14.21	14.98	89.78	70.70	8.37	0.33	1.03	9.73	7.66	3.02	2.38	102.52	80.74
39年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	1%	0.7798	107.1	59.98	14.21	14.85	89.05	69.44	8.28	0.33	1.02	9.63	7.51	2.99	2.34	101.68	79.28
40年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	1%	0.7720	107.1	59.39	14.21	14.72	88.32	68.19	8.20	0.33	1.01	9.54	7.37	2.97	2.29	100.83	77.85
41年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	1%	0.7644	107.1	58.79	14.21	14.58	87.59	66.95	8.12	0.33	1.00	9.45	7.22	2.95	2.25	99.98	76.43
42年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	1%	0.7568	107.1	58.19	14.21	14.45	86.86	65.74	8.04	0.33	0.99	9.36	7.08	2.92	2.21	99.14	75.03
43年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	1%	0.7493	107.1	57.59	14.22	14.32	86.13	64.54	7.95	0.33	0.98	9.27	6.94	2.90	2.17	98.29	73.66
44年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	1%	0.7419	107.1	57.00	14.22	14.19	85.40	63.36	7.87	0.33	0.97	9.18	6.81	2.87	2.13	97.45	72.30
45年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	1%	0.7346	107.1	56.40	14.22	14.06	84.67	62.20	7.79	0.33	0.96	9.08	6.67	2.85	2.09	96.60	70.96
46年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	1%	0.7273	107.1	55.80	14.22	13.92	83.94	61.05	7.71	0.33	0.96	8.99	6.54	2.82	2.05	95.76	69.64
47年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	1%	0.7201	107.1	55.20	14.22	13.79	83.21	59.92	7.62	0.33	0.95	8.90	6.41	2.80	2.02	94.91	68.35
48年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	1%	0.7130	107.1	54.61	14.22	13.66	82.48	58.81	7.54	0.33	0.94	8.81	6.28	2.77	1.98	94.07	67.07
49年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	1%	0.7059	107.1	54.01	14.22	13.53	81.75	57.71	7.46	0.33	0.93	8.72	6.15	2.75	1.94	93.22	65.81

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
完成供用年次	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	4%	0.8219	107.1	7.27	1.52	1.78	10.57	8.69	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.41	0.07	0.06	10.14	8.33
1年目	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	4%	0.7903	107.1	7.23	1.53	1.76	10.52	8.31	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.40	0.07	0.06	10.09	7.97
2年目	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	4%	0.7599	107.1	7.19	1.54	1.74	10.47	7.96	-0.01	-0.32	-0.18	-0.50	-0.38	0.07	0.06	10.04	7.63
3年目	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	4%	0.7307	107.1	7.16	1.55	1.72	10.42	7.61	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.37	0.07	0.05	9.99	7.30
4年目	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	4%	0.7026	107.1	7.12	1.56	1.70	10.37	7.29	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.35	0.07	0.05	9.94	6.99
5年目	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	4%	0.6756	107.1	7.08	1.57	1.67	10.32	6.97	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.34	0.07	0.05	9.89	6.68
6年目	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	4%	0.6496	107.1	7.05	1.57	1.65	10.27	6.67	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.33	0.07	0.05	9.84	6.39
7年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	4%	0.6246	107.1	7.01	1.58	1.63	10.23	6.39	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.31	0.07	0.04	9.80	6.12
8年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	4%	0.6006	107.1	6.97	1.59	1.61	10.18	6.11	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.30	0.07	0.04	9.75	5.85
9年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	4%	0.5775	107.1	6.94	1.60	1.59	10.13	5.85	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.29	0.07	0.04	9.70	5.60
10年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	4%	0.5553	107.1	6.90	1.61	1.57	10.08	5.60	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.28	0.07	0.04	9.65	5.36
11年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	4%	0.5339	107.1	6.84	1.61	1.56	10.00	5.34	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.27	0.07	0.04	9.58	5.11
12年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	4%	0.5134	107.1	6.77	1.61	1.54	9.93	5.10	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.26	0.07	0.04	9.50	4.88
13年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	4%	0.4936	107.1	6.71	1.61	1.53	9.85	4.86	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.24	0.07	0.03	9.43	4.65
14年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	4%	0.4746	107.1	6.65	1.61	1.52	9.78	4.64	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.23	0.07	0.03	9.35	4.44
15年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	4%	0.4564	107.1	6.59	1.61	1.51	9.70	4.43	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.23	0.07	0.03	9.28	4.23
16年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	4%	0.4388	107.1	6.52	1.61	1.49	9.63	4.23	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.22	0.07	0.03	9.20	4.04
17年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	4%	0.4220	107.1	6.46	1.61	1.48	9.55	4.03	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.21	0.07	0.03	9.13	3.85
18年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	4%	0.4057	107.1	6.40	1.61	1.47	9.48	3.85	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.20	0.07	0.03	9.05	3.67
19年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	4%	0.3901	107.1	6.34	1.61	1.45	9.40	3.67	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.19	0.07	0.03	8.98	3.50
20年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	4%	0.3751	107.1	6.27	1.61	1.44	9.33	3.50	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.18	0.06	0.02	8.91	3.34
21年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	4%	0.3607	107.1	6.21	1.61	1.43	9.25	3.34	-0.01	-0.33	-0.15	-0.48	-0.17	0.06	0.02	8.83	3.19
22年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	4%	0.3468	107.1	6.15	1.61	1.42	9.18	3.18	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.17	0.06	0.02	8.76	3.04
23年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	4%	0.3335	107.1	6.09	1.61	1.40	9.10	3.04	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.16	0.06	0.02	8.68	2.90
24年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	4%	0.3207	107.1	6.02	1.61	1.39	9.03	2.89	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.15	0.06	0.02	8.61	2.76
25年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	4%	0.3083	107.1	5.96	1.61	1.38	8.95	2.76	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.15	0.06	0.02	8.53	2.63
26年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	4%	0.2965	107.1	5.90	1.61	1.36	8.88	2.63	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.14	0.06	0.02	8.46	2.51
27年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	4%	0.2851	107.1	5.84	1.61	1.35	8.80	2.51	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.14	0.06	0.02	8.38	2.39
28年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	4%	0.2741	107.1	5.77	1.61	1.34	8.72	2.39	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.13	0.06	0.02	8.31	2.28
29年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	4%	0.2636	107.1	5.71	1.61	1.33	8.65	2.28	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.12	0.06	0.02	8.24	2.17
30年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	4%	0.2534	107.1	5.65	1.61	1.31	8.57	2.17	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.12	0.06	0.02	8.16	2.07
31年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	4%	0.2437	107.1	5.59	1.61	1.30	8.50	2.07	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.11	0.06	0.01	8.09	1.97
32年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	4%	0.2343	107.1	5.52	1.61	1.29	8.42	1.97	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.11	0.06	0.01	8.01	1.88
33年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	4%	0.2253	107.1	5.46	1.61	1.27	8.35	1.88	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.11	0.06	0.01	7.94	1.79
34年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	4%	0.2166	107.1	5.40	1.61	1.26	8.27	1.79	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.10	0.06	0.01	7.86	1.70
35年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	4%	0.2083	107.1	5.34	1.61	1.25	8.20	1.71	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.10	0.06	0.01	7.79	1.62
36年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	4%	0.2003	107.1	5.27	1.61	1.24	8.12	1.63	-0.01	-0.33	-0.13	-0.46	-0.09	0.06	0.01	7.71	1.55
37年目	R 49	0.98815	1.00003	0.98962	0.99057	4%	0.1926	107.1	5.21	1.61	1.22	8.05	1.55	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.09	0.06	0.01	7.64	1.47
38年目	R 50	0.98801	1.00003	0.98951	0.99048	4%	0.1852	107.1	5.15	1.61	1.21	7.97	1.48	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.09	0.06	0.01	7.57	1.40
39年目	R 51	0.98786	1.00003	0.98940	0.99039	4%	0.1780	107.1	5.09	1.61	1.20	7.90	1.41	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.08	0.05	0.01	7.49	1.33
40年目	R 52	0.98771	1.00003	0.98929	0.99030	4%	0.1712	107.1	5.02	1.61	1.19	7.82	1.34	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.08	0.05	0.01	7.42	1.27
41年目	R 53	0.98756	1.00003	0.98917	0.99020	4%	0.1646	107.1	4.96	1.61	1.17	7.75	1.28	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.08	0.05	0.01	7.34	1.21
42年目	R 54	0.98740	1.00003	0.98905	0.99011	4%	0.1583	107.1	4.90	1.61	1.16	7.67	1.21	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.07	0.05	0.01	7.27	1.15
43年目	R 55	0.98724	1.00003	0.98893	0.99001	4%	0.1522	107.1	4.84	1.61	1.15	7.60	1.16	-0.01	-0.33	-0.12	-0.45	-0.07	0.05	0.01	7.19	1.09
44年目	R 56	0.98708	1.00003	0.98881	0.98991	4%	0.1463	107.1	4.77	1.61	1.13	7.52	1.10	-0.01	-0.33	-0.12	-0.45	-0.07	0.05	0.01	7.12	1.04
45年目	R 57	0.98691	1.00003	0.98868	0.98980	4%	0.1407	107.1	4.71	1.61	1.12	7.44	1.05	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.06	0.05	0.01	7.04	0.99
46年目	R 58	0.98673	1.00003	0.98855	0.98970	4%	0.1353	107.1	4.65	1.61	1.11	7.37	1.00	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.06	0.05	0.01	6.97	0.94
47年目	R 59	0.98656	1.00003	0.98842	0.98959	4%	0.1301	107.1	4.59	1.61	1.10	7.29	0.95	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.06	0.05	0.01	6.90	0.90
48年目	R 60	0.98637	1.00003	0.98828	0.98948	4%	0.1251	107.1	4.52	1.61	1.08	7.22	0.90	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.06	0.05	0.01	6.82	0.85
49年目	R 61	0.98619	1.00003	0.98815	0.98937	4%	0.1203	107.1	4.46	1.61	1.07	7.14	0.86	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.05	0.05	0.01	6.75	0.81
合 計									298.26	80.04	69.65	447.94	174.61	-0.43	-16.41	-7.10	-23.94	-8.97	3.11	1.21	427.11	166.85

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

【参考：社会的割引率2%】

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
完成供用年次	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	2%	0.9057	107.1	7.27	1.52	1.78	10.57	9.57	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.46	0.07	0.07	10.14	9.18
1年目	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	2%	0.8880	107.1	7.23	1.53	1.76	10.52	9.34	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.45	0.07	0.07	10.09	8.96
2年目	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	2%	0.8706	107.1	7.19	1.54	1.74	10.47	9.11	-0.01	-0.32	-0.18	-0.50	-0.44	0.07	0.06	10.04	8.74
3年目	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	2%	0.8535	107.1	7.16	1.55	1.72	10.42	8.89	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.43	0.07	0.06	9.99	8.53
4年目	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	2%	0.8368	107.1	7.12	1.56	1.70	10.37	8.68	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.42	0.07	0.06	9.94	8.32
5年目	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	2%	0.8203	107.1	7.08	1.57	1.67	10.32	8.47	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.41	0.07	0.06	9.89	8.12
6年目	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	2%	0.8043	107.1	7.05	1.57	1.65	10.27	8.26	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.40	0.07	0.06	9.84	7.92
7年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	2%	0.7885	107.1	7.01	1.58	1.63	10.23	8.06	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.40	0.07	0.06	9.80	7.72
8年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	2%	0.7730	107.1	6.97	1.59	1.61	10.18	7.87	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.39	0.07	0.05	9.75	7.54
9年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	2%	0.7579	107.1	6.94	1.60	1.59	10.13	7.68	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.38	0.07	0.05	9.70	7.35
10年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	2%	0.7430	107.1	6.90	1.61	1.57	10.08	7.49	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.37	0.07	0.05	9.65	7.17
11年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	2%	0.7284	107.1	6.84	1.61	1.56	10.00	7.29	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.36	0.07	0.05	9.58	6.98
12年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	2%	0.7142	107.1	6.77	1.61	1.54	9.93	7.09	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.36	0.07	0.05	9.50	6.79
13年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	2%	0.7002	107.1	6.71	1.61	1.53	9.85	6.90	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.35	0.07	0.05	9.43	6.60
14年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	2%	0.6864	107.1	6.65	1.61	1.52	9.78	6.71	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.34	0.07	0.05	9.35	6.42
15年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	2%	0.6730	107.1	6.59	1.61	1.51	9.70	6.53	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.33	0.07	0.05	9.28	6.24
16年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	2%	0.6598	107.1	6.52	1.61	1.49	9.63	6.35	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.32	0.07	0.04	9.20	6.07
17年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	2%	0.6468	107.1	6.46	1.61	1.48	9.55	6.18	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.32	0.07	0.04	9.13	5.90
18年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	2%	0.6342	107.1	6.40	1.61	1.47	9.48	6.01	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.31	0.07	0.04	9.05	5.74
19年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	2%	0.6217	107.1	6.34	1.61	1.45	9.40	5.85	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.30	0.07	0.04	8.98	5.58
20年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	2%	0.6095	107.1	6.27	1.61	1.44	9.33	5.69	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.30	0.06	0.04	8.91	5.43
21年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	2%	0.5976	107.1	6.21	1.61	1.43	9.25	5.53	-0.01	-0.33	-0.15	-0.48	-0.29	0.06	0.04	8.83	5.28
22年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	2%	0.5859	107.1	6.15	1.61	1.42	9.18	5.38	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.28	0.06	0.04	8.76	5.13
23年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	2%	0.5744	107.1	6.09	1.61	1.40	9.10	5.23	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.28	0.06	0.04	8.68	4.99
24年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	2%	0.5631	107.1	6.02	1.61	1.39	9.03	5.08	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.27	0.06	0.04	8.61	4.85
25年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	2%	0.5521	107.1	5.96	1.61	1.38	8.95	4.94	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.26	0.06	0.03	8.53	4.71
26年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	2%	0.5412	107.1	5.90	1.61	1.36	8.88	4.80	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.26	0.06	0.03	8.46	4.58
27年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	2%	0.5306	107.1	5.84	1.61	1.35	8.80	4.67	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.25	0.06	0.03	8.38	4.45
28年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	2%	0.5202	107.1	5.77	1.61	1.34	8.72	4.54	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.25	0.06	0.03	8.31	4.32
29年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	2%	0.5100	107.1	5.71	1.61	1.33	8.65	4.41	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.24	0.06	0.03	8.24	4.20
30年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	2%	0.5000	107.1	5.65	1.61	1.31	8.57	4.29	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.24	0.06	0.03	8.16	4.08
31年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	2%	0.4902	107.1	5.59	1.61	1.30	8.50	4.17	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.23	0.06	0.03	8.09	3.96
32年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	2%	0.4806	107.1	5.52	1.61	1.29	8.42	4.05	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.23	0.06	0.03	8.01	3.85
33年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	2%	0.4712	107.1	5.46	1.61	1.27	8.35	3.93	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.22	0.06	0.03	7.94	3.74
34年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	2%	0.4619	107.1	5.40	1.61	1.26	8.27	3.82	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.22	0.06	0.03	7.86	3.63
35年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	2%	0.4529	107.1	5.34	1.61	1.25	8.20	3.71	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.21	0.06	0.03	7.79	3.53
36年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	2%	0.4440	107.1	5.27	1.61	1.24	8.12	3.61	-0.01	-0.33	-0.13	-0.46	-0.21	0.06	0.02	7.71	3.43
37年目	R 49	0.98815	1.00003	0.98962	0.99057	2%	0.4353	107.1	5.21	1.61	1.22	8.05	3.50	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.20	0.06	0.02	7.64	3.33
38年目	R 50	0.98801	1.00003	0.98951	0.99048	2%	0.4268	107.1	5.15	1.61	1.21	7.97	3.40	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.20	0.06	0.02	7.57	3.23
39年目	R 51	0.98786	1.00003	0.98940	0.99039	2%	0.4184	107.1	5.09	1.61	1.20	7.90	3.30	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.19	0.05	0.02	7.49	3.13
40年目	R 52	0.98771	1.00003	0.98929	0.99030	2%	0.4102	107.1	5.02	1.61	1.19	7.82	3.21	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.19	0.05	0.02	7.42	3.04
41年目	R 53	0.98756	1.00003	0.98917	0.99020	2%	0.4022	107.1	4.96	1.61	1.17	7.75	3.11	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.18	0.05	0.02	7.34	2.95
42年目	R 54	0.98740	1.00003	0.98905	0.99011	2%	0.3943	107.1	4.90	1.61	1.16	7.67	3.02	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.18	0.05	0.02	7.27	2.87
43年目	R 55	0.98724	1.00003	0.98893	0.99001	2%	0.3865	107.1	4.84	1.61	1.15	7.60	2.94	-0.01	-0.33	-0.12	-0.45	-0.18	0.05	0.02	7.19	2.78
44年目	R 56	0.98708	1.00003	0.98881	0.98991	2%	0.3790	107.1	4.77	1.61	1.13	7.52	2.85	-0.01	-0.33	-0.12	-0.45	-0.17	0.05	0.02	7.12	2.70
45年目	R 57	0.98691	1.00003	0.98868	0.98980	2%	0.3715	107.1	4.71	1.61	1.12	7.44	2.77	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.17	0.05	0.02	7.04	2.62
46年目	R 58	0.98673	1.00003	0.98855	0.98970	2%	0.3642	107.1	4.65	1.61	1.11	7.37	2.68	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.16	0.05	0.02	6.97	2.54
47年目	R 59	0.98656	1.00003	0.98842	0.98959	2%	0.3571	107.1	4.59	1.61	1.10	7.29	2.60	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.16	0.05	0.02	6.90	2.46
48年目	R 60	0.98637	1.00003	0.98828	0.98948	2%	0.3501	107.1	4.52	1.61	1.08	7.22	2.53	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.16	0.05	0.02	6.82	2.39
49年目	R 61	0.98619	1.00003	0.98815	0.98937	2%	0.3432	107.1	4.46	1.61	1.07	7.14	2.45	-0.01	-0.33	-0.11	-0.45	-0.15	0.05	0.02	6.75	2.32
合 計									298.26	80.04	69.65	447.94	268.55	-0.43	-16.41	-7.10	-23.94	-14.05	3.11	1.86	427.11	256.37

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：南国安芸道路

【参考：社会的割引率1%】

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
完成供用年次	R 12	0.99527	1.00730	0.98179	0.99432	1%	0.9515	107.1	7.27	1.52	1.78	10.57	10.05	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.48	0.07	0.07	10.14	9.64
1年目	R 13	0.99496	1.00584	0.98821	0.99507	1%	0.9420	107.1	7.23	1.53	1.76	10.52	9.91	-0.01	-0.31	-0.18	-0.50	-0.47	0.07	0.07	10.09	9.50
2年目	R 14	0.99494	1.00581	0.98807	0.99505	1%	0.9327	107.1	7.19	1.54	1.74	10.47	9.77	-0.01	-0.32	-0.18	-0.50	-0.47	0.07	0.07	10.04	9.36
3年目	R 15	0.99491	1.00577	0.98793	0.99502	1%	0.9235	107.1	7.16	1.55	1.72	10.42	9.62	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.46	0.07	0.07	9.99	9.23
4年目	R 16	0.99489	1.00574	0.98778	0.99500	1%	0.9143	107.1	7.12	1.56	1.70	10.37	9.48	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.46	0.07	0.07	9.94	9.09
5年目	R 17	0.99486	1.00571	0.98763	0.99497	1%	0.9053	107.1	7.08	1.57	1.67	10.32	9.35	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.45	0.07	0.07	9.89	8.96
6年目	R 18	0.99483	1.00567	0.98747	0.99495	1%	0.8963	107.1	7.05	1.57	1.65	10.27	9.21	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.45	0.07	0.06	9.84	8.82
7年目	R 19	0.99481	1.00564	0.98731	0.99492	1%	0.8874	107.1	7.01	1.58	1.63	10.23	9.08	-0.01	-0.32	-0.17	-0.50	-0.44	0.07	0.06	9.80	8.69
8年目	R 20	0.99478	1.00561	0.98715	0.99489	1%	0.8787	107.1	6.97	1.59	1.61	10.18	8.94	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.44	0.07	0.06	9.75	8.56
9年目	R 21	0.99475	1.00558	0.98698	0.99487	1%	0.8700	107.1	6.94	1.60	1.59	10.13	8.81	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.44	0.07	0.06	9.70	8.44
10年目	R 22	0.99472	1.00555	0.98681	0.99484	1%	0.8613	107.1	6.90	1.61	1.57	10.08	8.68	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.43	0.07	0.06	9.65	8.31
11年目	R 23	0.99094	1.00003	0.99183	0.99243	1%	0.8528	107.1	6.84	1.61	1.56	10.00	8.53	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.43	0.07	0.06	9.58	8.17
12年目	R 24	0.99086	1.00003	0.99176	0.99237	1%	0.8444	107.1	6.77	1.61	1.54	9.93	8.38	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.42	0.07	0.06	9.50	8.02
13年目	R 25	0.99077	1.00003	0.99169	0.99231	1%	0.8360	107.1	6.71	1.61	1.53	9.85	8.24	-0.01	-0.33	-0.16	-0.50	-0.41	0.07	0.06	9.43	7.88
14年目	R 26	0.99069	1.00003	0.99162	0.99225	1%	0.8277	107.1	6.65	1.61	1.52	9.78	8.09	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.41	0.07	0.06	9.35	7.74
15年目	R 27	0.99060	1.00003	0.99155	0.99219	1%	0.8195	107.1	6.59	1.61	1.51	9.70	7.95	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.40	0.07	0.06	9.28	7.60
16年目	R 28	0.99051	1.00003	0.99148	0.99213	1%	0.8114	107.1	6.52	1.61	1.49	9.63	7.81	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.40	0.07	0.05	9.20	7.47
17年目	R 29	0.99042	1.00003	0.99141	0.99207	1%	0.8034	107.1	6.46	1.61	1.48	9.55	7.67	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.39	0.07	0.05	9.13	7.33
18年目	R 30	0.99033	1.00003	0.99133	0.99200	1%	0.7954	107.1	6.40	1.61	1.47	9.48	7.54	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.39	0.07	0.05	9.05	7.20
19年目	R 31	0.99023	1.00003	0.99126	0.99194	1%	0.7876	107.1	6.34	1.61	1.45	9.40	7.40	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.38	0.07	0.05	8.98	7.07
20年目	R 32	0.99014	1.00003	0.99118	0.99187	1%	0.7798	107.1	6.27	1.61	1.44	9.33	7.27	-0.01	-0.33	-0.15	-0.49	-0.38	0.06	0.05	8.91	6.94
21年目	R 33	0.99004	1.00003	0.99110	0.99181	1%	0.7720	107.1	6.21	1.61	1.43	9.25	7.14	-0.01	-0.33	-0.15	-0.48	-0.37	0.06	0.05	8.83	6.82
22年目	R 34	0.98994	1.00003	0.99102	0.99174	1%	0.7644	107.1	6.15	1.61	1.42	9.18	7.01	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.37	0.06	0.05	8.76	6.69
23年目	R 35	0.98984	1.00003	0.99094	0.99167	1%	0.7568	107.1	6.09	1.61	1.40	9.10	6.89	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.36	0.06	0.05	8.68	6.57
24年目	R 36	0.98973	1.00003	0.99086	0.99160	1%	0.7493	107.1	6.02	1.61	1.39	9.03	6.76	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.36	0.06	0.05	8.61	6.45
25年目	R 37	0.98962	1.00003	0.99077	0.99153	1%	0.7419	107.1	5.96	1.61	1.38	8.95	6.64	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.36	0.06	0.05	8.53	6.33
26年目	R 38	0.98952	1.00003	0.99069	0.99146	1%	0.7346	107.1	5.90	1.61	1.36	8.88	6.52	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.35	0.06	0.05	8.46	6.21
27年目	R 39	0.98941	1.00003	0.99060	0.99138	1%	0.7273	107.1	5.84	1.61	1.35	8.80	6.40	-0.01	-0.33	-0.14	-0.48	-0.35	0.06	0.04	8.38	6.10
28年目	R 40	0.98929	1.00003	0.99051	0.99131	1%	0.7201	107.1	5.77	1.61	1.34	8.72	6.28	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.34	0.06	0.04	8.31	5.98
29年目	R 41	0.98918	1.00003	0.99042	0.99123	1%	0.7130	107.1	5.71	1.61	1.33	8.65	6.17	-0.01	-0.33	-0.14	-0.47	-0.34	0.06	0.04	8.24	5.87
30年目	R 42	0.98906	1.00003	0.99032	0.99116	1%	0.7059	107.1	5.65	1.61	1.31	8.57	6.05	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.33	0.06	0.04	8.16	5.76
31年目	R 43	0.98894	1.00003	0.99023	0.99108	1%	0.6989	107.1	5.59	1.61	1.30	8.50	5.94	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.33	0.06	0.04	8.09	5.65
32年目	R 44	0.98881	1.00003	0.99013	0.99100	1%	0.6920	107.1	5.52	1.61	1.29	8.42	5.83	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.32	0.06	0.04	8.01	5.54
33年目	R 45	0.98869	1.00003	0.99004	0.99092	1%	0.6852	107.1	5.46	1.61	1.27	8.35	5.72	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.32	0.06	0.04	7.94	5.44
34年目	R 46	0.98856	1.00003	0.98993	0.99083	1%	0.6784	107.1	5.40	1.61	1.26	8.27	5.61	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.32	0.06	0.04	7.86	5.33
35年目	R 47	0.98842	1.00003	0.98983	0.99075	1%	0.6717	107.1	5.34	1.61	1.25	8.20	5.51	-0.01	-0.33	-0.13	-0.47	-0.31	0.06	0.04	7.79	5.23
36年目	R 48	0.98829	1.00003	0.98973	0.99066	1%	0.6650	107.1	5.27	1.61	1.24	8.12	5.40	-0.01	-0.33	-0.13	-0.46	-0.31	0.06	0.04	7.71	5.13
37年目	R 49	0.98815	1.00003	0.98962	0.99057	1%	0.6584	107.1	5.21	1.61	1.22	8.05	5.30	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.30	0.06	0.04	7.64	5.03
38年目	R 50	0.98801	1.00003	0.98951	0.99048	1%	0.6519	107.1	5.15	1.61	1.21	7.97	5.20	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.30	0.06	0.04	7.57	4.93
39年目	R 51	0.98786	1.00003	0.98940	0.99039	1%	0.6454	107.1	5.09	1.61	1.20	7.90	5.10	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.30	0.05	0.04	7.49	4.84
40年目	R 52	0.98771	1.00003	0.98929	0.99030	1%	0.6391	107.1	5.02	1.61	1.19	7.82	5.00	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.29	0.05	0.03	7.42	4.74
41年目	R 53	0.98756	1.00003	0.98917	0.99020	1%	0.6327	107.1	4.96	1.61	1.17	7.75	4.90	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.29	0.05	0.03	7.34	4.65
42年目	R 54	0.98740	1.00003	0.98905	0.99011	1%	0.6265	107.1	4.90	1.61	1.16	7.67	4.81	-0.01	-0.33	-0.12	-0.46	-0.29	0.05	0.03	7.27	4.55
43年目	R 55	0.98724	1.00003	0.98893	0.99001	1%	0.6203	107.1	4.84	1.61	1.15	7.60	4.71	-0.01	-0.33	-0.1						
